

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO N. 4 CUNEESE

Sessione Straordinaria - **Seduta del 19 novembre 2018** (n. 1 O.d.G. Seduta del 19/11/2018)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: VERIFICA DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) AL 30 SETTEMBRE 2018 ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA (PERIODO 2018-2019);

L'anno **duemiladiciotto** addì 28 del mese di settembre, alle ore 15:00 presso la sala Giolitti della Provincia di Cuneo – a seguito convocazione ai sensi degli Artt. 10 e 11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'EGATO/4 Cuneese – si è riunita la **Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese"** composta come segue:

TABELLA PRESENZE CONFERENZA DELL'EGATO N. 4 "Cuneese" SEDUTA DEL 19/11/18 h. 15:00							
NUM. ORD.	ENTE	QUOTA	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	PRES	ASS.	QUOTA
1	AREA OMOGENEA ALBESE	5,26	GARASSINO Luigi	Rapp.te con delega	x		5,2605954
2	AREA OMOGENEA BRAIDese	3,87	SIBILLE Bruna	Rappresentante	x		3,8696865
3	AREA OMOGENEA CUNEESE	6,10	LERDA Guido	Rapp.te con delega	x		6,098964
4	AREA OMOGENEA FOSSANESE	3,48	PAGLIALONGA Vincenzo	Rapp.te con delega	x		3,4803165
5	AREA OMOGENEA MONREGALESE	4,60	MARINI Giulio	Rapp.te con delega	x		4,5995423
6	AREA OMOGENEA DEL ROERO	5,22	FACCENDA Enrico	Rappresentante			0
7	AREA OMOGENEA SALUZZESE	3,67	BANCHIO Sergio	Rappresentante	x		3,6730241
8	AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE	4,92	BARBERO Roberta	Rappresentante	x		4,9234397
9	UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE	3,40	RENAUDI Paolo	Rappresentante			0
10	UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME	2,37	BURZI Massimo	Rappresentante	x		2,3716028
11	UNIONE MONTANA VALLE STURA	4,61	EMANUEL Loris1	Rappresentante			0
12	UNIONE MONTANA VALLE GRANA	2,39	MARINO Marco	Rappresentante			0
13	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	3,73	COLOMBERO Roberto	Rappresentante	x		3,7284198
14	UNIONE MONTANA COMUNI DEL MONVISO	2,69	ANSELMO Mario	Rappresentante			0
15	UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO	1,66	COMBA Piera	Rappresentante	x		1,661163
16	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	4,71	FINA Giovanni	Rapp.te con delega	x		4,7144131
17	UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO	2,66	FERRARIS Giorgio	Rappresentante			0
18	UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA	2,22	VIZIO Alfredo	Rappresentante	x		2,2216836
19	UNIONE MONTANA VALLI MONREGALESI	0,88	TARAVELLO Gianrenzo	Rappresentante	x		0,8771658
20	UNIONE MONTANA MONTE REGALE	0,81	GIUDICI Corrado	Rapp.te con delega	x		0,8148872
21	UNIONE MONTANA MONDOLE'	1,95	BONGIOVANNI Paolo	Rappresentante	x		1,9505324
22	UNIONE MONTANA ALTA LANGA	3,67	ANTONIOTTO Massimo	Rapp.te con delega	x		3,672002
23	PROVINCIA DI CUNEO	25,00	BORGNA Federico	Presidente	x		25
		0,10					0,10443
		100,00		TOTALE			78,917438

Gli Enti partecipanti all'AATO/4 Cuneese risultano rappresentati in numero di 17 su un totale di n. 23 rappresentanti, è presente il Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 20/01/97 n. 13) - Presidente della Provincia di Cuneo, il tutto così come riassunto dal prospetto precedente.

Presiede la Prof.ssa Bruna Sibille in veste di Presidente della Conferenza d'Ambito;

Accertato il numero legale, con quote n.78,917438, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta alla seduta il Direttore dell'EGATO4 Ing. Giuseppe Giuliano ed il Segretario il dott. Claudio Chianese.

**LA CONFERENZA dell'ENTE di GOVERNO
dell'AMBITO N. 4 "CUNEESE"**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali

Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regione Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani".

VISTA la Convenzione Istitutiva di questa Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese".

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2*", con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI2) per la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per il periodo regolatorio 2016/2019;

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 11 del 27-05-2016 ad oggetto "*Predisposizione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019 del Servizio Idrico Integrato*";

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 2 della predetta deliberazione stabilisce:

"L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:

- a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;*
- b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;*
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento";*

RICHIAMATA la Deliberazioni della Conferenza n. 17 del 28-09-2017 ad oggetto: "VERIFICA DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA INTERVENTI AL 31 AGOSTO 2017 ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA (PERIODO 2017-2018)", con la quale si è provveduto all'aggiornamento e all'integrazione del Programma degli interventi (PdI) 2017-2018, sia in relazione agli importi di progetto di alcune opere, aggiornati in relazione all'evoluzione progettuale, sia per l'inserimento di interventi proposti dai Gestori al fine di dare risposte ad emerse criticità nell'erogazione del servizio idrico integrato;

VISTA la deliberazione n. 3 del 8.03.2018 con la quale sono stati approvati i documenti costituenti la revisione ed aggiornamento del Piano d'Ambito con valenza 2018 - 2047, riguardante l'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese;

CONSIDERATO che gli Uffici dell'Ente di governo dell'Ambito 4 hanno avviato il monitoraggio sullo stato di attuazione al mese di settembre 2018 del Programma degli interventi (PdI) relativamente agli interventi programmati nel periodo 2016 – 2019, chiedendo ad ogni gestore di evidenziare il cronoprogramma delle attività al fine di poterne monitorare lo stato di attuazione;

VISTA l'allegata relazione, predisposta dagli uffici EGATO4 contenente:

- le valutazioni relative allo stato di attuazione al mese di settembre 2018 del Programma degli Interventi puntuali da parte dei singoli gestori, con riferimento agli obiettivi specifici ed alle relative aree di intervento definite;
- le valutazioni generali in merito allo stato di attuazione al mese di settembre 2018 del Programma degli Interventi con l'analisi, riferita ad ogni singolo gestore, della situazione dei ritardi nella realizzazione degli interventi nonché degli eventuali interventi realizzati in anticipo;
- lo stato complessivo di attuazione degli interventi, per ogni gestore e a livello complessivo d'ambito, distinguendo tra gli interventi programmati, quelli ultimati e quelli in corso di realizzazione, tenendo conto anche degli interventi relativi al bando EGATO4 per l'assegnazione di contributi per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto;
- le conclusioni definite a seguito dell'attività di monitoraggio realizzata;
- il Programma degli Interventi (PdI) 2016-2019 per interventi puntuali e crono programma di realizzazione delle opere - aggiornamento settembre 2018;

RILEVATO che durante l'attività di monitoraggio delle tempistiche dei lavori è emersa l'esigenza di aggiornare, in relazione all'evoluzione progettuale, gli importi di alcuni interventi del Programma degli interventi (PdI) 2017- 2018 ed altresì, alcuni Gestori, hanno proposto l'inserimento di nuovi interventi al fine di dare risposte a criticità emerse nell'erogazione del servizio idrico integrato;

RILEVATO che con la relazione allegata è stata effettuata l'analisi, riferita ad ogni singolo gestore, della situazione dei ritardi nella realizzazione degli interventi previsti dal Programma degli Interventi 2017- 2018 nonché degli interventi realizzati in anticipo;

VALUTATO:

- di ritenere importante l'obiettivo di rispetto dei budget previsti nella Pianificazione 2016-19 già approvata dalla Conferenza dell'Ente d'Ambito con precedenti Delibere;
- di richiedere ai Gestori di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA);
- di indicare che per quanto riguarda i Gestori che hanno formulato proposte di aggiornamento Programma interventi in aumento rispetto alle previsioni del maggio 2016, e per gli interventi previsti nel 2019, non legati all'alluvione 2016 e non assistiti da cofinanziamento pubblico, si debba autorizzare unicamente l'attività di progettazione assunta pari a circa il 7% dell'importo complessivo di ciascun intervento. Quindi, nella fase di attivazione della progettazione dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro sarà necessaria una verifica preventiva con l'Ente d'Ambito per valutare la priorità dell'intervento e la necessità di attivarlo celermente prima della presa in carico da parte del Gestore unico d'Ambito.

RILEVATA e condivisa, quindi, la significatività delle indicazioni contenute nella relazione ed in particolare nelle conclusioni della stessa;

VALUTATA l'importanza dell'attività di monitoraggio, al fine verificare costantemente l'avanzamento delle attività dei Gestori legate all'attuazione delle opere, aggiornare lo stato di realizzazione delle opere stesse e valutare la necessità di apportare integrazioni al Programma degli Interventi;

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell'Ato4 Ing. G. Giuliano il parere favorevole in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA la Deliberazioni della Conferenza n. 2 del 07-05-2018 ad oggetto: “Proroga concessioni del Servizio idrico Integrato dell’ATO4”;

RITENUTO che i Gestori siano tenuti a garantire per l’intero periodo di gestione l’efficienza di tutte le infrastrutture (impianti, reti e apparecchiature) loro affidate al fine di soddisfare gli standard di erogazione del servizio idrico integrato previsti dalla Carta dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare;

Sentiti gli interventi dei seguenti componenti la Conferenza dell’Ato4, così come risulta dalla registrazione verbale della seduta:

Presidente Prof.ssa Bruna Sibille;

introduzione del Direttore, illustrazione sintetica degli investimenti dell’Ing. R. Allamandola

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 17 per una quota corrispondente a 78,917438,

Votanti: n. 17 corrispondenti a quota 78,917438,

Astenuti n. 0

Voti favorevoli: n.17 corrispondenti a quote 78,917438,

Voti Contrari: n. 0(Rappresentanti) corrispondenti a quote 0

E quindi con il voto favorevole, corrispondenti a quote 78,917438,;

DELIBERA

1. di condividere ed approvare la relazione, allegata al presente provvedimento, inerente al monitoraggio sullo stato d’avanzamento del Programma degli Interventi (PdI), relativamente alle opere relative al periodo 2017 – 2018;
2. di indicare che il presente provvedimento costituisce, altresì, aggiornamento ed integrazione al Programma degli interventi (PdI) 2018 – 2019 sia in relazione agli importi di progetto di alcune opere, aggiornati in relazione all’evoluzione progettuale, sia per l’inserimento di interventi proposti dai Gestori al fine di dare risposte a criticità emerse nell’erogazione del servizio idrico integrato;
3. di indicare che con la relazione allegata è stata effettuata, altresì, l’analisi, riferita ad ogni singolo gestore, della situazione dello stato d’avanzamento degli interventi previsti dal Programma degli Interventi 2016 -2019;
4. di richiedere ai Gestori di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d’Ambito e dall’AEEGSI (oggi ARERA);
5. di indicare che per quanto riguarda i Gestori che hanno formulato proposte di aggiornamento Programma interventi in aumento rispetto alle previsioni del maggio 2016, e per gli interventi previsti nel 2019, non legati all’alluvione 2016 e non assistiti da

confinanziamento pubblico, si debba autorizzare unicamente l'attività di progettazione assunta pari a circa il 7% dell'importo complessivo di ciascun intervento. Quindi, nella fase di attivazione della progettazione dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro sarà necessaria una verifica preventiva con l'Ente d'Ambito per valutare la priorità dell'intervento e la necessità di attivarlo celermente prima della presa in carico da parte del Gestore unico d'Ambito;



6. di ribadire la necessità da parte dei Gestori di dare puntuale attuazione al Programma degli Interventi al fine di eliminare le criticità delle infrastrutture del sistema idrico dell'Ambito 4 e migliorare la fruibilità del servizio da parte dei cittadini;
7. di comunicare il presente provvedimento ai Comuni, ai Gestori di EGATO4;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell'Ato4 per quindici giorni consecutivi;

Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Cuneese" – Piemonte

Periodo regolatorio 2016-2019

**VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL
PROGRAMMA INTERVENTI AL 30 SETTEMBRE 2018 E
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORI 2018-19**



Il Dirigente Area Tecnica Dott. Ing. Paolo Galfrè	Il Direttore di EGATO4 Dott. Ing. Giuseppe Giuliano	Il referente Dott. Ing. Roberto Allamandola
 Firma	 Firma	 Firma

Novembre 2018

INDICE

Premessa	pag. 3
Richiami su obiettivi ed indirizzi di pianificazione	pag. 3
Obiettivi fissati dal nuovo Piano d'Ambito adottato dalla Conferenza di EGATO4 con Del. EGATO4 15/2017 e approvato con Del. 3/2018)	pag. 5
Aggiornamento biennale della proposta tariffaria (anni 2018-2019) ex Del. ARERA n. 918/2017, approvato dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 14 del 22-06-2018	pag. 6
Analisi dello stato di attuazione al 30 settembre 2018 degli interventi previsti in pianificazione 2016-2019 - Analisi in termini di “n° interventi eseguiti” - Analisi in termini “valore dei lavori eseguiti”	pag. 6 pag. 6 pag. 8
Proposte di varianti al vigente Programma interventi 2016-2019 - ACDA S.p.A. - CALSO S.p.A - Infernotto Acqua Srl - SISI Srl - Mondo Acqua S.p.A. - Alpi Acque S.p.A. - ALSe S.p.A. - Tecnoedil S.p.A. - Ireti S.p.A. - ALAC S.p.A. - CRPVaraita Srl	pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15
Conclusioni	pag. 16
Allegati	pag. 18

Premessa

I contenuti della presente relazione sono mirati ad evidenziare lo **stato di attuazione/avanzamento dei lavori** previsti nel Programma degli interventi (PdI) relativamente al periodo regolatorio 2016-2019, in particolare per il primo triennio 2016-2017-2018 nonché ad analizzare le **proposte di aggiornamento / riallineamento** depositate dai Gestori di ATO4 Cuneese nel corso del mese di settembre 2018.

Il presente monitoraggio rappresenta una fotografia dello stato di attuazione del programma al **30 SETTEMBRE 2018**, ovvero dopo circa tre anni dalla Delibera di approvazione del programma da parte della Conferenza di ATO4 Cuneese (Del. n. 11 del 27-05-2016). Si sono altresì tenuti in considerazione i **progressivi aggiornamenti** approvati dalla Conferenza d'Ambito:

- nel novembre 2016, con Del. n. 17 del 14-11-2016;
- nel settembre 2017, con Del. n. 17 del 28-09-2017;
- nel maggio 2018, con Del. n. 10 del 07-05-2018;
- nel giugno 2018, con Del. 14 del 22-06-2018 (aggiornamento proposta tariffaria);

e gli interventi finalizzati al ripristino dei danni subiti dalle infrastrutture del Servizio idrico integrato cuneese a seguito dell'evento **alluvionale del 24 novembre 2016**.

Per gli interventi per cui è prevista la realizzazione in tale periodo, individuati puntualmente nel programma degli interventi, si è chiesto ad ogni Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ato4 Cuneese di evidenziare il cronoprogramma delle attività al fine di poterne monitorare costantemente lo stato di avanzamento.

Richiami su obiettivi ed indirizzi di pianificazione

La Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 ha imposto, nell'ambito delle attività inerenti l'adozione di provvedimenti tariffari dei servizi idrici, l'aggiornamento, da parte dell'Ente d'Ambito, del Programma degli Interventi (PdI) secondo specifiche indicazioni metodologiche definendo gli obiettivi di pianificazione per il periodo 2016-2019.

L'Ente d'Ambito 4 Cuneese, con Deliberazione n. 1 del 18-03-2016, ha approvato il documento "Individuazione degli obiettivi specifici ed indirizzi di pianificazione per la definizione del programma degli Interventi (PdI)" che, recependo gli obiettivi indicati da AEEGSI (oggi ARERA), definisce quelli specifici per l'Ambito Territoriale Cuneese.

Tale documento rappresenta l'atto di indirizzo in merito agli interventi prioritari del servizio idrico integrato che i Gestori hanno recepito per la definizione dei Programmi di Intervento 2016-19.

In sintesi:

- A) sono stati confermati gli Obiettivi del precedente periodo regolatorio così come elencati nella Delibera n.10 del 31/03/2014 con la quale la Conferenza dell'EGATO/4 aveva approvato il PdI del periodo 2014÷2017;
- B) tali obiettivi sono stati ritenuti congrui dalla AEEGSI (oggi ARERA) con Delibera n. 25/2015/R/IDR di approvazione delle predisposizioni tariffarie nel periodo 2012÷2015;
- C) gli stessi Obiettivi, per espressa disposizione dell'AEEGSI (oggi ARERA) con Deliberazione 643/2013/R/IDR, dovevano valere per l'intero periodo del PdI che in allora doveva coincidere con la durata dell'affidamento gestionale; in proposito si ricorda che tutti gli affidamenti agli attuali Gestori in ATO/4 sono scaduti nel 2017

(fine primo biennio del periodo regolatorio 2016÷2019), con esclusione di un solo Gestore che terminerà nel 2021, ed attualmente le Società operano in regime di proroga sino alla *“piena operatività del soggetto individuato come nuovo gestore del ciclo idrico”*, ex Delib. ATO4 n. 12 del 01-08-17;

- D) gli Obiettivi ripresi in Delibera 1/2016 di cui si sta parlando sono quelli contenuti nella Rimodulazione del Piano d'Ambito 2011÷2016 e nella Relazione di accompagnamento al Programma degli Interventi (Pdl) approvato dalla Conferenza con Deliberazione n.10 del 31 marzo 2014;
- E) agli Obiettivi sanciti a tutto il 31/03/2014 la Conferenza, con cit. Delibera n.1/2016, ha inteso aggiungere quelli che la stessa Conferenza aveva adottato con Delibera n.1 del 24 agosto 2015 concernente il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del F.Po – secondo ciclo di programmazione 2016÷2021 – Misure concernenti i Bacini dei Torrenti Tinella/Medio-Belbo e Bobore con specifico riferimento alla Direttiva 2000/60/CE;
- F) in sintesi, gli Obiettivi di cui si tratta concernono:
 - a. l'adeguamento degli Impianti di depurazione dei reflui con capacità di trattamento superiore ai 2.000 A.E. alle Direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE e alle Misure d'Area del Piano regionale di Tutela delle Acque; e, in tale contesto, assoluta priorità al completamento dei lavori in corso nel rispetto dei cronoprogrammi vincolanti della vigente programmazione sotto la focale della Commissione UE, del MATTM, della Regione Piemonte essendo il bacino ATO/4 parte integrante del Bacino del Fiume Po contribuente all'Area Sensibile Alto Adriatico;
 - b. la razionalizzazione del sistema di depurazione laddove troppo parcellizzato in piccoli impianti scarsamente efficienti (tipicamente: bacini Torrenti Tinella, Bobore, medio Tanaro ecc.);
 - c. l'adeguamento dei sistemi di potabilizzazione, disinfezione e monitoraggio della qualità dell'acqua immessa in rete in adempimento alla Direttiva 98/83/CE e D.Lgs. 31/2001 come integrato dal D.Lgs. 27/2002;
 - d. il mantenimento di adeguati livelli di efficienza (prescritti dalla vigente Disciplina) nelle reti e negli impianti affidati in gestione mediante attivazione di tutte le necessarie manutenzioni straordinarie;
 - e. la risoluzione di tutte le criticità identificate dai Gestori sulle reti e impianti affidati in gestione sulla base degli elenchi approvati da AEEGSI (oggi ARERA) con propria Determinazione 31/03/2016 n.2/2016-DSID e per il precedente periodo regolatorio, con Determinazione 3/2014-DSID.

Detti obiettivi sono ovviamente conformi con le linee d'intervento adottate con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, ed in particolare con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (approvazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007) in attuazione della Direttiva CE 2000/60 e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po adottato il 24 febbraio 2010.

I Programmi d'intervento proposti dai Gestori ed approvati dall'Ente d'Ambito con Deliberazione n. 11 del 27 maggio 2016 recepiscono gli obiettivi definiti dall'Ato4.

Come già richiamato in premessa, tali programmi hanno subito nel corso del tempo principalmente una serie di modifiche in seguito a:

- Variante proposta dai Gestori Calso S.p.A., Mondo Acqua S.p.A., Tecnoedil S.p.A., Alpi Acque S.p.A., approvata con Delib. di EGATO4 n. 17 del 14-11-2016 che ha apportato modeste modifiche alla pianificazione di cui alla Del. 11 del 27 maggio 2016;

- Evento alluvionale del 24 novembre 2016 che ha reso necessaria la realizzazione immediata o l'inserimento nel programma interventi di lavori urgenti e indifferibili, specie per talune zone della Provincia, parte dei quali sono cofinanziati da fondi regionali giusta l'Ordinanza commissariale del Presidente regionale S. Chiamparino n. 3/A18.000/430 del 22-03-2017;
- Variante proposta dai Gestori nel settembre 2017 ed approvata dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 17 del 28-08-2017;
- Variante proposta dai Gestori nel maggio 2018 ed approvata dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 10 del 07-05-2018;
- Variante conseguente all'aggiornamento biennale della proposta tariffaria 2018-2019 ex Del. ARERA n. 918/2017, approvata dalla Conferenza di EGATO4 con Del. 14 del 22-06-2018.

Obiettivi fissati dal nuovo Piano d'Ambito adottato dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 15 del 11-09-2017 e approvato con Del. n. 3 del 08-03-2018

Il vigente Piano d'ambito 2018-2047, adottato dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 15 del 11-09-2017 e approvato con Del. n. 3 del 08-03-2018, identifica scenari operativi a doppio riferimento temporale:

- il breve termine, riferito al quadriennio 2018-2021 opera in sostanziale continuità con l'attuale programmazione; decisiva l'importanza dell'analisi di dettaglio degli investimenti e delle componenti di costo che vanno a determinare la tariffa nelle diverse realtà del territorio;
- il medio-lungo termine (azioni di livello strategico), riferito al periodo 2021-2047, rispetto al quale è definita il fabbisogno di risorse e di infrastrutture in rapporto agli scenari prevedibili di evoluzione del sistema.

Gli obiettivi specifici sono fissati dall'Atto di indirizzo adottato dalla Segreteria Operativa dell'EGATO/4 nel gennaio 2017 (Del. 1 del 23-01-2017), come strumento sulla base del quale fissare i contenuti dell'aggiornamento del Piano, e sono organizzati per punti relativi all'Ambito nel suo complesso e ad ogni segmento di servizio che costituisce il SII. Si richiamano nel seguito per chiarezza di esposizione.

Obiettivi di carattere complessivo riguardano:

- l'adeguamento degli impianti di depurazione dei reflui con capacità di trattamento superiore ai 2.000 A.E. alle Direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE e alle misure d'area del Piano regionale di Tutela delle Acque, anche considerando che il bacino ATO 4 è parte integrante del bacino del fiume Po (Area Sensibile Alto Adriatico) e quindi da monitorare al fine della riduzione dei nutrienti (fosforo ed azoto);
- la razionalizzazione del sistema di depurazione laddove troppo parcellizzato in piccoli impianti scarsamente efficienti;
- l'adeguamento dei sistemi di potabilizzazione, disinfezione e monitoraggio della qualità dell'acqua immessa in rete in adempimento alla Direttiva 98/83/CE e D.Lgs. 31/2001 come integrato dal D.Lgs. 27/2002;
- il mantenimento di adeguati livelli di efficienza (prescritti dalla vigente Disciplina) nelle reti e negli impianti affidati in gestione mediante attivazione di tutti i necessari adeguamenti straordinari.

Aggiornamento biennale della proposta tariffaria (anni 2018-2019) ex Del. ARERA n. 918/2017, approvato dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 14 del 22-06-2018

Gli adempimenti imposti dalla Delib. ARERA n. 918/2017 sono stati occasione per una revisione dei Programmi degli Interventi ed i Gestori, mediante la compilazione del così detto “File RDT2018”, hanno proposto un aggiornamento/riallineamento degli investimenti previsti per il biennio 2018-19, che tenesse in conto delle eventuali nuove emergenze emerse e delle necessità materializzatesi conseguentemente all'evento alluvionale del novembre 2016. Alcune società hanno, in linea di massima, confermato gli interventi previsti nel 2016, con moderati aggiustamenti; altre hanno introdotto profonde modifiche, “riassemblato” gli interventi o suddividendoli in lotti funzionali. In questi ultimi casi, come verrà meglio spiegato nei paragrafi successivi, il trattamento statistico dei dati è risultato più complesso e per addivenire a risultati dotati di una certa significatività si è reso necessario introdurre alcune approssimazioni e/o scartare taluni valori.

Va inoltre detto che la specifica situazione in cui si trova l'Ambito n.4 Cuneese, vale a dire la concomitanza della scadenza dell'affidamento gestionale, durante l'anno 2017, di buona parte delle gestioni in essere, prorogate con Delib. ATO4 n. 12 del 01-08-17 sino alla “*piena operatività del soggetto individuato come nuovo gestore del ciclo idrico*”, fa sì che il Programma interventi potrà necessariamente subire in futuro ulteriori modifiche che dovranno ovviamente interfacciarsi con la pianificazione generale prevista nell'aggiornamento del Piano d'Ambito per il periodo 2018÷2047.

Analisi dello stato di attuazione al 30 settembre 2018 degli interventi previsti in pianificazione 2016-2019

- Analisi in termini di “Numero di Interventi conclusi” -

L'analisi che segue tiene in considerazione il *numero di interventi* previsti nel triennio 2016 - 2017 - 2018 (ex Del. 11 del 27-05-2016) e dichiarati dai Gestori conclusi al 30 settembre 2018, a prescindere dai loro importi.

Gli interventi conseguenti all'alluvione di novembre 2016 (in buona parte cofinanziati da fondi pubblici) sono stati integrati ed indicati in apposita colonna nella tabella riportata sotto e ricompresi nel computo complessivo degli interventi in corso di realizzazione. Naturalmente gli stessi non potevano essere previsti nella pianificazione approvata a maggio 2016.

Dagli allegati prospetti excel opportunamente compilati dai gestori, si può evincere quanto riassunto nella *Tabella 1* che segue, precisando che i dati in essa riportate hanno una valenza esclusivamente indicativa e statistica ed hanno un senso se valutati nell'insieme, a scala di intero ambito; ogni riga della tabella su riportata non può essere considerata come un metro di giudizio sull'operatività del singolo gestore.

Per il trattamento statistico dei dati di cui sopra si è preso come riferimento il numero degli interventi previsti nella pianificazione originaria (“MTI-2”) ex Del. 11 del 27-05-2016.

GESTORE	N° Interventi previsti in programma in Programma Interventi (File Criticità - MTI2) ex Delib. 11/27-05-2016 per il quadriennio 2016-2019	N° Interventi previsti nel quadriennio 2016-19 e dichiarati ultimati al 30 settembre 2018	N° Interventi Alluvione nov 2016 non previsti ma realizzati ed ultimati al 30 settembre 2018	Percentuale di realizzazione (come N° interventi)
ACDA (con AIGO e CRVC)	72	164	14	
CALSO	47	38	18	
SISI	14	11	0	79%
INFERNOTTO ACQUA	29	12	0	41%
MONDO ACQUA	37	18	17	95%
ALSE	49	22	12	69%
ALPI ACQUE	60	49	3	87%
TECNOEDIL	113	31	4	31%
CRPV	Dati non disponibili	Dati non forniti	Dati non forniti	Dati non forniti
IRETI (Comuni ATO)	23	1	0	
ALAC	13	4	0	31%
TOT ATO4	362	147	36	51%

Tabella 1. Interventi realizzati vs Interventi presenti in Programma Interventi

Nella tabella di cui sopra salta immediatamente all'occhio il fatto che per taluni gestori il numero di interventi previsti nel triennio 2016-17-18 e dichiarati conclusi al 30-09-2018 è maggiore del numero di interventi previsti nel quadriennio 2016-19 (ACDA S.p.A. e CALSO S.p.A.).

Questa apparente contraddizione è imputabile al fatto che alcuni interventi, previsti nella pianificazione originaria 2016 come unico lavoro, nei successivi aggiornamenti e, in ultimo, nel recente aggiornamento biennale della proposta tariffaria 2018-19 ex Del. ARERA n. 918/2017 – Raccolta RDT2018, approvata da EGATO4 con Del. n. 14 del 22-06-2018, sono stati sviluppati come lotti funzionali; inoltre, quest'ultimo aggiornamento è stato occasione per rivedere l'elenco interventi ed in taluni casi adeguarlo alle nuove esigenze emerse nel corso del tempo, anche conseguenti agli ingenti danni registrati post alluvione del novembre 2016.

Un altro valore che attira l'attenzione è quello relativo ad Ireti S.p.A. la quale, apparentemente, sembra aver realizzato pochissimi interventi; va tuttavia considerato che il gestore, in questo caso, ha indicato nel Programma Interventi un elevato numero di attività di Manutenzione straordinarie, che vanno a coprire le intere annualità e che pertanto non è possibile considerate "concluse".

Premesso quanto sopra, ai fini di ottenere risultati statistici dotati di un'adeguata significatività, si è deciso di *eliminare gli outliers* (Acda, Calso, Ireti), cioè quei dati che palesemente sono affetti da disturbi e, se considerati, potrebbero condurre a risultati errati.

Il diagramma a torta che segue descrive lo stato di attuazione (inteso come numero interventi, a prescindere dal loro importo) del Programma Interventi previsto per il quadriennio 2016-2019, al 30 settembre 2018, cioè a circa tre anni dalla sua vigenza:

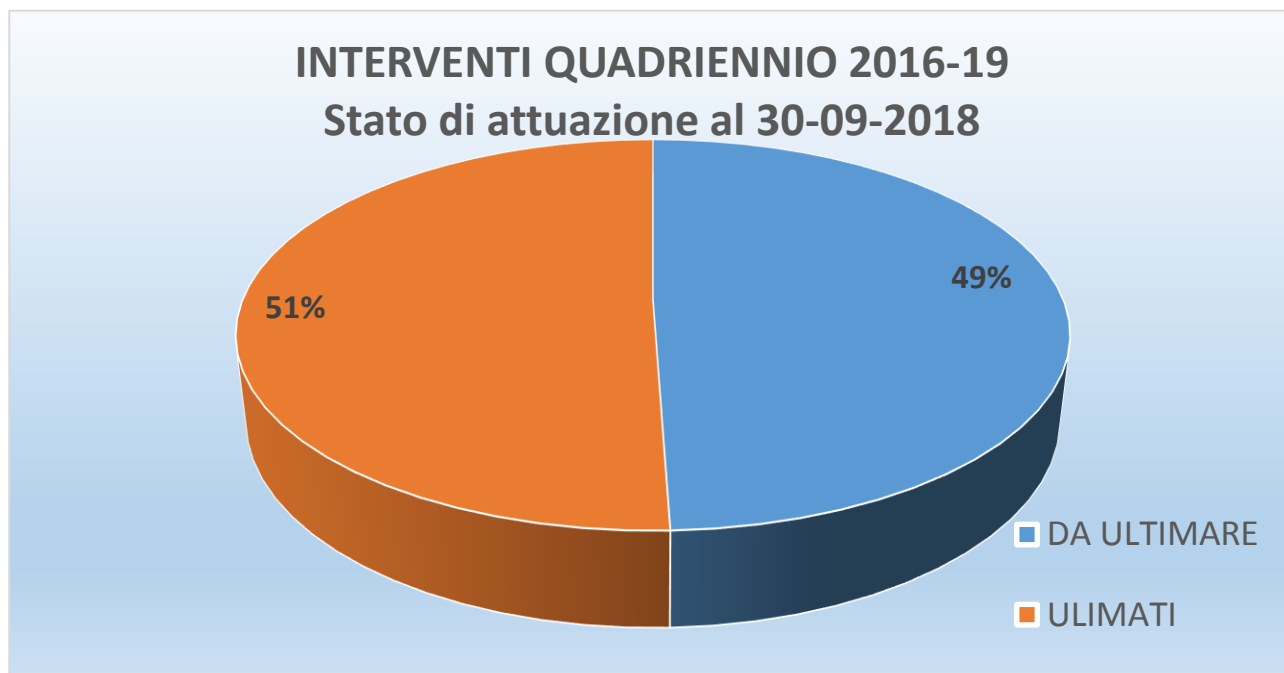


Grafico 1

Il diagramma evidenzia il fatto che nelle annualità 2016-2017-2018, seppur il 2018 non sia ancora concluso, si è realizzata circa la metà degli interventi previsti per il quadriennio 2016-17-18-19; occorre però tener conto del fatto che tra gli outliers che si è dovuto escludere è ricompreso il Gestore ACDA S.p.A. che gestisce una cospicua parte di territorio dell'Ambito cuneese.

- Analisi in termini di “Valore dei lavori eseguiti” -

Un'altra analisi che è stata possibile effettuare sui dati raccolti durante la ricognizione del settembre scorso, considerando tutti i Gestori e senza escluderne nessuno, è quella relativa al *valore degli investimenti* che i Gestori hanno dichiarato realizzati al 30 settembre 2018. La precisa rendicontazione economica ed i consuntivi (in termini di Ip e LIC) saranno oggetto di future ricognizioni verifiche, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e ambiente (ARERA), tuttavia la raccolta eseguita ha consentito di arrivare alle conclusioni che seguono:

Tot speso 2016-17-"18" (netto contributi)	€ 52.117.690	91%
Tot previsto 2016-17-18 (netto contributi) in MTI2	€ 57.135.006	9%

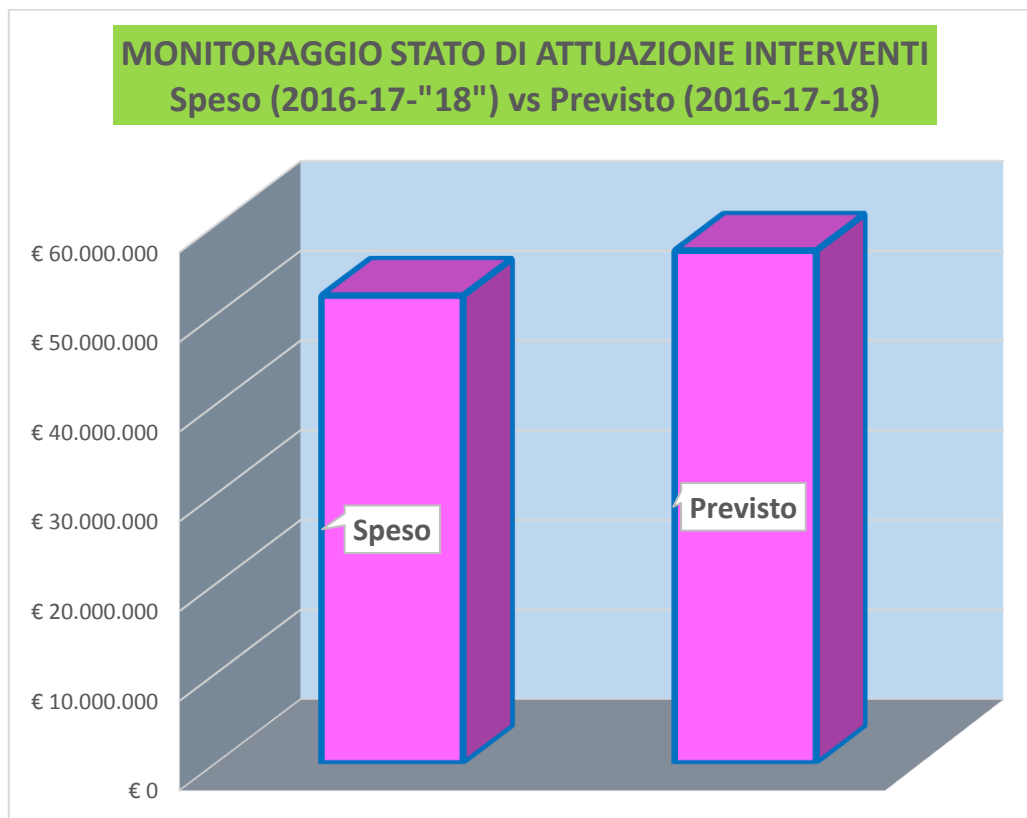


Grafico 2

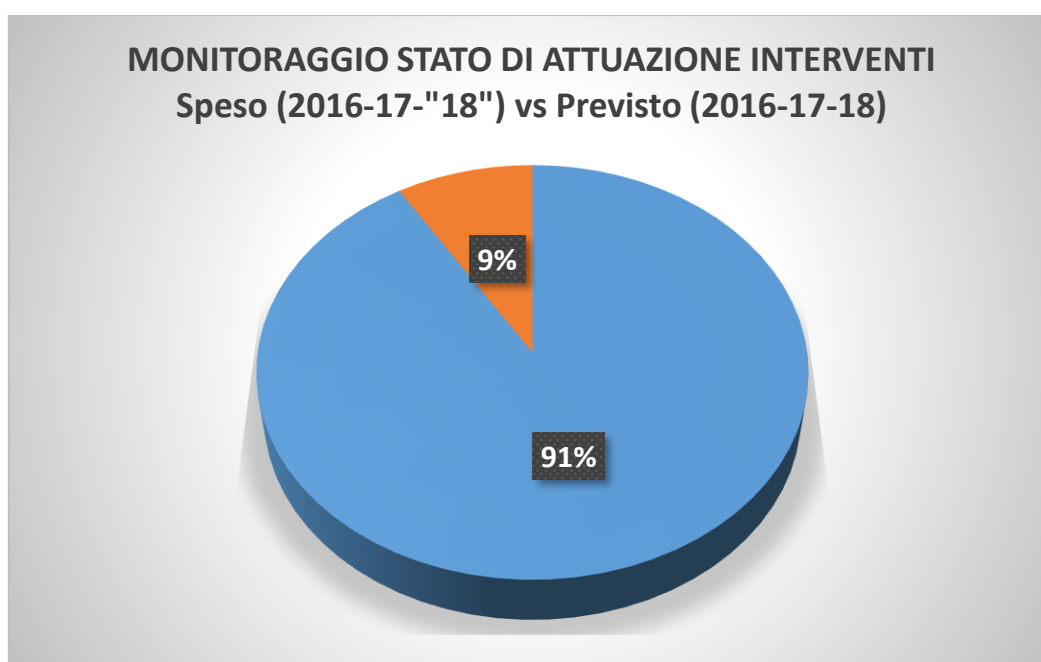


Grafico 3

Tot speso 2016-17-"18" (netto contributi)	€ 52.117.690	65%
Tot previsto 2016-17-18-19 (netto contributi) in MTI2	€ 80.128.156	35%

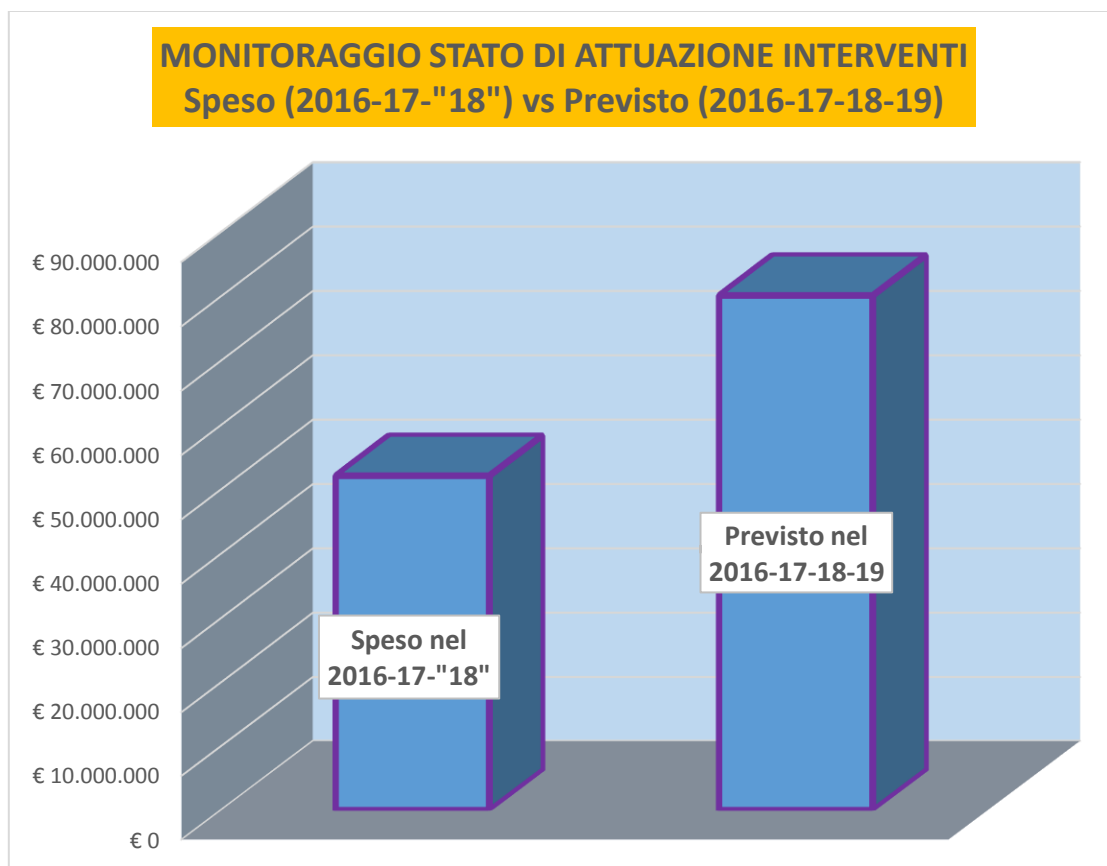


Grafico 4

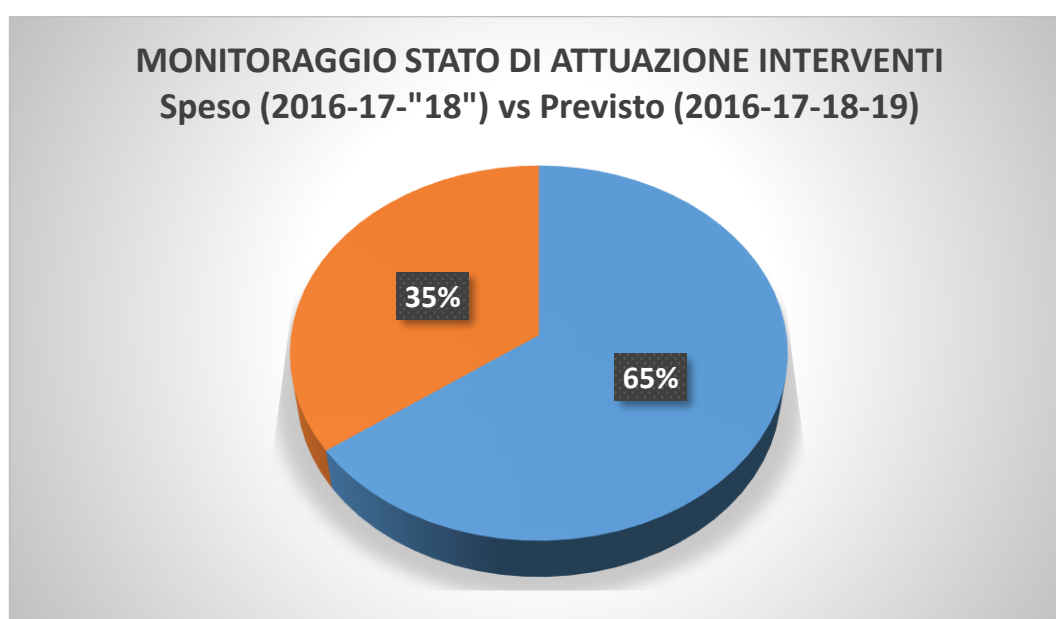


Grafico 5

Le analisi e i diagrammi di cui sopra, che per semplicità ed in prima approssimazione considerano il 2018 come anno “circa consuntivo” al pari del 2017 e 2016, evidenziano come, in termini di importi spesi, nel triennio 2016-17-18 si siano realizzati circa il 90% di quanto previsto in Pianificazione per il medesimo triennio (situazione teorica ideale 100%) e circa il 65% di quanto previsto in Pianificazione per il quadriennio 2016-17-18-19 (situazione ideale teorica 75%).

Proposte di varianti al vigente programma degli interventi 2016-2018

In concomitanza con la ricognizione sullo stato di attuazione del vigente programma interventi, i gestori di ATO4 hanno fornito le proprie proposte di variante, con lo scopo di riallineare la pianificazione con importi di maggior dettaglio in funzione degli sviluppi progettuali che ci sono stati nel corso dei mesi, con le eventuali nuove esigenze che mano a mano sono emerse sul territorio, anche e soprattutto conseguenti all'evento alluvionale dello scorso novembre 2016.

L'attività istruttoria degli Uffici sulle suddette proposte di aggiornamento si è posta come obiettivo il rispetto ed il mantenimento dei budget previsti nella Pianificazione 2016-19 approvata dalla Conferenza dell'Ente d'Ambito con la Delibera 11 del 2016.

Le proposte di aggiornamento sono risultate nel complesso accoglibili, con alcune prescrizioni riportate gestore per gestore nei rispettivi paragrafi seguenti, e poi riassunte nella tabella conclusiva in calce alla presente relazione.

ACDA S.p.A (comprensivo degli ex Comuni AIGO Srl e CRVC Srl)

Le principali variazioni proposte al Piano degli Interventi sono dovute in larga misura alle urgenze emerse per la realizzazione dei lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 che ha notoriamente colpito principalmente aree gestite da ACDA S.p.A. facendo registrare circa 12 Ml di € di danni. Gli interventi di ripristino danni alluvionali, che ammontano a circa 5,5 Ml di € nel triennio 2017-18-19 sono in buona parte assistiti da finanziamenti pubblici e gravano su tariffa per circa € 1,3 Ml.

La nuova proposta di Piano Interventi tiene inoltre conto degli “Ex Comuni CRVC Srl” recentemente acquisiti da ACDA Sp.A.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018) (Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)															
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)			TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)	
ACDA	Proposta di variante Settembre 2018	€ 5.786.012	€ 205.988	€ 9.502.682	€ 523.917	€ 10.556.552	€ 2.006.197	€ 8.222.359	€ 1.957.626	€ 34.067.605	€ 4.693.729	€ 8.067.414	€ 29.373.877	€ 4.336.186	€ 1.367.710	€ 2.968.476	
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 5.305.000	€ 82.500	€ 7.765.191	€ 850.000	€ 5.380.000	€ 30.000	€ 7.550.000	€ 0	€ 26.000.191	€ 962.500		€ 25.037.691				

Il Gestore propone un incremento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto dei ripristini danni alluvione, pari a € 2.968.476.

CALSO S.p.A.

Le principali variazioni proposte al Piano degli Interventi consistono nel posticipare interventi ritenuti meno urgenti per consentire la realizzazione dei lavori di ripristino dei danni legati all' alluvione novembre 2016, che ammontano a circa € 400.000. Gli interventi di ripristino

danni alluvione, che ammontano a circa € 300.000 nel triennio 2017-18-19, sono in buona parte assistiti da finanziamenti pubblici e gravano su tariffa solo per circa € 95.799.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
CALSO	Proposta di variante Settembre 2018	€ 845.732	€ 60.500	€ 825.242	€ 276.620	€ 900.203	€ 45.781	€ 740.000	€ 60.000	€ 3.311.177	€ 442.901	€ 509.537	€ 2.868.275	€ 131.337	€ 95.799	€ 35.538
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 683.000	€ 60.500	€ 676.640	€ 4.201	€ 732.000	€ 0	€ 710.000	€ 0	€ 2.801.640	€ 64.701		€ 2.736.938			

Il Gestore propone un incremento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto dei ripristini danni alluvione, pari a € 35.538, quindi, sostanzialmente vengono confermate le previsioni di piano.

INFERNOTTO ACQUA S.r.l.

Il gestore dichiara di non aver realizzato nulla di quanto previsto nel 2016 a causa delle criticità dovute al processo di fusione con ACDA S.p.A. allora in auge. Propone un programma interventi che prevede per quadriennio 2016-19 un totale di € 772.734,00, a fronte di un previsto di € 1.089.672, con una riduzione, pertanto, di € 316.938,00.

Per quanto riguarda l'alluvione novembre 2016, i Comuni del bacino INFERNOTTO Srl non hanno subito danni degni di rilievo.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
INFERNOTTO	Proposta di variante Settembre 2018	€ 0	€ 0	€ 98.035	€ 0	€ 179.049	€ 0	€ 495.650	€ 0	€ 772.734	€ 0	-€ 316.938	€ 772.734	-€ 316.938	€ 0	-€ 316.938
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 145.000	€ 0	€ 173.372	€ 0	€ 385.650	€ 0	€ 385.650	€ 0	€ 1.089.672	€ 0	-€ 316.938	€ 1.089.672	-€ 316.938	€ 0	-€ 316.938

Il Gestore propone una riduzione degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII pari a € 316.938,00.

SISI S.r.l.

Il gestore, per quanto attiene alle annualità 2016 e 2017 attesta di aver realizzato un importo lavori inferiore alle previsioni di Piano.

Per quanto riguarda l'alluvione novembre 2016, i Comuni del bacino SISI Srl non hanno subito danni degni di rilievo.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
SISI	Proposta di variante Settembre 2018	€ 5.878.301	€ 3.993.454	€ 3.882.482	€ 2.722.035	€ 2.410.803	€ 1.067.517	€ 4.100.200	€ 798.338	€ 16.271.786	€ 8.581.344	-€ 1.706.214	€ 7.690.442	-€ 1.753.954	€ 0	
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 9.988.312	€ 8.033.603	€ 2.989.688	€ 500.000	€ 2.500.000	€ 0	€ 2.500.000	€ 0	€ 17.978.000	€ 8.533.603		€ 9.444.397			-€ 1.753.954

Il Gestore propone una riduzione degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII pari a € 1.753.954.

MONDO ACQUA S.p.A.

Il gestore, per quanto attiene alle annualità 2016 e 2017 attesta di aver realizzato un importo lavori di gran lunga inferiore alle previsioni di Piano.

Gli interventi di ripristino danni alluvione 2016, che ammontavano a circa 1,6 Ml di €, sono nella maggior parte dei casi, ultimati ed ammontano a circa € 350.000 di cui solo € 35.890 gravano sulla tariffa del SII.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
MONDO ACQUA	Proposta di variante Settembre 2018	€ 485.280	€ 5.436	€ 1.339.560	€ 460.062	€ 1.882.316	€ 414.219	€ 2.899.700	€ 610.200	€ 6.606.856	€ 1.489.917	-€ 433.644	€ 5.116.939	-€ 1.832.661	-€ 35.890	-€ 1.796.771
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 1.510.100	€ 0	€ 2.122.400	€ 90.900	€ 1.574.000	€ 0	€ 1.834.000	€ 0	€ 7.040.500	€ 90.900		€ 6.949.600			

Il Gestore propone una riduzione degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19, al netto dei ripristini danni alluvione, a valere sulla Tariffa del SII pari a € 1.796.771.

ALPI ACQUE S.p.A.

Il gestore, per quanto attiene alle annualità 2016 e 2017 attesta di aver realizzato un importo lavori inferiore alle previsioni di Piano.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
ALPIACQUE	Proposta di variante Settembre 2018	€ 1.364.387	€ 0	€ 1.394.756	€ 31.400	€ 2.242.910	€ 0	€ 4.360.000	€ 228.000	€ 9.362.053	€ 259.400	€ 1.722.053	€ 9.102.653	€ 1.462.653	€ 63.229	€ 1.399.424
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 1.720.000	€ 0	€ 1.920.000	€ 0	€ 2.125.000	€ 0	€ 1.875.000	€ 0	€ 7.640.000	€ 0		€ 7.640.000			

Il Gestore propone un aumento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto dei ripristini danni alluvione, pari a € 1.399.424, legato principalmente agli interventi di sostituzione acquedotto in Fossano (circa 1 Ml di €) e in Saluzzo (circa € 900.000 di cui circa 220.000 a valere su finanziamento regionale), inizialmente, nel 2016, non previsti.

Per quanto riguarda l'alluvione novembre 2016, i Comuni del bacino Alpi Acque S.p.A. hanno subito danni limitati, complessivamente per circa € 140.000, di cui solo € 63.299 a gravare sulla Tariffa del SII.

ALSE S.p.A.

Il gestore, salvo ritardi/anticipazioni, conferma in linea di massima la pianificazione vigente. L'aumento di importi è sostanzialmente legati agli interventi di ripristino danni alluvione novembre 2016, che fece registrare circa € 500.000 di danni, i cui interventi di ripristino ammontano a circa € 240.000, di cui solo € 38.331 a gravare sulla Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
ALSE	Proposta di variante Settembre 2018	€ 62.978	€ 0	€ 432.396	€ 103.792	€ 441.732	€ 221.859	€ 777.500	€ 0	€ 1.714.606	€ 325.651	€ 397.695	€ 1.388.955	€ 156.044	€ 38.331	€ 117.713
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGAT04 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 175.311	€ 0	€ 310.100	€ 0	€ 378.000	€ 0	€ 453.500	€ 84.000	€ 1.316.911	€ 84.000		€ 1.232.911			

Il Gestore propone un incremento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto dei ripristini danni alluvione, pari a € 117.713.

TECNOEDIL S.p.A.

Il gestore, per quanto attiene alle annualità 2016 e 2017 attesta di aver realizzato un importo lavori inferiore alle previsioni di Piano.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Settembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa)	DELTA (netto contributi e alluvione)
TECNOEDIL	Proposta di variante Settembre 2018	€ 1.667.975	€ 0	€ 5.439.335	€ 0	€ 5.132.405	€ 86.575	€ 8.232.402	€ 415.000	€ 20.472.116	€ 501.575	€ 1.565.169	€ 19.970.542	€ 1.090.594	€ 52.124	€ 1.038.470
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 3.522.225	€ 27.000	€ 3.663.583	€ 0	€ 5.836.139	€ 0	€ 5.885.000	€ 0	€ 18.906.947	€ 27.000		€ 18.879.947			

Il Gestore propone un aumento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto dei ripristini danni alluvione, pari a € 1.038.470.

Per quanto riguarda l'alluvione novembre 2016, i Comuni del bacino Tecnoedil S.p.A. hanno subito danni limitati, complessivamente per circa € 400.000. Gli interventi di ripristino danni alluvionali, che ammontano a circa € 225.000 nel triennio 2017-18-19 sono in buona parte assistiti da finanziamenti pubblici e gravano su tariffa per del SII circa € 52.124.

IRETI S.p.A.

La proposta di programma interventi conferma in buona parte gli importi previsti; viene inserito un nuovo intervento puntuale su acquedotto Ceresole d'Alba. Per quanto riguarda l'alluvione novembre 2016, i Comuni del bacino IRETI S.p.A. non hanno subito danni degni di rilievo.

Per quanto riguarda i Comuni ex CIPE di Racconigi e Costigliole Saluzzo il Gestore non ha fornito, inizialmente, i dati e i documenti funzionali alla definizione tariffaria ai sensi della Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR. Ne sono conseguiti ritardi nella predisposizione di una pianificazione 2016-2019 approvata da EGATO4 e da AEEGSI. Nel corso della presente ricognizione il Gestore non ha fornito proposte di riallineamento e/o rendicontazioni sullo stato di avanzamento di eventuali lavori in corso per quanto riguarda i Comuni di Racconigi e Costigliole Saluzzo. Ne consegue che l'analisi in parola riguarda unicamente i Comuni ATO di Ceresole d'Alba e Sanfrè.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)														
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)
IRETI (Comuni Ato)	Proposta di variante Settembre 2018	€ 87.500	€ 0	€ 7.123	€ 2.136	€ 61.500	€ 7.000	€ 381.500	€ 7.000	€ 537.623	€ 16.136	€ 160.623	€ 521.487	€ 144.487	€ 0	€ 144.487
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 103.500	€ 0	€ 45.500	€ 0	€ 84.000	€ 0	€ 144.000	€ 0	€ 377.000	€ 0		€ 377.000			

Il Gestore propone un incremento degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII pari a € 144.487. Tale aumento è principalmente legato all'inserimento di un intervento sull'acquedotto di Ceresole d'Alba, previsto in realizzazione tra marzo e giugno 2019 e che si ritiene indispensabile e non procrastinabile al fine di poter continuare a garantire il servizio.

ALAC S.p.A.

La proposta di programma interventi, salvo ritardi accumulati e necessità di posticipi, conferma in buona parte gli importi previsti.

L'alluvione di Novembre 2016 ha fatto registrare circa 2,6 Ml di € di danni, i cui interventi di ripristino, sono per lo più assistiti da finanziamento regionale e previsti per le annualità 2018 e 2019 e gravano sulla Tariffa del SII solo per € 1.200.000.

		INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)															
		(Monitoraggio Novembre 2018 e proposta di aggiornamento)															
		2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)				TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
		Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv. 2016 su tariffa	DELTA (netto contributi e alluvione)	
ALAC	Proposta di variante Settembre 2018	€ 900.000	€ 0	€ 214.932	€ 0	€ 1.030.000	€ 700.000	€ 4.170.000	€ 0	€ 6.314.932	€ 700.000	-€ 425.068	€ 5.614.932	-€ 1.125.068	€ 1.200.000	-€ 2.325.068	
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 1.100.000	€ 0	€ 1.320.000	€ 0	€ 2.580.000	€ 0	€ 1.740.000	€ 0	€ 6.740.000	€ 0		€ 6.740.000				

Il Gestore "Grossista" manifesta forti ritardi nella realizzazione degli interventi pianificati per il 2016-17-18, imputabili a problemi interni alla Società, e propone una riduzione degli interventi previsti nel quadriennio 2016-19 a valere sulla Tariffa del SII, al netto degli interventi di ripristino danni alluvione, pari a € 2.325.068.

COMUNI RIUNITI DELLA PIANA DEL VARAITA S.r.l.

Il Gestore non ha fornito i dati e i documenti funzionali alla definizione tariffaria ai sensi della Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR. Ne consegue che non si dispone di una pianificazione 2016-2019 approvata da EGATO4 e da AEEGSI. Il Gestore non ha, conseguentemente, fornito proposte di riallineamento e/o rendicontazioni sullo stato di avanzamento di eventuali lavori in corso.

Il Gestore Comuni Riuniti Piana del Varaita S.r.l. ha inviato con com.ne in ric.ne EGATO/4 al prot. 1621 del 06/07/2017 Proposta di aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019 con allegata la documentazione al momento oggetto di istruttoria da parte degli Uffici di EGATO4.

Conclusioni

Dalle analisi effettuate si possono trarre le seguenti conclusioni:

- in termini di **"numero di interventi"** sono dichiarabili conclusi al 30 settembre 2018 (al netto di Acda, Calso e Ireti) **circa il 51%** dei lavori previsti nel quadriennio 2016-19;
- in termini di **importi**, nel triennio 2016-17-18 sono stati realizzati **circa il 90%** di quanto previsto in Pianificazione per il medesimo triennio;
- in termini di **importi**, nel triennio 2016-17-18 sono stati realizzati e **circa il 65%** di quanto previsto in Pianificazione per il quadriennio 2016-17-18-19 (situazione ideale teorica 75%).
- nel triennio 2016-17-18 sono stati conclusi interventi per **un totale di circa € 65 milioni** (lordo contributi pubblici) corrispondenti a circa **€ 52 milioni** (netto contributi);
- nel triennio 2016-17-18 sono stati conclusi interventi per **una media di circa € 21,6 milioni all'anno** (lordo contributi pubblici), corrispondenti a circa **€ 17,3 milioni/anno** (netto contributi).

Quanto sopra, per immediatezza, è riassumibile come nella tabella seguente:

Numero interventi conclusi rispetto ai previsti nel quadriennio 2016-17-18-19 (al netto di Acda, Calso e Ireti)	51% c.a.
Percentuale importo lavori realizzati da tutti i Gestori nel triennio 2016-17-18 rispetto al previsto nel medesimo triennio	90% c.a.
Percentuale importo lavori realizzati da tutti i Gestori nel triennio 2016-17-18 rispetto al previsto nel quadriennio 2016-17-18-19 (periodo regolatorio ARERA)	65 % c.a.
Totale importo lavori realizzati da tutti i Gestori nel triennio 2016-17-18 (lordo contributi pubblici)	€ 65.000.000
Media annua lavori realizzati da tutti i Gestori nel 2016-17-18 (lordo contributi)	€ 21.600.000
Totale importo lavori realizzati da tutti i Gestori nel triennio 2016-17-18 (netto contributi pubblici)	€ 52.100.000
Media annua lavori realizzati da tutti i Gestori nel 2016-17-18 (netto contributi pubblici)	€ 17.300.000

Si ritiene pertanto, in prima battuta, soddisfacente l'andamento dei lavori sul Servizio Idrico Integrato di ATO4, ricordando tuttavia che una più dettagliata analisi degli investimenti realizzati, in termini di costi (Ip e LIC) sarà oggetto di successiva relazione.

Per quanto riguarda i Gestori

- ALAC S.p.A.
- Infernotto Srl
- Mondo Acqua S.p.A.
- SISI Srl

che manifestano un ritardo nella realizzazione degli interventi previsti e propongono una riduzione degli importi a valere sulla tariffa del SII, si richiede di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap con quanto proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA).

Per quanto riguarda i Gestori

- ACDA S.p.A.
- Alpi Acque S.p.A.
- ALSE S.p.A.
- CALSO S.p.A.
- Ireti S.p.A.
- Tecnoedil S.p.A.

che hanno formulato proposte di aggiornamento Programma interventi in aumento rispetto alle previsioni del maggio 2016, si ritiene che per gli interventi previsti nel 2019 non legati all'alluvione 2016 e non assistiti da cofinanziamento pubblico si debba autorizzare unicamente l'attività di progettazione assunta pari a circa il 7% dell'importo complessivo di ciascun intervento.

Quindi, nella fase di attivazione della progettazione dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro sarà necessaria una verifica preventiva con l'Ente d'Ambito per valutare la

priorità dell'intervento e la necessità di attivarlo celermente prima della presa in carico da parte del Gestore unico d'Ambito.

Nel corso dei prossimi monitoraggi, che avverranno nei prossimi mesi, si verificherà con maggior dettaglio l'andamento della spesa, al fine di contenere il più possibile gli sforamenti rispetto ai budget previsti nel 2016.

Si allega alla presente relazione:

- ALLEGATO 1: tabella riassuntiva delle prescrizioni imposte ad ogni gestore.
- ALLEGATO 2: prospetto riassuntivo, gestore per gestore, di raffronto tra gli importi lavori previsti nella vigente pianificazione (ex Delibere ATO4 n. 11 e n. 17 del 2016) e le proposte di aggiornamento/riallineamento presentate dai gestori nel periodo gennaio-aprile 2018;
- ALLEGATO 3: proposte di programmi interventi 2016-2017 con le modifiche formulate gestori di ATO4.

ALLEGATO 1: tabella riassuntiva delle prescrizioni impartite ad ogni gestore

GESTORE	DELTA SU TARIFFA TRA PROPOSTA Settembre 2018 E PIANIFICATO Mag2016 (netto contributi e netto interventi alluvione 2016)	PRESCRIZIONI
ACDA (comprensivo dei Comuni ex AIGO e ex CRVC)	+ € 2.968.476	Aumento in buona parte dovuto agli interventi alluvione 2016.
CALSO	+ € 35.538	Aumento in buona parte dovuto agli interventi alluvione 2016.
INFERNOTTO ACQUA	- € 316.938	Si richiede al Gestore di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA).
SISI	- € 1.753.954	Si richiede al Gestore di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA).
MONDO ACQUA	- € 1.796.771	Si richiede al Gestore di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA).
ALPI ACQUE	+ € 1.399.424	Aumento dovuto principalmente all'inserimento di interventi di sostituzione tubazioni acquedotto in Fossano (c.a. 1Ml di €) e Saluzzo (c.a. 1Ml di €)
ALSE	+ € 117.713	Aumento in buona parte dovuto agli interventi alluvione 2016.
TECNOEDIL	+ € 1.038.470	Aumento dovuto principalmente ad aumenti di costo non previsti di alcuni interventi (es. Dep. Biegio – Castellinaldo)
IRETI	+ € 144.487	Aumento principalmente legato all'inserimento di un intervento sull'acquedotto di Ceresole d'Alba, da realizzarsi fra marzo e giugno 2019, che si ritiene indispensabile e non procrastinabile al fine di poter continuare a garantire il servizio.
ALAC	- € 2.325.068	Ritardi dovuti a problemi interni alla società. Si richiede al Gestore di procedere celermente per la realizzazione delle previsioni di piano ponendosi come obiettivo il recupero del gap col budget proposto nel 2016 dal Gestore ed approvato dalla Conferenza d'Ambito e dall'AEEGSI (oggi ARERA).

ALLEGATO 2: prospetto riassuntivo, gestore per gestore, di raffronto tra gli importi lavori previsti nella vigente pianificazione (ex Delibere ATO4 n. 11 e n. 17 del 2016) per il quadriennio 2016-19 e le proposte di aggiornamento/riallineamento presentate dai gestori per lo stesso periodo nel settembre 2018

			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018) (Monitoraggio Settembre 2018 e proposta di aggiornamento)														
			2016 (consuntivo)		2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		TOT 2016-17-18-19 (lordo contributi)			TOT 2016-17-18-19 (netto contributi)		TOT 2016-17-18-19 (netto contributi e alluvione 2016)	
			Valore investimento annuo (lordo contributi) 2016	Di cui contributi 2016	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	TOT lordo contributi	Di cui contributi	DELTA (lordo contributi)	TOT netto contributi	DELTA (netto contributi)	TOT interv. Alluv 2016 su tariffa)	DELTA (netto contributi e alluvione)
ACDA	Proposta di variante Settembre 2018		€ 5.786.012	€ 205.988	€ 9.502.682	€ 523.917	€ 10.556.552	€ 2.006.197	€ 8.222.359	€ 1.957.626	€ 34.067.605	€ 4.693.729	€ 8.067.414	€ 29.373.877	€ 4.336.186	€ 1.367.710	€ 2.968.476
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 5.305.000	€ 82.500	€ 7.765.191	€ 850.000	€ 5.380.000	€ 30.000	€ 7.550.000	€ 0	€ 26.000.191	€ 962.500		€ 25.037.691			
ALAC	Proposta di variante Settembre 2018		€ 900.000	€ 0	€ 214.932	€ 0	€ 1.030.000	€ 700.000	€ 4.170.000	€ 0	€ 6.314.932	€ 700.000	-€ 425.068	€ 5.614.932	-€ 1.125.068	€ 1.200.000	-€ 2.325.068
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 1.100.000	€ 0	€ 1.320.000	€ 0	€ 2.580.000	€ 0	€ 1.740.000	€ 0	€ 6.740.000	€ 0		€ 6.740.000			
ALPIACQUE	Proposta di variante Settembre 2018		€ 1.364.387	€ 0	€ 1.394.756	€ 31.400	€ 2.242.910	€ 0	€ 4.360.000	€ 228.000	€ 9.362.053	€ 259.400	€ 1.722.053	€ 9.102.653	€ 1.462.653	€ 63.229	€ 1.399.424
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 1.720.000	€ 0	€ 1.920.000	€ 0	€ 2.125.000	€ 0	€ 1.875.000	€ 0	€ 7.640.000	€ 0		€ 7.640.000			
ALSE	Proposta di variante Settembre 2018		€ 62.978	€ 0	€ 432.396	€ 103.792	€ 441.732	€ 221.859	€ 777.500	€ 0	€ 1.714.606	€ 325.651	€ 397.695	€ 1.388.955	€ 156.044	€ 38.331	€ 117.713
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 175.311	€ 0	€ 310.100	€ 0	€ 378.000	€ 0	€ 453.500	€ 84.000	€ 1.316.911	€ 84.000		€ 1.232.911			
CALSO	Proposta di variante Settembre 2018		€ 845.732	€ 60.500	€ 825.242	€ 276.620	€ 900.203	€ 45.781	€ 740.000	€ 60.000	€ 3.311.177	€ 442.901	€ 509.537	€ 2.868.275	€ 131.337	€ 95.799	€ 35.538
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 683.000	€ 60.500	€ 676.640	€ 4.201	€ 732.000	€ 0	€ 710.000	€ 0	€ 2.801.640	€ 64.701		€ 2.736.938			
INFERNOTTO	Proposta di variante Settembre 2018		€ 0	€ 0	€ 98.035	€ 0	€ 179.049	€ 0	€ 495.650	€ 0	€ 772.734	€ 0	-€ 316.938	€ 772.734	-€ 316.938	€ 0	-€ 316.938
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 145.000	€ 0	€ 173.372	€ 0	€ 385.650	€ 0	€ 385.650	€ 0	€ 1.089.672	€ 0		€ 1.089.672			
IRETI (Comuni Ato)	Proposta di variante Settembre 2018		€ 87.500	€ 0	€ 7.123	€ 2.136	€ 61.500	€ 7.000	€ 381.500	€ 7.000	€ 537.623	€ 16.136	€ 160.623	€ 521.487	€ 144.487	€ 0	€ 144.487
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 103.500	€ 0	€ 45.500	€ 0	€ 84.000	€ 0	€ 144.000	€ 0	€ 377.000	€ 0		€ 377.000			
MONDO ACQUA	Proposta di variante Settembre 2018		€ 485.280	€ 5.436	€ 1.339.560	€ 460.062	€ 1.882.316	€ 414.219	€ 2.899.700	€ 610.200	€ 6.606.856	€ 1.489.917	-€ 433.644	€ 5.116.939	-€ 1.832.661	-€ 35.890	-€ 1.796.771
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 1.510.100	€ 0	€ 2.122.400	€ 90.900	€ 1.574.000	€ 0	€ 1.834.000	€ 0	€ 7.040.500	€ 90.900		€ 6.949.600			
SISI	Proposta di variante Settembre 2018		€ 5.878.301	€ 3.993.454	€ 3.882.482	€ 2.722.035	€ 2.410.803	€ 1.067.517	€ 4.100.200	€ 798.338	€ 16.271.786	€ 8.581.344	-€ 1.706.214	€ 7.690.442	-€ 1.753.954	€ 0	-€ 1.753.954
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 9.988.312	€ 8.033.603	€ 2.989.688	€ 500.000	€ 2.500.000	€ 0	€ 2.500.000	€ 0	€ 17.978.000	€ 8.533.603		€ 9.444.397			
TECNOEDIL	Proposta di variante Settembre 2018		€ 1.667.975	€ 0	€ 5.439.335	€ 0	€ 5.132.405	€ 86.575	€ 8.232.402	€ 415.000	€ 20.472.116	€ 501.575	€ 1.565.169	€ 19.970.542	€ 1.090.594	€ 52.124	€ 1.038.470
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		€ 3.522.225	€ 27.000	€ 3.663.583	€ 0	€ 5.836.139	€ 0	€ 5.885.000	€ 0	€ 18.906.947	€ 27.000		€ 18.879.947			
CRPVaraita	Proposta di variante Settembre 2018		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Previsto in PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)		Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili				---			
	TOTALI DELLA VARIANTE:		€ 17.078.166	€ 4.265.379	€ 23.136.541	€ 4.119.962	€ 24.837.471	€ 4.549.147	€ 34.379.310	€ 4.076.164	€ 99.431.488	€ 17.010.652	€ 9.540.628	€ 82.420.836	€ 2.292.680		-€ 488.623
	TOTALI DI MTI2:		€ 24.252.448	€ 8.203.603	€ 20.986.473	€ 1.445.101	€ 21.574.789	€ 30.000	€ 23.077.150	€ 84.000	€ 89.890.861	€ 9.762.705		€ 80.128.156			

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazioni e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
P0223	Interventi di sostituzione fognature vetuste	CEVA			126.766,80	0,00						ott-17	gen-18			TERMINATO
SC00189	Lavori di sostituzione e potenziamento rete idrica in via Vallone dell'Arma	DEMONTE			136.968,78	0,00						lug-17	lug-18			TERMINATO
SC00194	Lavori di sostituzione condotte idriche in via Rocca de Baldi e in via Bra	CUNEO			56.868,07	0,00						lug-18	set-18			IN CORSO
SC00214	Lavori di sostituzione reti idriche nelle frazioni in via Pollino	CUNEO			281.411,50	0,00						lug-18	giu-18			DA CONTABILIZZARE
SC00233	Lavori di sostituzione tubazione di distribuzione lungo via Eretta	PEVERAGNO-BOVES			67.005,97	0,00						ott-17	giu-18			TERMINATO
SC00244	Lavori di sostituzione acquedotto SP262-422	ROCCA DE' BALDI			243.235,31	130.000,00						ott-17	apr-18			TERMINATO
SC00253	Lavori di sistemazione rete idrica in fraz Villaro	ORMEA			34.996,74	0,00						set-18	ott-18			IN CORSO
SC00260	Lavori di potenziamento rete idrica nella frazione Castelletto-2° Lotto	BUSCA			206.481,98	0,00						nov-17	lug-18			TERMINATO
SC00265	Lavori di manutenzione straordinaria reti idriche e fognarie nei comuni gestiti	tutti i comuni			500.000,00	0,00						gen-18	dic-18			IN CORSO
SC00269	Lavori di sostituzione condotta vetusta via Castelletto Stura fraz Bombonina	CUNEO			166.300,54	0,00						ott-17	set-18			DA CONTABILIZZARE
SC00273	Lavori di sostituzione e potenziamento reti idriche e fognarie in loc. Pratorotondo	ACCEGLIO					95.000,00	0,00				giu-19	ago-19			
SC00279	Lavori di potenziamento rete idrica nella frazione Castelletto-3° Lotto	BUSCA					22.500,00	0,00				giu-19	lug-19			
SC00294	Lavori di asfaltatura strade	CUNEO-BORGO SAN DALMAZZO-BUSCA-CERVASCA-CARAGLIO-PAGNO-ROCCASPARVERA-SANFRONT			249.519,13	0,00						apr-18	ott-18			IN CORSO
SC00307	Lavori di riparazione perdita sulla rete idrica tramite eleaborazione di immagini satellitare	BORGO SAN DALMAZZO-CERVASCA-CUNEO-ENTRACQUE-VALDIERI-VIGNOLO			32.613,19	0,00						apr-18	ott-18			IN CORSO
SC00308	Lavori di riparazione perdita sulla rete idrica tramite eleaborazione di immagini satellitare	BUSCA-CARAGLIO-CASTELLETTO STURA-CENTALLO-DRONERO-TARANTASCA-VILLAR S.COSTANZO			39.467,21	0,00						giu-18	ott-18			IN CORSO
SC00315	Lavori di manutenzione straordinaria reti idriche e fognarie nei comuni gestiti	TUTTI I COMUNI			630.000,00	0,00	370.000,00	0,00				gen-19	dic-19			
SC00321	Trattamento protettivo mediante malte camminamento ponte via Savona	Cuneo			12.500,00	0,00						set-18	nov-18			IN CORSO
SC00341	Lavori di sistemazione rete idrica in località Lunghi	Ormea			18.667,03	0,00						ago-18	ott-18			IN CORSO
SC00349	Lavori di esecuzione dei ripristini definitivi in asfalto dopo interventi di manutenzione rete	Vari Comuni					133.885,08	0,00				apr-19	mag-19			
SC00355	Lavori di asfaltature strade	Vari Comuni			319.962,93	0,00						ott-18	nov-18			IN CORSO
SC00358	Lavori di asfaltature strade	Vari Comuni					438.130,17	0,00				mag-19	giu-19			
SG00218	Realizzazione condotta e impianto sollevamento per eliminazione impianto depurazione Ricogno	DRONERO			249.383,06	0,00						ago-17	set-18			TERMINATO
SG00234	Lavori di risanamento condotte fognarie in vicolo Filanda da piazza Carlo Mauro a via Circonvallazione Mombrisone	CHIUSA DI PESIO			190.000,00	0,00						ott-18	dic-18			DA APPALTARE

[illegible]

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
P0208	Lavori di sostituzione tubazione idrica Cavalligi a servizio del comune di Caraglio	CARAGLIO														TERMINATO 2016
P0197	Lavori di potenziamento e sostituzione reti idriche nel concentrico e nelle frazioni	ROBURENT														TERMINATO 2016
P0204	Lavori di potenziamento e sostituzione reti idriche nel concentrico e nelle frazioni	LIMONE PIEMONTE														TERMINATO 2016
P0206	Lavori di sostituzione condotte in fibrocemento in via San Maurizio	VIGNOLO														TERMINATO 2016
P0218	Lavori di sostituzione e potenziamento rete idrica in via Valle Po	CUNEO														TERMINATO 2016
P0220	Lavori di potenziamento e sostituzione reti idriche in frazione Spinetta	CUNEO														TERMINATO 2016
P0222	Lavori di sostituzione rete idrica in via Nosalini	CEVA														TERMINATO 2016
P0221	Lavori di risanamento dell'impianto di depurazione in frazione Miroglio	FRABOSA SOTTANA														TERMINATO 2016
P0225	Lavori di risanamento condotta fognaria in via Umberto I	VERNANTE														TERMINATO 2016
P0169	Lavori di manutenzione straordinaria reti idriche	ENVIE														TERMINATO 2016
P0178	Lavori di risistemazione acquedotto in frazione Villaro	ORMEA														TERMINATO 2016
P0165	Sistemazione impianto di depurazione in frazione Terme	VALDIERI														TERMINATO 2016
P0100	Costruzione impianto di filtrazione	MONTALDO DI MONDOVI'	305.564,60	0,00								mag-16	nov-17			TERMINATO
P0121	Ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di depurazione	PAESANA	1.203.721,40	0,00								giu-16	dic-17			TERMINATO
P0155	Ottimizzazione dell'impianto di depurazione	CARAGLIO	352.317,28	0,00								ago-16	nov-17			TERMINATO
P0199	Risanamento serbatoio pensile	MAGLIANO ALPI	155.341,36	0,00								gen-17	dic-17			TERMINATO
P0201	Ristrutturazione serbatoio pensile	ROCCA DE' BALDI	160.126,95	0,00								set-16	nov-17			TERMINATO
P0227	Rifacimento reti di acquedotto, fognatura e acque bianche in via Maestra frazione Chianale	PONTECHIANALE	76.868,08	0,00								set-16	giu-17			TERMINATO
SC00211	Lavori di sostituzione reti idriche nel concentrico	CHIUSA DI PESIO	73.849,67	0,00								mag-16	ago-17			TERMINATO
SC00212	Lavori di sistemazione strutturale vasca serbatoio Roccarina	CHIUSA DI PESIO	66.708,44	0,00								nov-16	ott-17			TERMINATO
SC00213	Lavori di sostituzione reti idriche nelle frazioni in Via F.lli Silvestro, Via Volontari del Sangue, Via degli Agostiniani, Via delle Isole	CUNEO	267.887,20	0,00								dic-16	ago-17			TERMINATO
SC00239	Sostituzione tubazione vetusta piazza Carleveri	ROCCA DE' BALDI	76.549,12	0,00								mag-17	nov-17			TERMINATO
SC00220	Lavori di sostituzione rete idrica in via San Luigi frazione Pianvignale	FRABOSA SOTTANA	58.122,86	0,00								lug-17	nov-17			TERMINATO
SC00221	Lavori di sostituzione rete acquedotto e fognatura	BELLINO	25.149,48	0,00								giu-16	gen-17			TERMINATO
SC00222	Lavori di sostituzione e potenziamento reti idriche in via Cattini	PAMPARATO	218.333,55	0,00								ago-17	dic-17			TERMINATO
SC00225	Sostituzione tratto condotta acquedotto comunale in via Centallo frazione Monastero	DRONERO	55.301,57	0,00								giu-17	nov-17			TERMINATO
SC00241	Lavori di estensione e potenziamento rete idrica in via Valle Po 2° lotto	CUNEO	92.723,29	0,00								mag-17	set-17			TERMINATO
SC00232	Lavori di sostituzione condotta idrica in via della Madonna fraz. Castelletto	ROCCASPARVERA	32.837,65	0,00								mag-17	giu-17			TERMINATO
SC00236	Lavori di sostituzione condotta idrica in frazione San Vitale	BUSCA	87.236,42	0,00								apr-17	set-17			TERMINATO

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazioni e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
SC00242	Lavori di sostituzione e potenziamnto rete idrica in via Matteotti e via Fontana	CARAGLIO - BORGO SAN DALMAZZO	72.957,09	0,00								mag-17	ott-17			TERMINATO
SC00246	Lavori di sostituzione tratto di condotta idrica di regione Rivalta	LIMONE PIEMONTE	28.286,87	0,00								set-17	dic-17			TERMINATO
SC00249	Lavori di sostituzione condotta idrica in piazza Statuto	SANFRONT	71.396,56	0,00								giu-17	nov-17			TERMINATO
SC00250	Lavori di sostituzione rete idrica in via Perotta e via Valle Macra	MAGLIANO ALPI	63.454,26	0,00								ago-17	dic-17			TERMINATO
SC00251	Lavori di sostituzione e potenziamento rete idrica in via Fucine e in via Bianchi di Roascio	DRONERO	196.620,40	0,00								lug-17	dic-17			TERMINATO
SC00252	Lavori di potenziamento rete idrica nelle frazione Castelletto e San Chiaffredo 1° lotto	BUSCA	302.361,64	0,00								lug-17	dic-17			TERMINATO
SC00255	Lavori di ripristino in asfalto a seguito di interventi di manutenzione nei comuni gestiti	COMUNI VARI	48.658,78	0,00								giu-17	set-17			TERMINATO
SC00258	Lavori di asfaltatura strade interessate dai lavori di posa nuove condotte idriche	Caraglio,Chiusa Pesio,Demonte, Limone P.te,Pamparato, Sanfront,Vignolo Villar S.C.	89.452,61	0,00								lug-17	ott-17			TERMINATO
SC00270	Lavori di potenziamento rete idrica in via Mario Rosso	BEINETTE	38.784,08	0,00								ago-17	nov-17			TERMINATO
SC00277	Lavori di sostituzione condotta idrica in via Albaretta	GARESSIO	30.104,99	0,00								ott-17	nov-17			TERMINATO
SC00282	Lavori di ripristino strada di accesso alle sorgenti	ROCCASPARVERA	14.350,80	0,00								ago-17	ago-17			TERMINATO
SC00287	Lavori di fornitura e installazione di un sistema di trattamento arsenico	ORMEA	20.688,20	0,00								nov-17	nov-17			TERMINATO
SC00290	Lavori di risanamento esterno del serbatoio Roccarina	CHIUSA DI PESIO	9.783,08	0,00								set-17	set-17			TERMINATO
SG00172	Modifica condotta fognaria fr. Santa Croce via Circonvallazione ed estensione in Santa Croce di Vignolo	CERVASCA	36.485,04	0,00								set-17	nov-17			TERMINATO
SG00178	Lavori di risanamento condotta fognaria in cemento-aminato ubicata all'interno di abitazione privata	MOROZZO	2.370,00	0,00								ago-17	ago-17			TERMINATO
SG00188	Lavori di modifica condotta fognaria a seguito ripristino impluvio Rio Passet	VALLORiate	11.684,02	0,00								apr-17	mag-17			TERMINATO
SG00189	Lavori di impermeabilizzazione sedimentatore	ENVIE	113.544,27	0,00								giu-17	dic-17			TERMINATO
SG00192	Lavori di rifacimento tratto di fognatura confluyente in via Lepetit	GARESSIO	16.780,19	0,00								dic-17	apr-17			TERMINATO
SG00201	Risanamento tratto di condotta fognaria in via Alba	CUNEO	201.666,53	0,00								dic-16	set-17			TERMINATO
SG00202	Lavori di risanamento condotta fognaria in corso Trieste del Comune di Boves e Località Piano - Santa Margherita del Comune di Bagnasco	BAGNASCO - BOVES	160.820,79	0,00								nov-16	mar-17			TERMINATO
SG00206	Lavori di rifacimento condotta fognaria a servizio della loc. Villa	PAMPARATO	82.000,51	0,00								lug-17	ago-17			TERMINATO
SG00208	Lavori di risanamento condotte fognarie in via Fossano – Roero, via Teatro Toselli e tratto di via Dronero	CUNEO	262.956,43	0,00								dic-16	ott-17			TERMINATO
SG00209	Lavori di risanamento condotte fognarie in via Saluzzo e in via Dronero	CUNEO	260.483,85	0,00								dic-16	set-17			TERMINATO
SG00211	Lavori di risanamento condotte fognarie in via Busca e via F.lli Vaschetto	CUNEO	332.186,47	0,00								gen-17	dic-17			TERMINATO
SG00212	Lavori di risanamento condotte fognarie in via Santa Croce e via Vignolo	CUNEO	326.402,27	0,00								feb-17	mag-17			TERMINATO

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazion e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
SG00213	Lavori di risanamento condotte fognarie in via S.Maria, via Sette Assesi e via Leutrum	CUNEO	320.296,14	0,00								feb-17	lug-17			TERMINATO
SG00214	Lavori di manutenzione membrane Aquastrip impianto di depurazione di Centallo reg. Madonna dei Prati	CENTALLO	90.786,71	0,00								mar-17	mag-17			TERMINATO
SG00220	Lavori di risanamento delle condotte fognarie in via Genova e lungo torrente Vermenagna	LIMONE PIEMONTE	246.612,30	0,00								set-17	dic-17			TERMINATO
SG00224	Lavori di estensione rete fognaria in fraz. San Bartolomeo	CHIUSA DI PESIO	28.704,66	0,00								lug-17	ago-17			TERMINATO
SG00233	Installazione sistema OxySmart per automazione processo biologico	CEVA	11.085,30	0,00								feb-17	apr-17			TERMINATO
SG00238	Messa a dimora specie arboree AREA DEPURATORE	CUNEO	5.185,73	0,00								mag-17	mag-17			TERMINATO
SG00241	Lavori di realizzazione condotta di troppo pieno sulla tubazione fognaria di Via Piave	GAIOLA	13.926,25	0,00								lug-17	set-17			TERMINATO
SG00248	Sostituzione di tubazione ovoidale collassata in c.so Kennedy	CUNEO	39.912,03	0,00								apr-17	apr-17			TERMINATO
SG00256	Lavori di risanamento condotta fognaria in viale Kennedy	CUNEO	322.475,39	0,00								set-17	dic-17			TERMINATO
SG00257	Lavori di sostituzione chiusini fognatura e acquedotto in via Martiri della Libertà	DEMONTE	38.564,34	0,00								giu-17	giu-17			TERMINATO
SG00266	Lavori di risanamento tratto di condotta fognaria di Via Garibaldi	LIMONE PIEMONTE	24.923,75	0,00								set-17	ott-17			TERMINATO
SG00271	Realizzazione trivellazione per posa condotta fognaria	CHIUSA DI PESIO	11.025,00	0,00								ago-17	ago-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_2	DAL00022-DAL00037-DAL00078 Sistemazione della strada di accesso e protezione della tubazione in ingresso dell'impianto di depurazione e rifacciemnto condotta in via Tanaro (Alluv.Nov.2016)	BAGNASCO	17.586,34		97.578,67	93.913,66						apr-17	gen-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_5	DAL00057 Regimazione acque superficiali e protezione dell'opera di presa della sorgente Cugnu (Alluv.Nov.2016)	CAPRAUNA			17.228,60	15.000,00						nov-17	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_6	DAL00059 Ripristino condotta idrica presso la sorgente Scagnello (Alluv.Nov.2016)	CEVA			39.386,22	37.100,00						ott-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_7	DAL0009 Ricondizionamkento e realizzazione di uno sarico di emergenza per il pozzo delle Scuole e ripristino accesso al pozzo (Alluv.Nov.2016)	CEVA			44.534,84	37.100,00						nov-16	ott-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_8	DAL00017 - DAL00075 Protezione delle opere di presa dalle infiltrazioni di acque superficiali della sorgente Sparpagliata e rifacciemnto di tratti della condotta di adduzione (Alluv.Nov.2016)	CEVA	5.678,52		49.130,54	42.821,48						apr-17	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_9	DAL00034 Rifacimento tubazioni e stazione di pompaggio e ripristino delle protezioni spondali in località Cameroni (Alluv.Nov.2016)	CEVA					716.695,86	647.500,00				apr-18	giu-19			IN CORSO
CN_ATO_430_16_10	DAL00055Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione (Alluv.Nov.2016)	ENVIE					54.000,00	37.100,00				ott-17	dic-17			DA APPALTARE

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazioni e Prog. Definitiva a EGATO4	Redazione Prog. Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
CN_ATO_430_16_11	DAL00050 Costruzione scogliera a protezione del depuratore (Alluv.Nov.2016)	ENVIE	32.191,28	22.500,00								ott-17	dic-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_12	DAL00042Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione Acquedotto Nari e Barra Sorgenti (Alluv.Nov.2016)	GAMBASCA	11.835,72		26.100,00	25.264,28						ott-17	lug-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_13	DAL00081 Rifacimento della tubazione di attraversamento del Tanaro (Alluv.Nov.2016)	GARESSIO			184.097,83	67.000,00						mag-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_14	DAL00024 - DAL00087 - DAL00060 Rifacimento della condotta di adduzione alla frazione Piangranone e ripristino strada di accesso alla sorgente Persietta (Alluv.Nov.2016)	GARESSIO	37.943,55		7.335,58	6.556,45						mar-17	lug-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_10006	DAL00035 Rifacimento degli attraversamenti fluviali del torrente Mongia (Alluv.Nov.2016)	LESEGNO			74.060,83	62.500,00						dic-17	apr-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_17	DAL00058 Ripristino delle condotte fognarie e protezione area del depuratore in loc. Campazzi (Alluv.Nov.2016)	MOMBASIGLIO			57.149,18	74.200,00						apr-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_18	DAL00049 - DAL00090 Ripristino e protezione delle fosse imhoff e ripristino strade di accesso e condotte in località Molino, Sot la Vacca, Funtass (Alluv.Nov.2016)	MONTALDO DI MONDOVI'	24.203,52		5.950,00	5.496,48						set-17	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_19	DAL00051.1 - DAL00051.2 Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche (Alluv.Nov.2016)	MONTALDO DI MONDOVI'	4.334,30		31.100,00	32.765,70						ott-17	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_20	DAL00029 Protezione degli inghiottitoi presenti nella zona sorgenti Roa' de Volpi (Alluv.Nov.2016)	MONTALDO DI MONDOVI'	5.030,25	5.000,00								ott-17	ott-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_21	DAL00077 Rifacimento condotte e strade di accesso sorgenti Moia e Fontanè (Alluv.Nov.2016)	MONTALDO DI MONDOVI'					89.000,00	110.000,00				apr-19	giu-19			in attesa autorizzazioni
CN_ATO_430_16_22	DAL00026 - DAL00026.1 - DL00088 Ripristino funzionalità sollevamenti fognari e condotta di pompaggio (Alluv.Nov.2016)	NUCETTO					89.000,00	89.000,00				apr-19	set-19			
CN_ATO_430_16_23	DAL00028 - DAL00072.2 - DAL00072 Rifacimento attraversamento del fiume Tanaro della Condotta Reinale (Alluv.Nov.2016)	ORMEA	12.500,00		46.679,13	47.000,00						dic-16	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_24	DAL00061 Rifacimento opera di captazione della sorgente con protezione in frazione Chioraira (Alluv.Nov.2016)	ORMEA			72.132,43	81.600,00						ott-18	dic-18			
CN_ATO_430_16_25	DAL00053 - DAL00053.2 Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche e delle strade di accesso in frazione Molino del Fossato (Alluv.Nov.2016)	ORMEA			56.808,65	52.000,00						lug-18	nov-18			IN CORSO

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazioni e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
CN_ATO_430_16_26	DAL00062 - DAL00020 Ripristino attraversamento del Tanaro della condotta di Nasagò, delle opere acquedottistiche e loro protezioni nelle frazione Prale Soprani, Licati e Bavi (Alluv.Nov.2016)	ORMEA					101.000,00	101.000,00				mar-18	giu-19			PROGETTO IN CORSO
CN_ATO_430_16_27	DAL00013 - DAL00030 Rifacimento attraversamento Rio Armella (Alluv.Nov.2016)	ORMEA			51.493,70	44.500,00						lug-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_28	DAL00063 Rifacimento del punto di emergenza della sorgente Porcirette Sottane e protezione (Alluv.Nov.2016)	ORMEA					44.500,00	44.500,00				apr-19	set-19			DA PROGETTARE
CN_ATO_430_16_29	DAL00040 - DAL00041 - DAL00086 Rifacimento attraversamento in subalveo e dei tratti di tubazione danneggiati presso Isola Perosa (Alluv.Nov.2016)	ORMEA	56.716,74				90.500,00	54.583,26				set-17	ago-19			
CN_ATO_430_16_31	DAL00073 Rifacimento della condotta fognaria tombinata del Rio Armella (Alluv.Nov.2016)	ORMEA			38.190,02	37.100,00						apr-18	nov-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_32	DAL00064 - DAL00064.2 Ripristino delle fosse imhoff e relative tubazioni danneggiate nelle località Cantarana, Isola Lunga, Chionea, Ponti di Nava (Alluv.Nov.2016)	ORMEA			69.637,88	66.800,00						apr-18	nov-17			IN CORSO
CN_ATO_430_16_33	DAL00065 Rifacimento attraversamento fiume Po tra località Calcinere Superiore sorgenti e capoluogo (Alluv.Nov.2016)	PAESANA			62.264,52	74.200,00						lug-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_34	DAL00056 Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione nelle frazioni Acquedotto Agliasco, Pian Munè e Brick del Re (Alluv.Nov.2016)	PAESANA			18.510,00	37.100,00						lug-18	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_36	DAL00066 Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche (Alluv.Nov.2016)	PAMPARATO	61.349,44	37.100,00								ott-17	dic-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_38	DAL00067 - DAL00018 Rifacimento e risanamento della condotta fognaria in loc. Frere (Alluv.Nov.2016)	PAMPARATO			47.312,00	44.500,00						nov-17	mag-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_39	Ripristino delle fosse imhoff in fraz. Casotto (Alluv.Nov.2016)	PAMPARATO					20.000,00	15.000,00				apr-19	ago-19			DA PROGETTARE
CN_ATO_430_16_40	DAL00068 Riparazione e protezione della condotta di adduzione, regimazione delle acque a monte della sorgente Marmorea (Alluv.Nov.2016)	PAMPARATO,ROBUREN T,MONTALDO DI MONDOVI'			15.788,80	11.300,00						mag-18	lug-18			TERMINATO
CN_ATO_430_16_42	DAL00068 Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche delle sorgenti Miradverna e Barna (Alluv.Nov.2016)	PERLO					66.800,00	66.800,00				mag-19	ott-19			DA PROGETTARE

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
CN_ATO_430_16_43	DAL00023 Rifacimento della fossa imhoff in fraz. Perletta e ripristino delle condotte, della recinzione e della strada di accesso (Alluv.Nov.2016)	PERLO	15.291,67	15.000,00								apr-17	mag-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_44	DAL00070 Ripristino del by pass della fossa imhoff comunale a servizio del concentrico (Alluv.Nov.2016)	PRIERO			11.900,00	29.700,00						ott-18	dic-18			
CN_ATO_430_16_45	DAL00071 Rifacimento delle condotte in frazione Canova (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA			26.834,13	33.500,00						lug-18	nov-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_46	DAL00016-DAL00021-DAL00025-DAL00036 Ripristino condotta fognaria in frazione Pianchiosso (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA	69.460,93	59.400,00								dic-16	ago-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_47	DAL00033 Rifacimento delle fognature e realizzazione fosse imhoff nelle frazioni Pianchiosso e Pievetta (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA	267.702,27	237.300,00								ago-18	fine 2018			IN CORSO
CN_ATO_430_16_48	DAL00074 Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA			63.934,73	74.200,00						set-18	ago-18			DA CONTABILIZZARE
CN_ATO_430_16_49	DAL00027 Rifacimento tubazione danneggiata dal ruscellamento rio valle in fraz. Pievetta (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA	12.075,64	9.000,00								mag-17	giu-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_50	DAL00038 - DAL00089 - DAL00019 - DAL00031 - DAL00032 Rifacimento condotte fognarie (Alluv.Nov.2016)	PRIOLA	68.391,25	0,00	99.661,04	0,00	70.000,00	222.500,00				mar-17	ago-19			IN CORSO
CN_ATO_430_16_51	DAL00052 Rifacimento attraversamento rio Roburentello in loc. Garian (Alluv.Nov.2016)	ROBURENT	12.057,51	11.200,00								ago-17	set-17			TERMINATO
CN_ATO_430_16_54	DAL00012 - DAL00043 Ripristino della tubazione di adduzione alla frazione Mombracco di Robella (Alluv.Nov.2016)	SANFRONT	12.180,00		48.385,00	24.920,00						dic-16	dic-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_56	DAL00048 Ripristino delle fosse imhoff in loc.Ponte Corsaglia, loc.Borbera, Bocciofila e San Gottardo (Alluv.Nov.2016)	TORRE MONDOVI'	7.198,05				67.001,95	67.001,95				gen-19	lug-19			DA PROGETTARE
CN_ATO_430_16_10001	DAL00080 Lavori di risanamento condotte fognarie mediante relining a monte dell'impianto di depurazione consortile e risistemazione della stazione di sollevamento ponte Lepetit (attraversamento rio Malsangua e regione La Maddalena) (Alluv.Nov.2016)	ORMEA-GARESSIO					120.345,65	143.611,76				nov-17	mag-18			IN CORSO
CN_ATO_430_16_10002	DAL00044 Lavori di sostituzione tubazione fognarie e realizzazione scogliere a protezione delle condotte in corrispondenza della fraz. Trappa (Alluv.Nov.2016)	ORMEA E GARESSIO			375.747,87	359.029,41						mag-18	dic-18			IN CORSO

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazioni e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
CN_ATO_430_16_10003	DAL00045 Lavori di sostituzione tubazione fognarie e realizzazione scogliere a protezione delle condotte in corrispondenza della fraz. Trappa e loc. Barchi e risistemazione della stazione di sollevamento omonima (Alluv.Nov.2016)	ORMEA-GARESSIO					364.000,00	359.029,41				apr-19	lug-19			
CN_ATO_430_16_10004	DAL00082 Lavori di sostituzione tubazione fognaria e realizzazione scogliere in loc. Viale Piaggio e dismissione della stazione di sollevamento omonima (Alluv.Nov.2016)	ORMEA-GARESSIO			511.791,21	359.029,42						set-18	nov-18			IN CORSO
DAL00039	DAL00039 Lavori di rifacimento fognatura danneggiatura in loc. Ponte di Nava	ORMEA	14.780,00	0,00								mag-17	giu-17			TERMINATO
DAL00019	DAL00019 Interventi di somma urgenza ripristini tratti condotte fognarie Rio San Giusto, Via Losanti, Rio Mursecco	PRIOLA	28.368,42	0,00								mar-17	giu-17			TERMINATO
DAL00031	DAL00031 Lavori di riattivazione condotta fognaria per attivazione stazione di sollevamento SL1 via Valfredi	PRIOLA	19.999,46	0,00								mar-18	mag-18			TERMINATO
DAL00032	DAL00032 Lavori di realizzazione attraversamento fognario del Fiume Tanaro da fraz. Casario	PRIOLA	20.023,37	0,00								feb-18	apr-18			TERMINATO
DAL00076	DAL00076 Lavori di somma urgenza per installazione fossa imhoff e convogliamento scarichi zona cimitero	ORMEA	70.994,05	0,00								apr-17	lug-17			TERMINATO
DAL00046	Riparazione tratto fognario danneggiato in loc.Miridò	OSTANA	6.000,00	0,00								lug-17	ago-17			TERMINATO
DAL00047	Ripristino strada di accesso al serbatoio Truc	OSTANA	4.200,00	0,00								giu-17	giu-17			TERMINATO
DAL00084	Lavori di ripristino collettore fognario Fraz Trappa loc Rio Parone	GARESSIO			495.824,27	0,00						mag-18	set-18			IN CORSO
SC00332_01	Lavori di ripristino strade di accesso alle sorgenti loc. Rocchetta	SANFRONT			9.000,00	0,00						lug-18	dic-18			IN CORSO
SC00332_02	Lavori di ripristino strade di accesso alle sorgenti loc. Sagnas	SANFRONT			9.000,00	0,00						set-18	dic-18			IN CORSO
SC00325	Lavori di ripristino tratto acquedotto comunale Fr.TRappa Loc.Battirava	GARESSIO			36.289,61	0,00						nov-17	dic-18			IN CORSO
SG00308	Lavori di ripristino guado su pista di accesso all'impianto di depurazione	BAGNASCO			6.260,00	0,00						apr-18	apr-18			TERMINATO
1	Nuovo serbatoio Paschero	SAN DAMIANO MACRA			25.000,00	0,00						mar-18	apr-18			TERMINATO
2	Costruzione fognatura Caudano	STROPPO			30.000,00	0,00						mag-18	lug-18			TERMINATO
3	Sistemazione vasche depurazione Einaudi	Castelmagno			25.000,00	0,00						apr-18	mag-18			Progetto con Fondi ATO x scogliere di protezione ma è necessaria verifica
4	Bypass acquedotto per Paschero, Bassura, Rio	CELLE DI MACRA			15.000,00	0,00						mar-18	apr-18			TERMINATO

ACDA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione e Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								

Proposta di variante Settembre 2018	€ 9.502.682,24	€ 523.917,17	€ 10.556.552,19	€ 2.006.196,88	€ 8.222.358,71	€ 1.957.626,38

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 9.166.588,72	€ 127.417,17	€ 10.782.891,90	€ 3.619.191,90	€ 6.614.831,36	€ 537.331,36

	2017		2018		2019		
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	
Proposta di variante Maggio 2018	€ 7.993.081,66	€ 1.166.309,01	€ 7.163.700,00	€ 3.619.191,90			ACDA EX CRVC
	€ 9.159.390,67		€ 10.782.891,90				
Proposta di variante Settembre 2107	€ 10.927.500,00	€ 850.000,00	€ 4.979.986,34	€ 4.337.713,66			
	€ 11.777.500,00		€ 9.317.700,00				
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 6.855.191,00	€ 850.000,00	€ 5.300.000,00	€ 0,00	€ 7.400.000,00	€ 0,00	
	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	
	€ 7.765.191,00		€ 5.380.000,00		€ 7.550.000,00		

ALAC SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
1	manutenzione straordinaria opere calcestruzzo serbatoio di Bric Berico in comune di Murazzano	Bric Berico - Murazzano										ott-15	mag-16	mag-16		CONCLUSO
2	manutenzione straordinaria opere calcestruzzo serbatoi di Mombarcaro e Bric Schiappa in comune di Lequio Berria	Mombarcaro - Lequio Berria					1.100.000,00		nov-18	dic-18		mar-19	ott-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
3	manutenzione straordinaria opere calcestruzzo sorgenti Borello e Mondini	Roburent - Frabosa Soprana					450.000,00		gen-19	mar-19		giu-19	nov-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
4	manutenzione straordinaria opere calcestruzzo sorgenti Tenda e Renetta	Vernante - Limone Piemonte					450.000,00		gen-19	mar-19		giu-19	nov-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
5	ridefinizione attraversamento torrente Vermenagna a Robilante	Robilante					200.000,00		feb-19	apr-19		set-19	dic-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
6	opere accessorie relative alla messa in funzione della sorgente San Macario in Vernante	Vernante	43.949,99										ott-17			CONCLUSO
7	ridefinizioni varie dispensori di protezione catodica	varie	20.982,05		30.000,00		40.000,00						dic-17			CONCLUSO
8	adeguamento tecnologico impianto di pressurizzazione di Bric Berico in Comune di Murazzano	Murazzano	100.000,00		0,00		80.000,00						dic-18			
9	ridefinizione sistema idraulico di adduzione e interconnessione tra sorgenti Borello e Mondini	Roburent	50.000,00										mar-18			CONCLUSO

ALAC SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
10	adeguamento tecnologico impianto di pressurizzazione della sorgente Renetta	Vernante					100.000,00			nov-18		feb-19	mag-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
11	ridefinizione gestione rete distributiva mediante fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione sulle condotte principali adduttrici	varie					350.000,00					mar-19	ott-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
13	ridefinizione sistema di telecontrollo ed acquisizione dati della rete distributiva	varie					250.000,00		gen-19	mar-19		lug-19	nov-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
14	Ridefinizione tratto di collegamento DN 300 mm tra le sorgenti Borello Superiore e Borello Inferiore – realizzazione di difese spondali a protezione della struttura – rifacimento allacciamento idrico – realizzazione di difese spondali di protezione della tubazione adduttrice nei pressi della sorgente Mondini. Alluvione Nov2016	Roburent			550.000,00	385.000,00				set-18		apr-19	ago-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
15	ridefinizione dell'attraversamento aereo del torrente Corsaglia in località Bottera mediante attraversamento in subalveo. Condotta adduttrice DN 450 mm. Ripristino di protezioni spondali della tubazione adduttrice di Valle Corsaglia nel tratto Bossea – Bivio Frabosa Soprana (Geremia) mediante movimentazione di materiale in alveo e formazione di scogliere. Alluvione Nov2016	Frabosa Soprana			450.000,00	315.000,00				set-18		apr-19	ott-19		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
16	ridefinizione attraversamento aereo torrente Corsaglia mediante posa in subalveo di condotta adduttrice DN 450 in località Cartiera di Torre Mondovì. Alluvione Nov2016	Vicoforte					450.000,00		giu-19	set-19		nov-19	gen-20		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	

ALAC SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
17	ridefinizione attraversamento aereo torrente Corsaglia mediante posa in subalveo di condotta adduttrice DN 450. Alluvione Nov2016	San Michele Mondovì					450.000,00		giu-19	set-19		nov-19	gen-20		intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	
12	sostituzione tubazione di allacciamento al comune di Pianfei	Pianfei - Beinette					250.000,00		feb-19	apr-19					intervento posticipato per ritardi conseguenti gestione ordinaria di ALAC	

Proposta di variante Settembre 2018	€ 214.932,04	€ 0,00	€ 1.030.000,00	€ 700.000,00	€ 4.170.000,00	€ 0,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 214.932,04	€ 0,00	€ 1.680.000,00	€ 700.000,00	€ 3.890.000,00	€ 0,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 4.630.000,00	€ 700.000,00		
	€ 220.000,00		€ 5.330.000,00			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 4.630.000,00	€ 700.000,00		
	€ 220.000,00		€ 5.330.000,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 1.320.000,00	€ 0,00	€ 2.580.000,00	€ 0,00	€ 1.740.000,00	€ 0,00
	€ 1.320.000,00		€ 2.580.000,00		€ 1.740.000,00	

ALPI ACQUE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
	2 Sostituzione tubazioni acquedotto	Cavallermaggiore												nov-16		CONCLUSO
	2 Sostituzione tubazioni acquedotto	Cavallermaggiore			50.000,00							giu-18	ott-18	nov-18		IN CORSO
	3 Sostituzione tubazioni fognatura	Cavallermaggiore			50.000,00							nov-18	dic-18	dic-18		ANTICIPATO DAL 2019 AL 2018 (ritubaggio)
	4 Sostituzione tubazioni acquedotto	Cervere			50.000,00							nov-18	dic-18	dic-18		
	5 Sostituzione tubazioni scarico depuratore	Cervere					30.000,00					mar-19	apr-19	mag-19		RINVIATO AL 2019. È stata data priorità ad altri interventi (relining)
	6 Nuovo serbatoio San Magno	Fossano			150.000,00		415.000,00					dic-18	mag-19	giu-19		IN CORSO. Appalto lavori nel mese di ottobre 2018
	7 Gruppo rilancio in rete	Fossano					300.000,00					giu-19	ago-19	set-19		IN FASE DI PROGETTAZIONE, lavori a seguito precedente intervento
	7 Sostituzione tubazioni per pompaggio in rete e sostituzione tubazioni	Fossano					700.000,00					apr-19	ott-19	nov-19		IN CORSO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE. Sono stati raggruppati 3 interventi di Fossano.
	8 Razionalizzazione rete acquedottistica 1° lotto - appalto c impianto elettrico	Fossano												dic-16		CONCLUSO
	9 Sostituzione tubazioni acquedotto	Fossano	74.789,71							feb-17				gen-18		CONCLUSO
	9 Sostituzione tubazioni acquedotto	Fossano			100.000,00							giu-18	dic-18	dic-18		IN CORSO sostituzione tubazioni 2018. La sostituzione tubazioni 2019 è stata raggruppata con altri interventi
	10 Serbatoi Craveri e Loreto	Fossano	94.628,81							mag-17				mar-18		CONCLUSO
	11 Fognatura Cussanio 2/3 intervento relining	Fossano	38.137,64							lug-16				gen-18		CONCLUSO
	11 Fognatura Cussanio 3 intervento relining	Fossano	120.052,06							ott-17				gen-18		CONCLUSO
	11 Fognatura Cussanio intervento relining	Fossano			50.000,00							nov-18	dic-18	dic-18		IN CORSO (sostituzione fognatura via Barotti). 50.000 € sono stati anticipati nel 2017 (intervento di relining Cussanio)
	12 Ampliamento San Sebastiano via Circonvallazione	Fossano	131.097,24							set-16				gen-18		CONCLUSO
	13 Annullamento depuratore Regina Elena (Creusa)	Fossano												ott-16		CONCLUSO
	15 Sostituzione tubazioni acquedotto	Genola	28.304,96							lug-17				gen-18		CONCLUSO
	15 Sostituzione tubazioni acquedotto	Genola					20.000,00					mar-19	apr-19	apr-19		
	16 Sostituzione tubazioni acquedotto	Marene	24.894,81							feb-17				nov-17		CONCLUSO
	16 Sostituzione tubazioni acquedotto	Marene			90.000,00							feb-18	giu-18	giu-18		TERMINATO, DA RENDICONTARE
	17 Ispevitore fanghi	Marene					150.000,00									DA VALUTARE con Comune per acquisizione area
	18 Risanamento fognatura	Monasterolo di Savigliano					50.000,00									RINVIATO AL 2019. È stata data priorità ad altri interventi (relining)
	19 Ristrutturazione serbatoio Biale e impianti	Piozzo												dic-16		CONCLUSO
	20 Sostituzione tubazioni acquedotto	Piozzo					50.000,00									RINVIATO AL 2019
	22 Disidratazione meccanica	Racconigi					200.000,00					lug-19	ott-19	nov-19		
	23 Sistemazione impianto depurazione	Rifreddo	29.759,28							mar-17				dic-17		CONCLUSO
	24 Depuratore	Ruffia												dic-16		CONCLUSO
	25 Collegamento con ALAC da Loreto	Salmour	5.015,60							nov-16				gen-18		CONCLUSO
	26 Sostituzione tubazioni acquedotto	Saluzzo	83.045,74							giu-17				feb-18		CONCLUSO
	26 Sostituzione tubazioni acquedotto	Saluzzo	47.784,52							gen-17				nov-17		CONCLUSO
	26 Sostituzione tubazioni acquedotto	Saluzzo	49.901,99							mag-17				gen-18		CONCLUSO
	26 Sostituzione tubazioni acquedotto	Saluzzo			100.000,00		600.000,00	228.000,00				ott-18	dic-18	dic-18		IN CORSO INTERVENTO 2018. L'intervento 2019 è in progetto. Il valore indicato è relativo alla quota dell'intervento da 1.000.000,00 €, ripartito tra 2019 e 2020
	27 Ristrutturazione serbatoi e impianti	Saluzzo	10.508,79							apr-17				dic-17		CONCLUSO

ALPI ACQUE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
27	Ristrutturazione serbatoi e impianti	Saluzzo	9.611,23							apr-17				nov-17		CONCLUSO
28	Ricondizionamento pozzo Saretta	Saluzzo														Pozzo unico, da valutare tipo di intervento
29	Distrettualizzazione	Saluzzo												dic-16		CONCLUSO
31	Collegamento depuratori	Sant'Albano Stura					150.000,00					set-19	dic-19	dic-19		
32	Sostituzione tubazioni acquedotto	Savigliano	80.819,62							feb-17				gen-18		CONCLUSO
32	Sostituzione tubazioni acquedotto	Savigliano	10.699,17		189.300,00		150.000,00			ago-17		ott-18	gen-19	feb-19		INTERVENTO 2017 (IMPORTO 89.300 €) TERMINATO, DA RENDICONTARE. INTERVENTO 2018 (IMPORTO 100.000 €) IN CORSO
33	Ristrutturazione serbatoio e impianti Tetti Chiamba	Savigliano					50.000,00					set-19	ott-19	nov-19		
34	Ricondizionamento pozzo esistente - Studi e nuovo pozzo	Savigliano					150.000,00					ott-19	nov-19	dic-19		
35	Trivellazione nuovo pozzo Tetti Chiamba	Savigliano			150.000,00					feb-18		apr-18	mar-19	apr-19		IN CORSO (problema analisi stagionali)
37	Adeguamento PAI	Savigliano												giu-16		CONCLUSO
38	Revamping impianto Levaldigi	Savigliano	49.009,13							dic-16				gen-18		CONCLUSO
39	Trivellazione nuovo pozzo	Scarnafigi					150.000,00									
40	Ristrutturazione serbatoio pensile e impianti	Scarnafigi			50.000,00							set-18	nov-18	nov-18		IN CORSO
41	Adeguamento depuratore	Torre San Giorgio	19.862,86							lug-17				gen-18		CONCLUSO
43	Sostituzione tubazioni fognatura	Trinita'					50.000,00									RINVIATO AL 2019. È stata data priorità ad altri interventi (relining)
44	Ricondizionamento pozzo P1	Verzuolo												giu-16		CONCLUSO
45	Sostituzione tubazioni acquedotto	Verzuolo	39.990,70							apr-17				gen-18		CONCLUSO
45	Sostituzione tubazioni acquedotto	Verzuolo	74.722,99							giu-17				feb-18		CONCLUSO
45	Sostituzione tubazioni acquedotto	Verzuolo			100.000,00		100.000,00					mag-18	nov-18	dic-18		IN CORSO INTERVENTO 2018
46	Sostituzione tubazioni fognatura	Verzuolo					50.000,00									RINVIATO AL 2019. È stata data priorità ad altri interventi (relining)
47	Sostituzione tubazioni acquedotto	Villafalletto	6.057,18		63.900,00					ago-17				apr-18		TERMINATO, da rendicontare
48	Revamping impianto depurazione	Villafalletto			50.000,00							set-18	nov-18	dic-18		IN CORSO
49	Sistemazione impianto depurazione	Villanova Solaro			30.000,00							set-18	nov-18	dic-18		IN CORSO
50	Ricondizionamento pozzo	Vottignasco														DA DEFINIRE tipo di intervento (pozzo unico)
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque	14.240,53							apr-17				gen-18		CONCLUSO
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque	12.561,78							mag-17				nov-17		CONCLUSO
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque	11.850,32							mag-17				nov-17		CONCLUSO
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque	6.847,77							giu-17				nov-17		CONCLUSO
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque	10.744,82							set-17				gen-18		CONCLUSO
51	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - captazione	Bacino Alpi Acque			115.000,00		50.000,00									IN CORSO più interventi, terminano entro dicembre 2018
52	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - potabilizzazione	Bacino Alpi Acque	19.600,53							gen-17				nov-17		CONCLUSO
52	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - potabilizzazione	Bacino Alpi Acque	14.118,63							feb-17				nov-17		CONCLUSO
52	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - potabilizzazione	Bacino Alpi Acque	37.142,15							mag-17				gen-18		CONCLUSO
52	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - potabilizzazione	Bacino Alpi Acque	8.412,20							ott-17				gen-18		CONCLUSO

ALPI ACQUE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
52	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - potabilizzazione	Bacino Alpi Acque	17.607,65		15.000,00		30.000,00					nov-17	feb-18	feb-18		TERMINATI GLI INTERVENTI 2017 E 2018, da rendicontare
53	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - distribuzione	Bacino Alpi Acque												nov-16		CONCLUSO
53	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - distribuzione	Bacino Alpi Acque	5.891,67							feb-17				nov-17		CONCLUSO
53	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - distribuzione	Bacino Alpi Acque	7.405,62							set-17				dic-17		CONCLUSO
53	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - distribuzione	Bacino Alpi Acque	23.936,40							set-17				gen-18		CONCLUSO
53	Manutenzioni su reti ed impianti acquedotto - distribuzione	Bacino Alpi Acque	3.553,95		90.000,00		100.000,00									IN CORSO più interventi, terminano entro dicembre 2018
53	Sistemazione serbatoi Villafalletto e Fossano Loreto	Villafalletto e Fossano			40.000,00							mar-18	ott-18	nov-18		IN CORSO
53	Recupero efficienza reti acquedotto	Comuni vari			40.000,00		50.000,00					apr-18	nov-18	nov-18		IN CORSO
53	Tappeti d'usura su sostituzione tubazioni	Comuni vari			100.000,00							lug-18	nov-18	nov-18		IN CORSO
54	Manutenzioni su reti ed impianti fognatura	Bacino Alpi Acque	4.644,43							lug-17				nov-17		CONCLUSO
54	Manutenzioni su reti ed impianti fognatura	Bacino Alpi Acque	4.976,08							ott-17				gen-18		CONCLUSO
54	Manutenzioni su reti ed impianti fognatura	Bacino Alpi Acque			50.000,00		50.000,00					feb-18	dic-18	dic-18		IN CORSO
54	Riduzione acque parassite	Cavallermaggiore e Savigliano			30.000,00							feb-18	apr-18	mag-18		TERMINATO, da rendicontare
55	Manutenzioni su impianti depurazione	Bacino Alpi Acque	25.912,37							feb-17				gen-18		CONCLUSO
55	Manutenzioni su impianti depurazione	Bacino Alpi Acque	6.941,14							mar-17				nov-17		CONCLUSO
55	Manutenzione straordinaria Impianti Depurazione	Bacino Alpi Acque			85.000,00		75.000,00					gen-18	dic-18	dic-18		ALCUNI INTERVENTI IN CORSO, ALTRI TERMINATI DA RENDICONTARE
55	Adeguamento impianto di Fossano - Sostituzione griglia e rinnovo linea fanghi	Fossano	10.725,58		39.300,00							lug-18	ott-18	ott-18		IN CORSO, ANTICIPATO INTERVENTO 2019
55	Pre-ispessimento fanghi ID Stura	Fossano			50.000,00							nov-17	nov-18	nov-18		IN CORSO
56	Sostituzione e implementazione del parco contatori	Bacino Alpi Acque			20.000,00		50.000,00					feb-18	dic-18	dic-18		IN CORSO
57	Software/Hardware/attrezzature e rilievi analitici	Bacino Alpi Acque														REALIZZATO, MA NON COME INVESTIMENTO
58	Manutenzione straordinaria Telecontrollo	Bacino Alpi Acque			30.000,00		10.000,00					nov-16	dic-18	dic-18		IN CORSO
59	Aree di salvaguardia	Bacino Alpi Acque	24.319,32		5.410,00		10.000,00					nov-15				IN CORSO intervento sulle sorgenti di Saluzzo. In attesa del parere della Provincia
61	Intervento somma urgenza alluvione A	Rifreddo	57.206,07							apr-17				dic-17		CONCLUSO
62	Intervento somma urgenza alluvione ID	Cardè	17.497,60	16.400,00						dic-16				ago-17		CONCLUSO
63	Intervento somma urgenza alluvione ID	Rifreddo	19.925,15	15.000,00						dic-16				ago-17		CONCLUSO
68	Nuovo approvvigionamento	Fossano (rurale)			10.000,00		190.000,00									STUDIO IN CORSO
74	Sostituzione tubazioni acquedotto	Monasterolo di Savigliano			70.000,00											
78	Sostituzione tubazioni acquedotto	Salmour					30.000,00									
89	Realizzazione nuovi tratti fognatura e revamping depuratore	Fossano					150.000,00									
91	Sostituzione tubazioni fognatura	Racconigi			80.000,00							set-18	dic-18	dic-18		IN CORSO
92	Sostituzione tubazioni fognatura	Savigliano			100.000,00							ott-18	nov-18	dic-18		ANTICIPATO DAL 2019 AL 2018 (ritubaggio)
97	Ripristino funzionale fognatura	Fossano					200.000,00									

Proposta di variante Settembre 2018	€ 1.394.755,79	€ 31.400,00	€ 2.242.910,00	€ 0,00	€ 4.360.000,00	€ 228.000,00
-------------------------------------	----------------	-------------	----------------	--------	----------------	--------------

ALPI ACQUE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
Proposta di variante Settembre 2018																
Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018			€ 1.394.755,79	€ 31.400,00	€ 3.066.766,47	€ 0,00	€ 2.841.688,09	€ 228.000,00								

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 1.715.479,76	€ 88.606,07	€ 2.285.000,00	€ 0,00		
	€ 1.804.085,83		€ 2.285.000,00			
Proposta di variante Settembre 2017	€ 2.020.000,00	€ 105.600,00	€ 2.105.000,00	€ 0,00		
	€ 2.125.600,00		€ 2.105.000,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 1.920.000,00	€ 0,00	€ 2.125.000,00	€ 0,00	€ 1.875.000,00	€ 0,00
	€ 1.920.000,00		€ 2.125.000,00		€ 1.875.000,00	

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fica to	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
1	ALBARETTO DELLA TORRE-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Cappella/Borine	ALBARETO DELLA TORRE-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Cappella/Borine													lavoro previsto oltre il 2019	
2	ALBARETTO DELLA TORRE-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	ALBARETO DELLA TORRE-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
3	ARGUELLO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	ARGUELLO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
4	BONVICINO-CN-EGATO/4-Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete	BONVICINO-CN-EGATO/4-Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete					15.000,00								Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete 15000	
5	BORGOMALE-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Montemarino	BORGOMALE-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Montemarino													lavoro previsto oltre il 2019	
6	BORGOMALE-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione a servizio della Località Priosa	BORGOMALE-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione a servizio della Località Priosa	30.559,24									apr-17	mag-17	mag-17		CONCLUSO
7	BOSIA-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Mulino (in corso di progettazione)	BOSIA-CN-EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto loc. Mulino (in corso di progettazione)					12.000,00								Sostituzione rete acquedotto loc. Mulino (in corso di progettazione)12000	
8	BOSIA-CN-EGATO/4-Realizzazione collegamento con rete ALAC	BOSIA-CN-EGATO/4-Realizzazione collegamento con rete ALAC													lavoro previsto oltre il 2019	
9	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Potenziamento rete adduzione da Campo pozzi a serbatoio Bicocca	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Potenziamento rete adduzione da Campo pozzi a serbatoio Bicocca					70.000,00								Potenziamento rete adduzione da Campo pozzi a serbatoio Bicocca70000	
10	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici					10.000,00								intervento posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	
11	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete			40.000,00		40.000,00					ott-18	dic-18			
12	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione					10.000,00								intervento posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	
13	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Realizzazione nuova rete fognaria loc. Grimalda	BOSSOLASCO-CN-EGATO/4-Realizzazione nuova rete fognaria loc. Grimalda	51.809,98									apr-17	mag-17	ago-17		CONCLUSO

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
14	CAMERANA-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete	CAMERANA-CN- EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete													lavoro previsto oltre il 2019	
15	CAMERANA-CN-EGATO/4-Realizzazione sistema di telecontrollo	CAMERANA-CN- EGATO/4-Realizzazione sistema di telecontrollo													lavoro previsto oltre il 2019	
16	CAMERANA-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	CAMERANA-CN- EGATO/4-Interventi su impianti depurazione													anticipato nel 2017 nell'ambito dei lavori post-alluvione	CONCLUSO
17	CASTINO-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida– Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Castino - LOTTO 1 TOTALMENTE FINANZIATO	CASTINO-CN-EGATO/4- Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida– Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Castino - LOTTO 1 TOTALMENTE FINANZIATO														CONCLUSO
18	CASTINO-CN-EGATO/4-Sostituzione rete loc. S. Elena	CASTINO-CN-EGATO/4- Sostituzione rete loc. S. Elena					60.000,00								intervento posticipato nel 2019 a seguito degli eventi alluvionali	
19	CASTINO-CN-EGATO/4-Lavori di sostituzione della condotta dell'acquedotto da Piazza Mercato al Cimitero	CASTINO-CN-EGATO/4- Lavori di sostituzione della condotta dell'acquedotto da Piazza Mercato al Cimitero	31.942,44									giu-17	set-17	ott-17		CONCLUSO
20	CERRETTO LANGHE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti elettrici	CERRETTO LANGHE-CN- EGATO/4-Interventi su impianti elettrici													Inizialmente previsto nel 2018 l'Intervento viene posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	
21	CERRETTO LANGHE-CN-EGATO/4- Sostituzione rete acquedotto strada Merlo	CERRETTO LANGHE-CN- EGATO/4-Sostituzione rete acquedotto strada Merlo					21.000,00									
22	CERRETTO LANGHE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti depurazione	CERRETTO LANGHE-CN- EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
23	CORTEMILIA-CN-EGATO/4- Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete	CORTEMILIA-CN- EGATO/4-Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete					40.000,00								gestito come manutenzione straordinaria	
24	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici	CORTEMILIA-CN- EGATO/4-Interventi su impianti elettrici					15.000,00								intervento posticipato nel 2019 a seguito degli eventi alluvionali	

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
25	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi su sistema telecontrollo/telegestione	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi su sistema telecontrollo/telegestione													lavoro previsto oltre il 2019	
27	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi su dep. San Po	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi su dep. San Po			3.583,22							giu-18	lug-18		gestito come manutenzione straordinaria	CONCLUSO
28	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Bonifica e recupero ambientale ed economico della Valle Bormida (accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte, importo 84000 euro)	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Bonifica e recupero ambientale ed economico della Valle Bormida (accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte, importo 84000 euro)														CONCLUSO
29	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-nterventi su impianti elettrici depurazione	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-nterventi su impianti elettrici depurazione					20.000,00									
30	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Cortemilia -TOTALMENTE FINANZIATO	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Cortemilia - TOTALMENTE FINANZIATO													CHIUSO ANNO 2015	CONCLUSO
31	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici					15.000,00									
32	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete					50.000,00									
33	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete	CRAVANZANA-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete					50.000,00								intervento posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	

[illegible]

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
39	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Niella Belbo - Lotto 2 - TOTALMENTE FINANZIATO	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Niella Belbo - Lotto 2 - TOTALMENTE FINANZIATO														CONCLUSO
40	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Niella Belbo - Lotto 3 -TOTALMENTE FINANZIATO	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Lavori relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo Idrico integrato nel Comune di Niella Belbo - Lotto 3 -TOTALMENTE FINANZIATO													CHIUSO ANNO 2014	CONCLUSO
41	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi elettromeccanici su impianto di rilancio	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi elettromeccanici su impianto di rilancio					20.000,00								NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi elettromeccanici su impianto di rilancio20000	
42	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Recupero sistema di captazione sorgente	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Recupero sistema di captazione sorgente					15.000,00								NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Recupero sistema di captazione sorgente15000	
43	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti elettrici			15.000,00							ott-18	dic-18			
44	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	NIELLA BELBO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
45	PERLETTO-CN-EGATO/4-Interventi su sistema telecontrollo/telegestione	PERLETTO-CN-EGATO/4-Interventi su sistema telecontrollo/telegestione													lavoro previsto oltre il 2019	CONCLUSO

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fici cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
46	PERLETTO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	PERLETTO-CN-EGATO/4- Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
47	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti elettrici	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti elettrici													lavoro previsto oltre il 2019	CONCLUSO
48	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su sistema telecontrollo/telegestione	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su sistema telecontrollo/telegestione	34.726,66									ott-17	ott-17			CONCLUSO
49	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti depurazione	PEZZOLO VALLE UZZONE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
50	PRUNETTO-CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione	PRUNETTO-CN- EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
51	SALICETO-CN-EGATO/4Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete acquedotto	SALICETO-CN- EGATO/4Rinnovamento, ottimizzazione e potenziamento reti obsolete acquedotto					15.000,00					gen-19	mar-19		intervento posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	
52	SALICETO-CN-EGATO/4-Interventi su impianto Rio Navà	SALICETO-CN-EGATO/4- Interventi su impianto Rio Navà			7.294,47							apr-18	set-18		Gestito come manutenzione straordinaria	CONCLUSO
53	SALICETO-CN-EGATO/4-Rinnovamento reti obsolete fognatura	SALICETO-CN-EGATO/4- Rinnovamento reti obsolete fognatura													lavoro previsto oltre il 2019	CONCLUSO
54	SAN BENEDETTO BELBO-CN-EGATO/4- sostituzione rete acquedotto loc. Monastero Loc. Cà di Lù e Monastero	SAN BENEDETTO BELBO-CN-EGATO/4- sostituzione rete acquedotto loc. Monastero Loc. Cà di Lù e Monastero					22.000,00					gen-19	mar-19		intervento posticipato nel 2019 intervenute esigenza di servizio	
55	SAN BENEDETTO BELBO-CN-EGATO/4- Interventi su impianti elettrici	SAN BENEDETTO BELBO-CN-EGATO/4- Interventi su impianti elettrici					15.000,00								Interventi su impianti elettrici15000	
56	SERRAVALLE LANGHE-CN-EGATO/4- Sostituzione rete acquedotto loc. Carretti	SERRAVALLE LANGHE- CN-EGATO/4- Sostituzione rete acquedotto loc. Carretti					33.000,00								Sostituzione rete acquedotto loc. Carretti 33000	

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fici cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
57	SERRAVALLE LANGHE-CN-EGATO/4- Interventi su impianti depurazione	SERRAVALLE LANGHE- CN-EGATO/4-Interventi su impianti depurazione			10.000,00							ott-18	dic-18			
58	SOMANO-CN-EGATO/4-Lavori di realizzazione interventi relativi al servizio idrico integrato con sostituzione tratti di condotte acquedotto in comune di Somano in Via Madonna e in Loc. San Antonio	SOMANO-CN-EGATO/4- Lavori di realizzazione interventi relativi al servizio idrico integrato con sostituzione tratti di condotte acquedotto in comune di Somano in Via Madonna e in Loc. San Antonio			36.500,00							ott-18	dic-18			
59	SOMANO-CN-EGATO/4Interventi su impianti depurazione	SOMANO-CN- EGATO/4Interventi su impianti depurazione					10.000,00									
60	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4- Lavori di rifacimento ed estensione reti di adduzione nei comuni di Castino, Cortemilia, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone e Saliceto €. - TOTALMENTE FINANZIATO	OPERE INTERCOMUNALI-CN- EGATO/4-Lavori di rifacimento ed estensione reti di adduzione nei comuni di Castino, Cortemilia, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone e Saliceto €. - TOTALMENTE FINANZIATO														CONCLUSO
61	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4- Sostituzione contatori d'utenza	OPERE INTERCOMUNALI-CN- EGATO/4-Sostituzione contatori d'utenza			2.500,00		2.500,00					gen-18	dic-18			75%
62	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4- Rilievo e digitalizzazione reti acquedotto.	OPERE INTERCOMUNALI-CN- EGATO/4-Rilievo e digitalizzazione reti acquedotto.			2.500,00							ott-18	dic-18			
63	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- Interventi su servizio depurazione	OPERE INTERCOMUNALI-CN- EGATO/4- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- Interventi su servizio depurazione	7.868,43		30.000,00							gen-18	dic-18			75%

[illegible]

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento piani fici cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
75	Ripristino funzionamento fossa imhoff Camerana Loc. case Prandi	Cortemilia loc. Rivera interventi Post. Alluvione Nov2016	2.500,00													CONCLUSO
76	Ripristino copertura condotta idrica Cortemilia loc. Rivera interventi Post. Alluvione Nov2016	Cortemilia corso Marconi, interventi Post. Alluvione Nov2016	2.500,00													CONCLUSO
77	Ripristino tratto di condotta fognaria Cortemilia corso Marconi, interventi Post. Alluvione Nov2016	Cortemilia loc. San Po interventi Post. Alluvione Nov2016	54.917,17			54.812,76										
78	Ripristino funzionamento impianto di depurazione Cortemilia loc. San Po interventi Post. Alluvione Nov2016	Cortemilia loc. Valle Post. Alluvione Nov2016	6.250,00													CONCLUSO
79	Ripristino tubazione acquedotto Loc. Valle Post. Alluvione Nov2016	Perletto loc. Grassi Nuove interventi Post. Alluvione	14.207,50			14.127,03										
80	Ripristino funzionamento fossa imhoff Perletto Loc. Cascina Abbate Nuove nterventi Post. Alluvione Nov2016	Perletto loc. Grassi Nuove interventi Post. Alluvione	2.500,00													CONCLUSO
81	Ripristino funzionamento fossa imhoff Perletto loc. Grassi Nuove interventi Post. Alluvione	Saliceto loc. Bergalli interventi Post. Alluvione Nov2016	2.500,00													CONCLUSO
82	Ripristino funzionamento impianto di depurazione e fognatura comune di Saliceto loc. Bergalli interventi Post. Alluvione Nov2016	Saliceto loc. Rio Navà interventi Post. Alluvione Nov2016	25.388,87			25.252,18										
83	Ripristino funzionamento impianto di depurazione Saliceto loc. Rio Navà interventi Post. Alluvione Nov2016	Saliceto loc. Rio Navà interventi Post. Alluvione Nov2016	49.980,63			49.885,61										
84	Ripristino funzionamento impianto di depurazione Saliceto loc. Rio Navà interventi Post. Alluvione Nov2016	Saliceto loc. Rio Navà interventi Post. Alluvione Nov2016	6.250,00													CONCLUSO
26	CORTEMILIA-CN-EGATO/4-Interventi di miglioria su impianto di potabilizzazione	CORTEMILIA-CN- EGATO/4-Interventi di miglioria su impianto di potabilizzazione			24.000,00							ago-18	nov-18		Previsti € 20.000,00 , previsione di spese aumentata a 24.000 causa EMERGENZA IDRICA URGENZA : Sistema di filtrazione su sabbia e carboni al servizio dell'impianto di potabilizzazione di Cortemilia. Previsto contributo regionale per € 13.500,00	85%

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
85	EMERGENZA IDRICA URGENZA :Rilancio in linea su adduttrice Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi diretta al serbatoio Bricco del Comune di Cerretto Langhe	Bricco del Comune di Cerretto			12.000,00							giu-18	ott-18			85%
	Lavori di realizzazione di nuova condotta interrata per fognatura mista in Loc. Tre Cunei - Comune di Albaretto Torre														Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 15.787,59 , l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO
	Lavori di sistemazione tubazione interrata da Loc. Fontana Azzurra al serbatoio in Loc. Bossolaschetto - Comune di Bossolasco														Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 70.000 l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO
	Lavori di realizzazione di un nuovo serbatoio - Comune di Feisoglio														Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 70.000 l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO
	Lavori di estensione fognatura nera a servizio delle borgate Pian Bracca e Scarrone - Comune di San Benedetto Belbo														Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 32.200,00 l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO
	Lavori di sostituzione tubazione interrata - Comune di Somo														Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 6.000,00 l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO
	Lavori relativi all'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – Interventi relativi al ciclo idrico integrato nel comune di Cortemilia			103.792,00											Ricevuto contributo per cassa nell'anno 2016 per € 30.461,68 l'intervento non verrà più riportato nelle future ricognizioni	CONCLUSO

Proposta di variante Settembre 2018	€ 432.395,54	€ 103.792,00	€ 441.732,46	€ 221.858,80	€ 777.500,00	€ 0,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 432.395,54	€ 103.792,00	€ 463.000,00	€ 222.737,18	€ 375.000,00	€ 0,00

ALSE SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017		2018		2019									
			Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico								
Proposta di variante Maggio 2018			€ 205.225,68	€ 223.069,45	€ 393.000,00	€ 0,00										
			€ 428.295,13		€ 393.000,00											
Proposta di variante Settembre 2107			€ 476.070,29	€ 241.300,00	€ 376.000,00	€ 0,00										
			€ 717.370,29		€ 376.000,00											
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)			€ 310.100,00	€ 0,00	€ 378.000,00	€ 0,00	€ 369.500,00	€ 84.000,00								
			€ 310.100,00		€ 378.000,00		€ 453.500,00									

CALSO SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
4	Sistemazione impianto di depurazione minore - comune di Carrù (APQ Legge 147/2013)	Carrù - depuratore minore - DEPURAZIONE										set-16	nov-16			CONCLUSO
7	Sosituzione condotta idrica - concentrico - comune di Farigliano	Farigliano - concentrico - ACQUEDOTTO							mag-16				set-16			CONCLUSO
17	Diminuzione delle portate parassite afferenti all'impianto di depurazione di località Cimitero in comune di Farigliano. Realizzazione di sfioratore su fognatura mista esistente e collettamento dello sfiorato in corpo idrico superficiale.	Farigliano - via Torino - FOGNATURA							mag-16			set-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
21	Studi e ricerche	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-16			CONCLUSO
28	Sosituzione contatori per adeguamento alla normativa	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-16			CONCLUSO
33	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-16			CONCLUSO
36	Sostituzione impianti di sollevamento - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.														CONCLUSO
37	Sostituzione mezzi	Bacino CALSO S.p.A.														CONCLUSO
41	Manutenzioni straordinarie reti - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-17			CONCLUSO
42	Manutenzioni straordinarie reti - FOGNATURA	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-17			CONCLUSO
43	Manutenzioni straordinarie impianti - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-17			CONCLUSO
44	Sistemazione impianto di depurazione di località Cimitero - comune di Farigliano - DEPURAZIONE (APQ Legge 147/2013)	Farigliano - località Cimitero										gen-16	set-16			CONCLUSO
47	Nuovi software e telecontrollo	Bacino CALSO S.p.A.										gen-16	dic-17			CONCLUSO
66	Intervento su serbatoio opere di captazione comune di Rocca de' Baldi (approvvigionamento comune di Carrù)	Rocca de' Baldi - località Foresta (comune di Carrù)														CONCLUSO
67	Intervento su impianto di denitrificazione comune di Rocca de' Baldi (approvvigionamento comune di Carrù)	Rocca de' Baldi - località Foresta (comune di Carrù)														CONCLUSO
68	Aggiornamento software	Sede CALSO S.p.A:														CONCLUSO
69	Nuova attrezzatura	Sede CALSO S.p.A:														CONCLUSO
10	Sistemazione impianto di depurazione di località Mellea Sottana e località Cimitero (III lotto) - comune di Farigliano	Farigliano - località Mellea Sottana e località Cimitero	50.000,00	25.000,00					set-16			mag-17	ott-17			CONCLUSO
29	Sosituzione contatori per adeguamento alla normativa	Bacino CALSO S.p.A.	2.339,50	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
29	Installazione misuratori di portata elettronico - comune di Farigliano - impianto di depurazione	Farigliano - località Cimitero - impianto di depurazione	7.028,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
34	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.	9.286,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
37	Sostituzione mezzi	Bacino CALSO S.p.A.	52.000,00	0,00												CONCLUSO
41	Manutenzioni straordinarie reti - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.	128.195,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
42	Manutenzioni straordinarie reti - FOGNATURA	Bacino CALSO S.p.A.	46.600,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
43	Manutenzioni straordinarie impianti - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.	15.500,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
47	Nuovi software e telecontrollo	Bacino CALSO S.p.A.	13.654,20	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO

CALS SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
48	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 ACQUEDOTTO - comune di Bastia Mondovi - capoluogo	Bastia Mondovi - località Stazione FS	20.000,00	16.000,00								lug-17	set-17			CONCLUSO
49	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Bonde	Bastia Mondovi - località Bonde	8.000,00	6.000,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
50	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Capoluogo	Bastia Mondovi - località Capoluogo	49.999,00	37.100,00								lug-17	set-17			CONCLUSO
51	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Fossato Rosso	Bastia Mondovi - località Fossato Rosso	16.000,00	12.000,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
52	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Pieve Villero	Bastia Mondovi - località Pieve Villero	30.000,00	22.300,00								giu-17	ago-17			CONCLUSO
53	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Isola Soprana	Bastia Mondovi - località Isola Soprana	15.000,00	11.200,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
54	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Isola Sottana	Bastia Mondovi - località Isola Sottana	25.000,00	18.600,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
55	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Bastia Mondovi - località Stazione FS	Bastia Mondovi - località Stazione FS	22.000,00	18.600,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
56	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Castellino Tanaro - località Beguda	Castellino Tanaro - località Beguda	10.000,00	7.500,00								giu-17	lug-17			CONCLUSO
57	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Clavesana - località Generala	Clavesana - località Generala	0,00	17.820,00	80.000,00	41.580,00						ago-17	gen-18			CONCLUSO
58	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Clavesana - località Gerino	Clavesana - località Gerino	25.000,00	18.600,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
59	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Clavesana - località Tetti	Clavesana - località Tetti	15.000,00	11.200,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
60	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 FOGNATURA - comune di Dogliani - attraversamento torrente Rea	Dogliani - attraversamento Torrente Rea	18.000,00	13.500,00								giu-17	ago-17			CONCLUSO
61	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Farigliano - località Naviante Corsini	Farigliano - località Naviante Corsini	20.000,00	15.000,00								giu-17	lug-17			CONCLUSO
62	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Farigliano - località Prella	Farigliano - località Prella	10.000,00	7.500,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
63	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Farigliano - località Rio Lupo	Farigliano - località Rio Lupo	7.000,00	5.200,00								giu-17	ago-17			CONCLUSO
64	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Farigliano - località Viaiano	Farigliano - località Viaiano	10.000,00	7.500,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
65	Ripristino danni alluvionali novembre 2016 DEPURAZIONE - comune di Rocca Ciglié - località Arazza	Rocca Ciglié - località Arazza	8.000,00	6.000,00								giu-17	set-17			CONCLUSO
70	Sostituzione condotta idrica località Bonini Piantorre - comune di Castellino Tanaro	Castellino Tanaro - località Bonini Piantorre	35.000,00	0,00								set-17	dic-17			CONCLUSO
71	Sostituzione condotta idrica località Riviera - comune di Monchiero	Monchiero - località Riviera	35.000,00	0,00								set-17	ott-17			CONCLUSO

CALSO SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
72	Sostituzione condotta idrica località Castelletto - comune di Monforte d'Alba	Monforte d'Alba - località Castelletto	38.000,00	0,00								set-17	ott-17			CONCLUSO
73	Sostituzione condotta idrica località San Sebastiano - comune di Monforte d'Alba	Monforte d'Alba - località San Sebastiano	20.000,00	0,00								set-17	ott-17			CONCLUSO
74	Potenziamento rete di distribuzione acquedotto località Mondoni - comune di Roascio	Roascio - località Mondoni	25.000,00	0,00								set-17	dic-17			CONCLUSO
75	Realizzazione nuovo impianto di trattamento acque reflue domestiche in località Serra Viorno - comune di Castellino Tanaro	Castellino Tanaro - località Serra Viorno	35.000,00	0,00								set-17	dic-17			CONCLUSO
76	Adeguamento impianto di trattamento acque reflue domestiche in località Boglio - comune di Sale San Giovanni	Sale San Giovanni - località Boglio	0,00	0,00	15.000,00	0,00						apr-18	mag-18	mag-18		CONCLUSO
81	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	Bacino CALSO S.p.A.	3.640,00	0,00								gen-17	dic-17			CONCLUSO
40	Adeguamento funzionale impianti di depurazione APQ Legge 147/2013	Farigliano località Cimitero e Niella Tanaro località Cimitero	0,00	0,00	8.402,64	4.201,31						mar-18	giu-18	lug-18		CONCLUSO
45	Sostituzione tratti di acquedotto concentrico e frazioni comune di Carrù	Comune di Carrù			20.000,00	0,00						apr-18	ott-18		in fase di affidamento	
80	Interventi di miglioria dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di località Cimitero (lotto IV) nel comune di Farigliano	Farigliano - località Cimitero			120.000,00	0,00						giu-18	dic-18		in fase di conclusione l'iter di approvazione del progetto	
11	Sostituzione tratti di acquedotto via Torino comune di Dogliani	Dogliani - via Torino			0,00	0,00									intervento importo € 50.000 sostituito da intervento in comune di Dogliani località Valdibà importo € 25.000,00 e in comune di Sale San Giovanni località Rocca di Lepre importo € 25.000,00	
8	Sostituzione tratti di acquedotto località Mellea comune di Farigliano	Farigliano - località Mella			50.000,00	0,00						mag-18	ott-18	ott-18	espletamento appalto (vedi anche voce n. 77)	in esecuzione
14	Rifacimento impianto di depurazione di località Coatira comune di Marsaglia	Marsaglia - località Coatira			50.000,00	0,00						giu-18	set-18	set-18		CONCLUSO
41	Manutenzioni straordinarie reti - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.			114.800,00	0,00						gen-18	dic-18		avanzamento al 14/09/2018 - importo € 114.800	in esecuzione
42	Manutenzioni straordinarie reti - FOGNATURA	Bacino CALSO S.p.A.			50.000,00	0,00						gen-18	dic-18		avanzamento al 14/09/2018 - importo € 12.000	in esecuzione
43	Manutenzioni straordinarie impianti - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.			50.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione
22	Studi e ricerche	Bacino CALSO S.p.A.			20.000,00	0,00						gen-18	dic-18			
23	Individuazione aree di salvaguardia	Bacino CALSO S.p.A.			30.000,00	0,00						gen-18	dic-18			
25	Installazione nuovi impianti automatici di disinfezione	Carrù e Lequio Tanaro			15.000,00	0,00						apr-18	dic-18		avanzamento al 31/08/2018 - importo € 13.443,31	in esecuzione
30	Sosituzione contatori per adeguamento alla normativa	Bacino CALSO S.p.A.			12.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione

CALSO SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
35	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO adduzione	Bacino CALSO S.p.A.			6.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione
35	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO distribuzione	Bacino CALSO S.p.A.			2.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione
35	Sostituzione impianti di sollevamento - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.			2.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione
47	Adeguamento ed estensione del sistema di telecontrollo	Bacino CALSO S.p.A.			20.000,00	0,00						gen-18	dic-18		avanzamento al 31/08/2018 - importo € 10.887	in esecuzione
78	Installazione nuovi apparecchi di misura per volumi immessi in rete	Bacino CALSO S.p.A.			8.000,00	0,00						gen-18	dic-18			in esecuzione
79	Realizzazione nuovo posto ad uso idropotabile - comune di Castelnuovo di Ceva	Bacino CALSO S.p.A.			150.000,00	0,00						mag-18	dic-18			in esecuzione
1	Sostituzione tratti di acquedotto concentrico e frazioni comune di Carrù	Comune di Carrù					20.000,00	0,00								
3	Sosituzione tratto di rete fognaria comune di Carrù	Comune di Carrù					50.000,00	0,00								
5	Sostituzione condotta idrica frazioni - comune di Castellino Tanaro	Castellino Tanaro - frazioni					35.000,00	0,00								
9	Estensione rete fognaria - comune di Farigliano	Farigliano - località Mellea					100.000,00	0,00								
15	Sostituzione tratti di acquedotto - comune di Monchiero	Comune di Monchiero					50.000,00	20.000,00								
16	Sostituzione tratti di acquedotto - comune di Monforte d'Alba	Comune di Monforte d'Alba					50.000,00	0,00								
18	Sostituzione tratti di acquedotto - comune di Niella Tanaro	Comune di Niella Tanaro					50.000,00	20.000,00								
19	Sostituzione tratti di acquedotto - comune di Sale delle Langhe	Comune di Sale delle Langhe					50.000,00	20.000,00								
41	Manutenzioni straordinarie reti - ACQUEDOTTO	Bacino CALSO S.p.A.					100.000,00	0,00								
42	Manutenzioni straordinarie reti - FOGNATURA	Bacino CALSO S.p.A.					80.000,00	0,00								
43	Manutenzioni straordinarie impianti - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.					50.000,00	0,00								
24	Individuazione aree di salvaguardia	Bacino CALSO S.p.A.					10.000,00	0,00								
26	Installazione nuovi impianti automatici di disinfezione	Bacino CALSO S.p.A.					15.000,00	0,00								
27	Interventi di manutenzione vasche e serbatoi	Bacino CALSO S.p.A.					30.000,00	0,00								
31	Sosituzione contatori per adeguamento alla normativa	Bacino CALSO S.p.A.					10.000,00	0,00								
32	Installazione nuovi apparecchi di misura per volumi immessi in rete	Bacino CALSO S.p.A.					10.000,00	0,00								
36	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO adduzione	Bacino CALSO S.p.A.					6.000,00	0,00								
36	Sostituzione impianti di sollevamento - ACQUEDOTTO distribuzione	Bacino CALSO S.p.A.					2.000,00	0,00								
36	Sostituzione impianti di sollevamento - DEPURAZIONE	Bacino CALSO S.p.A.					2.000,00	0,00								
47	Adeguamento ed estensione del sistema di telecontrollo	Bacino CALSO S.p.A.					20.000,00	0,00								
77	Sostituzione tratti di acquedotto località Mellea comune di Farigliano	Farigliano - località Mella			27.000,00	0,00						mag-18	ott-18	ott-18	espletamento appalto (vedi anche voce n. 8)	in esecuzione
82	Sostituzione tratti di acquedotto località Valdibà comune di Dogliani	Dogliani - località Valdibà			25.000,00	0,00						mag-18	lug-18	lug-18	intervento in sostituzione del n. 11	CONCLUSO

CALSO SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)													
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
83	Sostituzione tubazione di acquedotto località Rocca di Lepre comune di Sale San Giovanni	Sale san Giovanni - località Rocca di Lepre			25.000,00	0,00						mag-18	lug-18	lug-18	intervento in sostituzione del n. 11	CONCLUSO

Proposta di variante Settembre 2018	€ 825.241,70	€ 276.620,00	€ 900.202,64	€ 45.781,31	€ 740.000,00	€ 60.000,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 825.241,70	€ 276.620,00	€ 885.402,64	€ 45.781,31	€ 740.000,00	€ 60.000,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 579.234,10	€ 276.620,00	€ 821.801,32	€ 45.781,32		
	€ 855.854,10		€ 867.582,64			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 651.639,61	€ 318.200,00	€ 782.000,00	€ 0,00		
	€ 969.839,61		€ 782.000,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 672.438,29	€ 4.201,32	€ 732.000,00	€ 0,00	€ 710.000,00	€ 0,00
	€ 676.639,61		€ 732.000,00		€ 710.000,00	

INFERNOTTO SRL			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE								
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI	
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)										
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019									
33	Sostituzione condotta acquedottistica esistente in Bagnolo P.te - Via Morelli.	Bagnolo Piemonte	6.032,99													CONCLUSO	
34	Sostituzione di condotta acquedottistica in Bagnolo P.te - via Alcide de Gasperi.	Bagnolo Piemonte	26.116,45													CONCLUSO	
35	Sostituzione membrane di diffusione ossigeno nella vasca di denitrificazione presso impianto di depurazione intercomunale di Barge e Bagnolo P.te.	Barge					10.000,00					giu-17	giu-17	lug-17	Intervento programmato per anno 2019 resosi necessario al fine di migliorare l'efficienza della depurazione della vasca di ossidazione. (Obiettivo di risparmio energetico, efficienza)		
36	Costruzione di Pozzo in località Punt D'Ula - Intervento necessario a compensare la carenza idrica in caso di periodi di siccità prolungata. (A)	Barge			0,00		35.000,00					lug-17	lug-17	set-17	Intervento attualmente SOSPESO in quanto sono in corso di valutazione soluzioni alternative. E' stata avviata la ricerca di nuove sorgenti in quota in loc. Col del Vallone nel Comune di Bagnolo Piemonte. Qualora l'analisi di fattibilità (verifica portata e qualità dell'acqua) diano esito positivo, la captazione di nuove sorgenti sostituirà l'intervento di realizzazione del pozzo.		
37	Sostituzione rete di adduzione sorgenti Grana - Bagnolo Piemonte	Bagnolo Piemonte			20.000,00							ott-18	nov-18	nov-18	Intervento resosi necesario in seguito all'avvio da parte del Comune di Bagnolo, di un intervento sulla viabilità d'accesso alla zona sorgenti Grana i cui scavi e ripristino agevolano l'intervento di sostizione della vecchia condotta. Attualmente in fase di ultimazione progettazione e avvio realizzazione, l'ultimazione lavori è prevista entro fine 2018.		
38	Sostituzione rete acquedottistica in Via Rocche dei Corvi - Bagnolo Piemonte	Bagnolo Piemonte			11.348,27							lug-18	ago-18	ago-18	Intervento resosi necessario in seguito al collasso della condotta idrica esistente con relativi probelmi alle utenze causati dalla continue rotture e perdite.	CONCLUSO	
39	Sostituzione tratto di rete acquedottistica in Frazione Assarti - Barge	Barge			3.766,81							apr-18	giu-18	giu-18	Intervento resosi necessario in seguito al collasso della condotta idrica esistente con relativi probelmi alle utenze causati dalla continue rotture e perdite.	CONCLUSO	
40	Sostituzione tratto di rete acquedottistica in Via Cardè - Barge	Barge			602,97							ago-18	set-18	set-18	Intervento resosi necessario in seguito al collasso di un tratto di condotta idrica esistente con relativi probelmi alle utenze causati dalla continue rotture e perdite.	CONCLUSO	
41	Potenziamento rete acquedottistica in borgata Rua Ordi con riallaccio utenze - Barge	Barge			2.200,00							set-18	ott-18	nov-18	Intervento resosi necessario in seguito all'ulteriore riduzione della già scarsa portata e pressione.		
42	Sostituzione rete acquedottistica in Via San Martino - Barge	Barge			20.000,00							set-18	nov-18	dic-18	Intervento resosi necessario in seguito all'avvio da parte del Comune di Barge dell'intervento di posa della nuova rete di teleriscaldamento, lavori che comportano lo scavo ed apertura della rete stradale, dove sono presenti anche vecchie tubature della rete acquedottistica ormai da sostituire. Attualmente in fase di ultimazione progettazione, ed avvio realizzazione, ultimazione lavori prevista entro fine 2018.		
43	Installazione contatori su rete distribuzione per Ricerca Perdite - Comune di Bagnolo P.te	Bagnolo Piemonte			7.500,00							ott-18	dic-18	dic-18	Intervento finalizzato alla riduzione delle eccessive perdite riscontrate sulla rete.	IN FASE DI ESECUZIONE	
44	Installazione contatori su rete distribuzione per Ricerca Perdite - Comune di Barge	Barge			7.500,00							ott-18	dic-18	dic-18	Intervento finalizzato alla riduzione delle eccessive perdite riscontrate sulla rete.	IN FASE DI ESECUZIONE	
45	Installazione contatori a servizio di utenze comunali/pubbliche del Comune di Bagnolo	Bagnolo Piemonte			11.500,00							ott-18	dic-18	dic-18	Intervento necessario al fine di regolarizzare la fatturazione alle utenze pubbliche e monitorarne i volumi di consumo.	IN FASE DI ESECUZIONE	
46	Installazione contatori a servizio di utenze comunali/pubbliche del Comune di Barge	Barge			3.500,00							ott-18	dic-18	dic-18	Intervento necessario al fine di regolarizzare la fatturazione alle utenze pubbliche e monitorarne i volumi di consumo.	IN FASE DI ESECUZIONE	

Proposta di variante Settembre 2018	€ 98.034,58	€ 0,00	€ 179.049,49	€ 0,00	€ 495.650,00	€ 0,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 98.034,58	€ 0,00	€ 207.318,92	€ 0,00	€ 375.650,00	€ 0,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 98.034,58	€ 0,00	€ 207.318,92	€ 0,00		
	€ 98.034,58		€ 207.318,92			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 119.031,04	€ 0,00	€ 385.650,00	€ 0,00		
	€ 119.031,04		€ 385.650,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 173.371,59	€ 0,00	€ 385.650,00	€ 0,00	€ 385.650,00	€ 0,00
	€ 173.371,59		€ 385.650,00		€ 385.650,00	

IRETI SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
	1 Estensione Rete Acquedotto	Ceresole d'Alba			1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	2 Manutenzione Straordinaria Allacciamenti	Ceresole d'Alba			2.000,00		2.000,00					gen-18	dic-18			
	3 Potenz.To Rete Esistente	Ceresole d'Alba			1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	4 Costruzione Nuovo Pozzo	Ceresole d'Alba			17.500,00		232.500,00		ott-18	nov-18		mar-19	giu-19		I ritardi sono dovuti ad approfondimenti relativi all'area su cui trivellare il pozzo e alla istruzione della pratica di voltura per i pozzi P1 e P2 di via Regina Margherita ed alla definizione con il Comune del comodato d'uso del tereno comunale su cui sarà trivellato il pozzo. La messa in esercizio verrà indicata a conclusione dell'iter istruttorio e delle relative prescrizioni Stima lavori EUR 250.000.	
	5 Ristrutturazione Impianto Trattamento Acq Fe-Mn di Viale R. Margherita	Ceresole d'Alba			0,00		15.000,00		ott-19	dic-19		mar-20	dic-20		I lavori possono essere progettati ed eseguiti solo dopo la terebrazione del pozzo e dopo aver effettuato le relative prove di portata. Stima lavori EUR 150.000.	
	6 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	Ceresole d'Alba	230,00		1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	7 Manutenzione Straordinaria Impianti Di Trattamento	Ceresole d'Alba			3.000,00		3.000,00					gen-18	dic-18			
	9 Manutenzione Straordinaria Depuratore	Ceresole d'Alba			2.500,00		2.500,00					gen-18	dic-18			
	10 Manutenzione Straordinaria Impianti Di Sollevamento	Ceresole d'Alba	4.055,00		3.000,00		3.000,00					gen-18	dic-18			
	11 Posa e Manutenzione Misuratori Utenza	Ceresole d'Alba	264,00		1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	12 Costruzione Nuovi Allacciamenti	Ceresole d'Alba	474,00	474,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				gen-18	dic-18			
	13 Chiusura Pozzi 1 e 2	Ceresole d'Alba					90.000,00					gen-18	dic-18			
	14 Potenz.To Rete Esistente	Sanfrè			1.500,00		1.500,00					gen-18	dic-18			
	15 Posa e Manutenzione Misuratori Utenza	Sanfrè	438,00		1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	16 Manutenzione Straordinaria Allacciamenti	Sanfrè			4.000,00		4.000,00					gen-18	dic-18			
	17 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari	Sanfrè			3.000,00		3.000,00					gen-18	dic-18			
	18 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	Sanfrè			3.000,00		3.000,00					gen-18	dic-18			
	19 Manutenzione Straordinaria Depuratore	Sanfrè			5.000,00		5.000,00					gen-18	dic-18			
	20 Manutenzione Straordinaria Impianti Di Sollevamento	Sanfrè			3.000,00		3.000,00					gen-18	dic-18			
	21 Manutenzione Straordinaria Impianti Di Trattamento	Sanfrè			1.000,00		1.000,00					gen-18	dic-18			
	23 Estensione Rete Acquedotto	Sanfrè			1.000,00		1.000,00									
	24 Costruzione Nuovi Allacciamenti	Sanfrè	1.662,00	1.662,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
	25 Sostituzione Condotta Via Racca	Sanfrè														
	26 Sostituzione Diffusori Aria Vasca Ossidazione	Sanfrè														

Droneeta di variante Settembre 2018	€ 7.123,00	€ 2.136,00	€ 61.500,00	€ 7.000,00	€ 381.500,00	€ 7.000,00
-------------------------------------	------------	------------	-------------	------------	--------------	------------

IRETI SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
	Proposta di variante Settembre 2018															

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 7.123,00	€ 2.136,00	€ 304.000,00	€ 7.000,00	€ 234.000,00	€ 7.000,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 4.990,00	€ 0,00	€ 304.000,00	€ 0,00		
	€ 4.990,00		€ 304.000,00			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 70.500,00	€ 0,00	€ 279.000,00	€ 0,00		
	€ 70.500,00		€ 279.000,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 144.000,00	€ 0,00
	€ 45.500,00		€ 84.000,00		€ 144.000,00	

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
1	Rifacimento con dotta idrica al servizio del Serbatoio Loc.PISELLO	BENE VAGIENNA			0,00		45.000,00					ago-19	ott-19	ott-19	I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso
2	Adeguamento impianto depurazione LOC.MOLINO	BENEVAGIENNA	27.909,63		40.000,00		250.000,00		feb-19	mag-19		giu-19	nov-19	mar-20	I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso
3	Adeguamento impianto depurazione LOC.PRATOROTONDO	BRIAGLIA					0,00		feb-20	apr-20		giu-20	set-20	nov-20	10.000 euro nell'anno 2020 -I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	
4	consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.BRUSA	FRABOSA SOPRANA	2.715,20		100.000,00		200.000,00		feb-19	mag-19	giu-19	lug-19	ott-19	nov-19	I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso
5	consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PELATA	FRABOSA SOPRANA			1.480,00							dic-17	giu-18	giu-18		CONCLUSO
7	Adeguamento opere captazione Loc. Dho ed integrazione con altre fonti di captazione	MONDOVI'	48.768,60		30.000,00		250.000,00		mar-19	set-19	ott-19	mar-20	mag-21	ott-21	220.000 euro negli anni 2020-2021 -i tempi di Intervento sono stati posticipati a causa dell'esigenza di realizzare prove in tempo di secca ed a causa del fallimento delle prove di portata di pozzi	progettazione in corso
8	Rifacimento acquedotto Via MARGARITA	MONDOVI'										ago-16	set-16	set-16		CONCLUSO
9	Rifacimento acquedotto Via DEI BERTONI	MONDOVI'										set-16	set-16	set-16		CONCLUSO
10	Rifacimento acquedotto Via G.B. RESSIA	MONDOVI'										ott-16	nov-16	nov-16		CONCLUSO
11	Impianto di DEPURAZIONE acque reflue urbane del Comune di Mondovì sito in Località Longana" - LOTTO 2-3	MONDOVI'			5.000,00		50.000,00		mar-19	lug-19		mar-20	set-20	mag-21		progettazione in corso

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGAT04	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
12	REVISIONE RETE FOGNARIA AFFERENTE AL RIO BOZZOLO E AL RIO PESCE E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' LONGANA	MONDOVI'	12.735,86		45.000,00		300.000,00		mar-19	mag-19	mag-19	ott-19	gen-22	mar-22	1.080.000 euro negli anni 2020-2021	progettazione in corso
13	adeguamento e potenziamento opere di captazione loc.FONTANILE	SAN MICHELE MONDOVI'	2.040,00		1.200,00							mar-17	mag-19	giu-19	I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Piemonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso
14	adeguamento e potenziamento serbatoio loc.S.BERNARDINO	SAN MICHELE MONDOVI'					0,00					giu-20	giu-21		85.000 euro negli anni 2020-2021 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Piemonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	Intervento posticipato a bienno 2020-2021
15	potenziamento reti distributive a utenze FRAZIONALI	SAN MICHELE MONDOVI'			2.984,00		35.000,00					giu-19	lug-19			CONCLUSO per COMPETENZA 2017 E MESSI A PREVENTIVO ULTERIORI 35.000,00 € DI COMPETENZA ANNO 2018
16	Potenziamento impianto depurazione VIA ROCCHINI	SAN MICHELE MONDOVI'	13.000,40		15.000,00		200.000,00		feb-19	giu-19		set-19	apr-20	set-19	150.000 euro negli anni 2020 - i tempi di Intervento sono stati posticipati in quanto per la progettazione era necessario prima ripristinare anche solo parzialmente la fgn afferente (Fgn Via Quarelli e Via Fontana che sono in corso a seguito di Alluvione 2016); la progettazione ora è ripartita	progettazione in corso
17	potenziamento rete di adduzione - Loc.LURISIA	ROCCAFORTE MONDOVI'	5.007,15									nov-17	dic-17			CONCLUSO
18	potenzimento rete distributiva a utenze FRAZIONALI	ROCCAFORTE MONDOVI'	9.114,46									apr-17	giu-17			CONCLUSO
19	Potenziamento impianto depurazione VIA GEN.DHO	ROCCAFORTE MONDOVI'			40.000,00		0,00					feb-18	nov-18		investimento partito come MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Ns comunicazione 597 del 23/02/2018)	in fase di esecuzione
20	Rifacimento acquedotto FRAZIONE MOLINE	VICOFORTE										mag-16	mag-16	mag-16		CONCLUSO
21	Rifacimento acquedottoVia PEIREA e GROGLIO	VICOFORTE										nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
22	Rifacimento acquedotto Via COLLAREI	VICOFORTE										lug-16	set-16	set-16		CONCLUSO
23	Rifacimento acquedotto Via S. PIETRO	VICOFORTE	9.203,13									ago-17	ago-17	set-17		CONCLUSO
24	Rifacimento acquedotto Via CASTELLINO	VICOFORTE			50.000,00		70.000,00		mar-19	mag-19		giu-19	set-19		I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co- finanziati da Regione Piemonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
25	Rifacimento condotta fognaria Via CASTELLINO	VICOFORTE			10.000,00		26.000,00		mar-19	mag-19		giu-19	set-19		I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	progettazione in corso
26	consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PAGANOTTI	VILLANOVA MONDOVI'					0,00					giu-20	giu-21		30.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	Intervento posticipato a bienno 2020-2021
27	Potenziamento rete distributiva a utenze FRAZIONALI	VILLANOVA MONDOVI'										ago-16	set-16			CONCLUSO
28	Adeguamento dell'impianto di DEPURAZIONE acque reflue - LOC.LA BRANZOLA	VILLANOVA MONDOVI'	9.486,47		50.000,00		0,00					apr-19	lug-19	set-19	tempi di Intervento posticipati a causa di rivalutazione interna modalità di esecuzione intervento	
29	Opere di miglioria depuratore Loc. Bongiovanni: Miglioramento funzionale dell'impianto in particolare per la gestione dei fanghi	VILLANOVA MONDOVI'	317.327,18	81.967,50								mar-17	ott-17	dic-17		CONCLUSO
30	sostituzione per Vetustà ed adeguamento a normativa CONTATORI a utenze	TUTTI COMUNI GESTITI	18.745,49		65.000,00		65.000,00					gen-17	dic-19			
31	IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - TELECONTROLLO	TUTTI COMUNI GESTITI	24.361,80		50.000,00		50.000,00					gen-17	dic-19			
33	RETE IDRICA E FOGNARIA - RILIEVO E INFORMATIZZAZIONE	TUTTI COMUNI GESTITI	34.630,01		75.000,00		35.000,00					gen-17	dic-19			
35	Manutenzioni straordinarie ACQUEDOTTO e FOGNATURA e delimitazione aree di salvaguardia	TUTTI COMUNI GESTITI	281.308,40		450.000,00		200.000,00					gen-17	dic-19			
36	ADEGUAMENTI softwares per gestione aziendale	TUTTI COMUNI GESTITI	81.783,49		60.000,00		60.000,00					gen-17	dic-19			
37	Manutenzioni straordinarie DEPURAZIONE	TUTTI COMUNI GESTITI	48.504,00		120.000,00		50.000,00					gen-17	dic-19			
38	parco autoveicoli aziendali	TUTTI COMUNI GESTITI	23.335,12		37.000,00		37.000,00					gen-17	dic-19			
39	POZZO ACQUEDOTTO - LOC.TIRO A SEGNO - recupero impianto di captazione Pozzo	BENEVAGIENNA			1.700,00		30.000,00					gen-17	dic-19			
40	RETE FOGNARIA - VIA XX SETTEMBRE Adeguamento rete fognaria	BENEVAGIENNA	884,00		7.000,00		40.000,00					gen-17	dic-19			
41	POTENZIAMENTO RETE IDRICA CONCENTRICO BRIAGLIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica in concentrico	BRIAGLIA					1.500,00		giu-19	ott-19		apr-20	ago-20		35.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
42	RETE ACQUEDOTTO - BORGATO E VIA DELLA GALLA - sostituzione condotta idrica	MONDOVI			0,00		3.000,00								55.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PRIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)	Intervento posticipato a bienno 2020-2021
43	IMPIANTO DEPURAZIONE - LOC.BREOLUNGI - potenziamento attuale impianto trattamento	MONDOVI	1.196,00		0,00							nov-17	apr-18	mag-18		CONCLUSO
44	ACQUEDOTTO LOC.GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA	VILLANOVA MONDOVI	1.248,00		15.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	ott-18	nov-18		nov-19	apr-19		finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	progettazione definitiva in fase di conclusioe
45	IMPIANTO DEPURAZIONE - RORACCO - conversione dell'attuale impianto a fanghi attivi a trattamento primario con fosse imhoff	VILLANOVA MONDOVI	9.284,00		0,00		40.000,00					apr-19	ago-19		tempi di Intervento posticipati a causa di rivalutazione interna modalità di esecuzione intervento	progettazione in corso
46	EMERGENZA IDROPOTABILE -NUOVE CAPTAZIONI LOC. BORBERA	SAN MICHELE MONDOVI'			10.000,00		30.000,00					nov-18	nov-19		360.000 euro negli anni 2020-2021 - interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	progettazione in fase di definizione
47	EMERGENZA IDROPOTABILE - Interconnessioni e by-pass volanti per ripristino servizio Acquedotto nel Comune di Roccaforte Mondovi	ROCCAFORTE MONDOVI'	11.868,58			11.868,58						lug-17	set-17		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	CONCLUSO
48	EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza opere di captazione Comune di Briaglia	BRIAGLIA	1.250,00			1.250,00						set-17	ott-17		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	CONCLUSO
49	EMERGENZA IDROPOTABILE - ripristino nodo idraulico per recupero portata verso Comune di Frabosa Soprana	FRABOSA SOPRANA	2.890,00			2.890,00						ago-17	ago-17		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	CONCLUSO
50	EMERGENZA IDROPOTABILE - revisione opere di captazione Rio Canà e sistema di adduzione al servizio	FRABOSA SOPRANA			100.000,00	50.000,00						ott-18	mar-19		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	
51	EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza e ripristino opere di captazione	FRABOSA SOPRANA			10.000,00	5.000,00						giu-18	set-18		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	CONCLUSO

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
52	EMERGENZA IDROPOTABILE - potenziamento del sistema di captazione ed adduzione al servizio del Comune di Roccaforte Mondovì - opere di captazione Loc.Ray	ROCCAFORTE MONDOVI'			50.000,00		200.000,00	125.000,00				ott-18	giu-19		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	
53	EMERGENZA IDROPOTABILE - recupero pozzo esistente in Loc.Fornace e collegamento a serbatoio S.Stefano	VICOFORTE			50.000,00		150.000,00	100.000,00				feb-19	feb-20		interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE (rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)	
54	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Monitoraggio vasche acquedotto e potenziamento delle stesse mediante predisposizione di impianti di monitoraggio dei livelli, delle portate e dei flussi idrici nelle captazioni	ROCCAFORTE MONDOVI'/VILLANOVA MONDOVI'			10.000,00		15.500,00	15.500,00				ott-18	dic-19		finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	
55	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Realizzazione recinzioni delle aree limitrofe alle vasche e delle aree di salvaguardia delle captazioni, posa in opera di impianti di allarme nelle cabine di acquedotto per evitare possibili inquinamenti dolosi.	ROCCAFORTE MONDOVI'/VILLANOVA MONDOVI'			15.000,00	12.000,00						apr-19	dic-19		finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	
56	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- VASCA Loc GALLINI' - Lavori di potenziamento e consolidamento vasca	ROCCAFORTE MONDOVI'			35.000,00	32.000,00						apr-19	dic-19		finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	
57	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Lavori di sistemazione viabilità di accesso alle vasche acquedotto Loc.Zindo Viglioni, Ripartitore e Loc.Preà	ROCCAFORTE MONDOVI'			8.000,00	7.500,00						nov-18	mag-19		finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	
58	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Lavori di estensione di tratto fognatura nera pubblica in via Valle Asili	ROCCAFORTE MONDOVI'			30.000,00		110.000,00	103.000,00	dic-18	mar-19		giu-19	dic-19	dic-19	finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni	

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
6A	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino cedimento serbatoio - Loc. FONTANE	FRABOSA SOPRANA	38.400,00	38.400,00	1.976,00	1.900,00										CONCLUSO
6B	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotte idriche - VAL CORSAGLIA- RIO SBORNINA	FRABOSA SOPRANA													INTERVENTO ANNULLATO IN FAS DI ESECUZIONE INTERVENTI ALLUVIONALI - SARà RIPROGRAMMATO POST 2019	ANNULLATO
6C	ALLUVIONE NOV.2016 - Protezione/messa in sicurezza condotta posata su strada Comunale BOSSEA- CORSAGLIA in fregio al Torrente Corsaglia	FRABOSA SOPRANA													INTERVENTO ANNULLATO IN FAS DI ESECUZIONE INTERVENTI ALLUVIONALI - SARà RIPROGRAMMATO POST 2020	ANNULLATO
6D	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opere di captazione - REISAS	FRABOSA SOPRANA	74.183,77	73.833,80												CONCLUSO
6E	ALLUVIONE NOV.2016 - Consolidamento lesioni strutturali SERBATOIO PELATA	FRABOSA SOPRANA	15.000,00	30.000,00	26.084,00	25.980,00										CONCLUSO
6F	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - ISOLA E BOSSEA	FRABOSA SOPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00										CONCLUSO
6G	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino vie di accesso LOC. MONDAGNOLA LUCHET - DEPURATORE PRINCIPALE	FRABOSA SOPRANA	11.200,00	11.200,00												CONCLUSO
12A	ALLUVIONE NOV.2016 - Rifacimento impianto depuratore frazionale - Loc.Breolunghi	MONDOVI'	0,00	0,00	56.894,00	56.790,00						nov-17	apr-18	mag-18		CONCLUSO
12B	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria VIA GAVAZZA PICCHI	MONDOVI'	0,00	8.358,98								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
12C	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta LOC.S.LORENZO - realizzazione sollevamento idrico provvisorio	MONDOVI'	0,00	3.300,00								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
16A	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione - Loc. FONTANILE	SAN MICHELE MONDOVI'	7.217,62	5.898,50								feb-17	feb-17	feb-17		CONCLUSO
16B	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in VIA FONTANA	SAN MICHELE MONDOVI'	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	226.700,00	226.700,00				giu-18	ago-18	set-18		LAVORI IN CORSO
16C	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in fregio Rio Groglio e Torrente Corsaglia - AREA QUARELLI	SAN MICHELE MONDOVI'	149.053,45	148.157,60	35.000,00	34.042,40						dic-17	nov-18	dic-18		IN FASE DI CONCLUSIONE
16D	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino scarico - impianto depurazione LOC.ROCCHINI	SAN MICHELE MONDOVI'	7.650,00	7.500,00								mar-17	apr-17	apr-17		CONCLUSO
16E	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Soprani	SAN MICHELE MONDOVI'	1.900,00	1.900,00								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
16F	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Sottani (ritrovamento fossa dichiarata dispersa)	SAN MICHELE MONDOVI'	0,00	0,00	22.997,81	22.997,81						feb-18	mar-18	apr-18		CONCLUSO
16G	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Torre	SAN MICHELE MONDOVI'	1.342,00	1.342,00								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO

MONDOACQUA SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
19A	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione LOC.DHO al servizio della rete idrica di MONDOVI	ROCCAFORTE MONDOVI'	0,00	13.237,30								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
19B	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Loc. Ghirande-RIPARTITORE	ROCCAFORTE MONDOVI'	8.200,00	8.200,00								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO
19C	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Pozzo - Loc. CROSE	ROCCAFORTE MONDOVI'	25.015,84	24.966,00						lug-17		nov-17	nov-17	dic-17		CONCLUSO
25A	ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - LOC.MOLINE	VICOFORTE	1.800,00	1.800,00								nov-16	dic-16	dic-16		CONCLUSO

Proposta di variante Settembre 2018	€ 1.339.559,65	€ 460.061,68	€ 1.882.315,81	€ 414.218,79	€ 2.899.700,00	€ 610.200,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018	€ 1.303.472,06	€ 460.561,68	€ 2.022.000,00	€ 678.900,00	€ 3.408.000,00	€ 0,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 933.902,76	€ 222.050,53	€ 1.967.000,00	€ 769.800,00		
	€ 1.155.953,29		€ 2.736.800,00			
	€ 985.716,64	€ 877.600,00	€ 1.967.000,00	€ 40.000,00		
Proposta di variante Settembre 2107	€ 1.863.316,64		€ 2.007.000,00			
	€ 2.031.500,00	€ 90.900,00	€ 1.574.000,00	€ 0,00		
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 2.122.400,00		€ 1.574.000,00		€ 1.834.000,00	€ 0,00
					€ 1.834.000,00	

SISI SRL			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
4	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti minori	Varie	6.400,00										lug-05			CONCLUSO
6	Interventi di manutenzione straordinaria su impianto di depurazione consortile di Canove di Govone	Govone	263.582,10										lug-05			CONCLUSO
9	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione del comune di Bra e dei comuni limitrofi - (5 linea Govone) 1° STRALCIO - OPERE URGENTI	Govone	5.800,00	29,11					ott-11	set-14		nov-15	ott-16	dic-16		CONCLUSO
10	Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba - Allacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2 - Alba-Bra - 1° lotto	Verduno	1.283.300,26	841.619,84	874.026,20	307.881,15			mar-15	nov-15		ago-16	giu-18	lug-18		CONCLUSO
12	Interventi di manutenzione straordinaria su impianto di depurazione consortile di Santo Stefano Belbo	Santo Stefano Belbo	50.953,16										lug-05			CONCLUSO
17	Interventi di manutenzione straordinaria su opere acquedottistiche	Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo	44.101,65		35.000,00		110.000,00					gen-16		dic-16		CONCLUSO
18	Programma di sostituzione condotte fognarie obsolete	Varie			70.000,00		200.000,00					gen-16		dic-16		CONCLUSO
20	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione del comune di Bra e dei comuni limitrofi - (condotta Bra-Pollenzo) - 2 lotto	Bra	6.354,86	4.407,49	117.592,51	117.592,51			gen-13			gen-15	set-16 dic-16	dic-16		CONCLUSO
21	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione del comune di Bra e dei comuni limitrofi - (condotta Pollenzo-S. Vittoria) - 3 loto	Santa Vittoria d'Alba	1.968.075,02	1.749.421,89	552.909,41	493.258,69			ott-14			apr-16	ott-17	dic-17		CONCLUSO
22	Riprogrammazione economie APQ 2000-2006 - Intervento di riqualificazione collettore consortile asta torrente Belbo	Santo Stefano Belbo	157.509,37	126.557,13	116.928,95	93.950,17			giu-14			ott-15	dic-16 mag-17	set-17		CONCLUSO
23	Programma di dstituzione programmata contatori obsoleti	Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo	654,00		9.346,00		5.000,00					gen-16	dic-17			CONCLUSO
24	Strumentazione controllo reti e insediamenti	Varie	9.164,74			15.000,00								lug-05		CONCLUSO
26	Razionalizzazione del sistema di collettamento del comune di Bra e dei comuni limitrofi (5 linea Govone) - 1° stralcio	Govone			30.000,00		600.000,00	300.000,00		ott-18		apr-19	mar-20	mag-20		PROGETTAZIONE IN CORSO
27	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti di depurazione	Govone e Santo Stefano Belbo			280.000,00		250.000,00					gen-16	dic-19			in corso
33	Risoluzione criticità rete fognaria cittadina - c.so Bixio	Alba			100.000,00		200.000,00					gen-16	dic-18			in programmazione
34	Altri interventi depurazione	Varie			50.000,00		620.000,00					gen-18	dic-19			in corso
35	Altri interventi fognatura	Varie	71.816,70		90.000,00		760.000,00					gen-18	dic-19			in corso
36	Potenziamento depuratore di Santo Stefano Belbo - 2 lotto 1 stralcio	Santo Stefano Belbo			30.000,00	15.000,00	600.000,00	300.000,00	set-18	dic-18		mag-19	dic-19	apr-20		PROGETTAZIONE IN CORSO

SISI SRL			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
37	Risanamento collettore consortile in corso Langhe	Alba			5.000,00	2.500,00	55.000,00	27.500,00	apr-19	lug-19		gen-20	dic-20	feb-21		IN CORSO AFFIDAMENT O PROGETTAZI ONE
39	Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi (Monticello-Alba) - 4 lotto	Monticello d'Alba			30.000,00	15.000,00	50.000,00	25.000,00	nov-18	gen-19		lug-19	lug-20	nov-20		IN CORSO AFFIDAMENT O PROGETTAZI ONE ESECUTIVA+D L
40	Rivisitazione sistema idrico loc. Marini- Moncucco-San Maurizio	Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo					30.000,00	11.001,00		dic-18		gen-19	dic-19			IN CORSO AFFIDAMENT O PROGETTAZI ONE
41	Sostituzione condotta acquedotto in strada Calosso (loc. Vogliere) e loc. Cesaroni	Santo Stefano Belbo			20.000,00	7.334,00	95.000,00	34.836,50	ott-18	gen-19		apr-19	set-19			PROGETTO PRELIMINARE- IN FASE REDAZIONE DEF
42	Sopostamento condotta fognaria sifone Talloria	Roddi					100.000,00	100.000,00		giu-19		set-19	giu-20			SOSPESO DA AUTOSTRADE
43	Dismissione fossa Imhoff strada Tanaro	Verduno					205.200,00			nov-17		nov-18	giu-19	ago-19		LAVORI CONTRATTUA LIZZATI
44	Dismissione fossa Imhoff Rive Rocche	Verduno					100.000,00			dic-18		mar-19	apr-19	apr-19		
45	Dismissione fossa Imhoff loc. Casanova	Govone					120.000,00			ott-18		nov-18	gen-19	gen-19		PROGETTO ESECUTIVO
2	Rinnovo parco mezzi	Varie	14.770,28											lug-05		CONCLUSO
8	Installazione piattaforma di pesatura	Govone											mar-16	mar-16		CONCLUSO

Proposta di variante Settembre 2018	€ 3.882.482,14	€ 2.722.035,46	€ 2.410.803,07	€ 1.067.516,52	€ 4.100.200,00	€ 798.337,50

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con	€ 3.882.482,14	€ 2.722.035,46	€ 3.131.003,07	€ 1.183.683,52	€ 3.395.000,00	€ 682.170,50
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

SISI SRL			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)						TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)						Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)									
ID interv ento pianifi cato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019								
	Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018															

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 1.160.446,68	€ 2.722.035,46	€ 2.500.820,55	€ 1.745.182,52		
	€ 3.882.482,14		€ 4.246.003,07			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 1.994.072,54	€ 3.745.830,37	€ 2.953.800,44	€ 18.199,56		
	€ 5.739.902,91		€ 2.972.000,00			
PDI 2016-2019 - File Criticità MT12 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 2.489.687,72	€ 500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
	€ 2.989.687,72		€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00	

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
1	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione membrane impianto ad ultrafiltrazione	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione membrane impianto ad ultrafiltrazione	234.047,75		358.086,75					apr-17			ott-17	gen-18	set-18	LAVORO CHIUSO AVANZAMENTO LAVORI 100%	CONCLUSO
2	ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione nuovo serbatoio Località Scaparoni	ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione nuovo serbatoio Località Scaparoni														lavoro previsto oltre il 2019 valore € 80.000,00	
3	ALBA-CN-EGATO/4 - Adeguam.Imp.Elettr. x Impianto Loc. S. Rosalia pompaggio - Alba	ALBA-CN-EGATO/4 - Adeguam.Imp.Elettr. x Impianto Loc. S. Rosalia pompaggio - Alba	27.201,98							ott-17	feb-17		mag-17	set-17	set-17	Eseguito come manutenzione straordinaria nel 2017	CONCLUSO
4	ALBA-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione serbatoio loc Ricca, Comune di Diano a servizio di Alba	ALBA-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione serbatoio loc Ricca, Comune di Diano a servizio di Alba			0,00											lavoro da € 334.000 previsto oltre 19 al momento è in corso la progettazione	IN CORSO PROGETTAZIONE
5	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazione via Ognissanti PE 63 mm	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazione via Ognissanti PE 63 mm														lavoro previsto oltre il 2019 valore € 55.000,00	
6	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazione via Cuneo in PE 63 mm PN 10	ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazione via Cuneo in PE 63 mm PN 10	67.753,51										feb-17	apr-17	apr-17		CONCLUSO
7	ALBA-CN-EGATO/4 - Distrettualizzazione rete cittadina	ALBA-CN-EGATO/4 - Distrettualizzazione rete cittadina	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 250.000,00	
8	ALBA-CN-EGATO/4 - sostituzione reti obsolete	ALBA-CN-EGATO/4 - sostituzione reti obsolete	0,00		175.000,00		175.000,00						gen-18	dic-18	dic-18	lavori attualmente in corso di esecuzione in vicolo del Pozzo e via Pietrino Belli NON NECESSITA DI PROGETTAZIONE GESTITO CON VARI INTERVENTI DI	90%
9	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (solo recupero funzionale) LOTTO 1	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (solo recupero funzionale) LOTTO 1	887.200,16										ago-17	set-17	set-17		CONCLUSO
10	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (interventi aggiuntivi migliorativi) LOTTO 1	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (interventi aggiuntivi migliorativi) LOTTO 1	0,00						470.000,00								
11	ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione stazione di rilancio c/o Tefin	ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione stazione di rilancio c/o Tefin	22.491,28													SPOSTATO OLTRE IL 2019 VALORE COMPLESSIVO 150.000 RESIDUO 127.500	15%
12	BALDISSERO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	BALDISSERO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		25.000,00		25.000,00						giu-18	set-18	set-18		90%

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
13	BARBARESCO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	BARBARESCO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		25.000,00		25.000,00						giu-18	set-18	ott-18		50%
14	BAROLO-CN-EGATO/4 - Fognatura e Depurazione Loc. Vergne Barolo	BAROLO-CN-EGATO/4 - Fognatura e Depurazione Loc. Vergne Barolo	2.733,59		10.000,00		187.266,41						mar-19	set-19	dic-19	SPOSTAMENTO AL 2019 PER ACCORDI BONARI, nel 2018 solo spese tecniche per progettazione definitiva	5%
15	BAROLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete sotto castello 70 ml	BAROLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete sotto castello 70 ml	0,00		11.764,00								ott-18	dic-18	dic-18		0
16	BRA-CN-EGATO/4 - Lavoro di Ristrutturaz. Serbatoio in Loc. La Zizzola - Bra	BRA-CN-EGATO/4 - Lavoro di Ristrutturaz. Serbatoio in Loc. La Zizzola - Bra	0,00														CONCLUSO
17	BRA-CN-EGATO/4 - Potenziamento del campo pozzi con realizzazione di nuovo pozzo duale "Cà Del	BRA-CN-EGATO/4 - Potenziamento del campo pozzi con realizzazione di nuovo pozzo duale "Cà Del	1.198,15				363.785,85			ago-13			nov-18	giu-19		Intervento si conclude nel 2019 causa difficoltà acquisizione area pozzo. Valore dell'intervento 364.984	
18	BRA-CN-EGATO/4 - Attivazione pozzo loc. Riva	BRA-CN-EGATO/4 - Attivazione pozzo loc. Riva	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 150.000,00	
19	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Cà del Bosco n.1 D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Cà del Bosco n.1 D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	0,00						250.000,00								
20	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Cà del Bosco n.2 DPGR 4/R	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Cà del Bosco n.2 DPGR 4/R	0,00						250.000,00								
21	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Petitti D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	BRA-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Petitti D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	0,00						250.000,00								
22	BRA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazioni acq durante posa rete Teleriscaldamento	BRA-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazioni acq durante posa rete Teleriscaldamento	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 150.000,00	
23	BRA-CN-EGATO/4 - Sostituzione e spostamento di un tratto di rete acquedotto in Strada Orti (SS 231) nel	BRA-CN-EGATO/4 - Sostituzione e spostamento di un tratto di rete acquedotto in Strada Orti (SS 231) nel	0,00							apr. 16	apr. 16		giu. 16	set-16	set-16		CONCLUSO
24	BRA-CN-EGATO/4 - Rinnovamento reti obsolete	BRA-CN-EGATO/4 - Rinnovamento reti obsolete	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 150.000,00	

[illegible]

[illegible]

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
49	CHERASCO-CN-EGATO/4 - CHERASCO Loc. Cà di Ghiru: sostituzione tubazione obsoleta	CHERASCO-CN-EGATO/4 - CHERASCO Loc. Cà di Ghiru: sostituzione tubazione obsoleta	29.232,74														CONCLUSO
50	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Nuovo pozzo acq loc Roncaglia	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Nuovo pozzo acq loc Roncaglia	0,00				478.000,00										
51	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rinnovamento reti obsolete	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rinnovamento reti obsolete	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 400.000,00	
52	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Sost. e spost. Tubazione rete acquedotto in loc. Cascina Siccardi	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Sost. e spost. Tubazione rete acquedotto in loc. Cascina Siccardi	0,00		35.000,00								feb-18	ott-18	ott-18		90%
53	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rivisitazione sistema idrico S. Bartolomeo	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rivisitazione sistema idrico S. Bartolomeo	0,00				200.000,00										
54	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Sostituzione della tubazione acquedotto e degli allacciamenti esistenti a seguito	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Sostituzione della tubazione acquedotto e degli allacciamenti esistenti a seguito	1.388,90		72.611,10					ott-16			mag-18	ott-18	ott-18		90%
55	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in via Ospedale e via Garibaldi	CHERASCO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in via Ospedale e via Garibaldi	26.488,80		9.500,00		€ 248.241,00			nov-17	nov-18		feb-19	giu-19	lug-19	anno 2018 si concluderà la progettazione	
56	CHERASCO CN-EGATO/4 Rifacimento ed estendimento rete fognaria sita in s.p. Bra-Cherasco nel Comune di	CHERASCO CN-EGATO/4 Rifacimento ed estendimento rete fognaria sita in s.p. Bra-Cherasco nel Comune di	0,00							nov-15	nov-15		gen-16	mag-16	giu-16		CONCLUSO
57	CHERASCO CN-EGATO/4 Revisione sfioratore loc. Bergoglio- via Dei Tigli	CHERASCO CN-EGATO/4 Revisione sfioratore loc. Bergoglio- via Dei Tigli	0,00				50.000,00						giu-19	set-19		previsto nel 2018 posticipato nel 2019 causa attesa autorizzazione di scarica nel canale Pertusata	
58	CHERASCO CN-EGATO/4 Centro storico - rifacimento tratti fognari	CHERASCO CN-EGATO/4 Centro storico - rifacimento tratti fognari	0,00													PROGETTO ANNULLATO E SOSTITUITO CON IL N° 55	
59	CHERASCO CN-EGATO/4 Lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione in località	CHERASCO CN-EGATO/4 Lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione in località	754.760,85		47.020,91					gen-14	feb-16		feb-16	lug-18	lug-18		CONCLUSO
60	CHERASCO CN-EGATO/4 Potenziamento digestione e disidratazione fanghi impianto Moglia	CHERASCO CN-EGATO/4 Potenziamento digestione e disidratazione fanghi impianto Moglia	0,00						150.000,00								

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
61	CORNELIANO-CN-EGATO/4 - collegamento della rete area industriale con la rete del paese (ml 50) e	CORNELIANO-CN-EGATO/4 - collegamento della rete area industriale con la rete del paese (ml 50) e	0,00				25.000,00						nov-19	dic-19	dic-19		
62	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostit. e Ridimens. Acq. SP32 c/o Serb.Moncolombetto-Diano	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostit. e Ridimens. Acq. SP32 c/o Serb.Moncolombetto-Diano	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 69.868,00	
63	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Adeg. impianto el. al D.M. 37-08 dei seguenti impianto del Comune di	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Adeg. impianto el. al D.M. 37-08 dei seguenti impianto del Comune di	645,79				41.289,00			ott-16	giu-17		set-19	ott-19	ott-19	intervento posticipato a fine 2019	
64	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione sfioratore in via Guido Cane diam 300 mm - TUBAZIONI DIAMETRO	DIANO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Realizzazione sfioratore in via Guido Cane diam 300 mm - TUBAZIONI DIAMETRO														Intervento da 50.000 previsto nel 19 per il quale è stata richiesta la variazione di destinazione d'uso in MS a favore del nuovo intervento inserito co identificativo n.	
65	GOVONE - CN-EGATO/4 - Via Priosa : sostituzione tubazione ml 800	GOVONE - CN-EGATO/4 - Via Priosa : sostituzione tubazione ml 800	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019	
66	GOVONE - CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	GOVONE - CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		12.000,00		25.000,00						giu-18	lug-18	ott-18		90%
67	GRINZANE CAVOUR-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	GRINZANE CAVOUR-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 250.000,00	
68	GRINZANE CAVOUR-CN-EGATO/4 - Realizzazione sfioratore in LOC. Gallo via Campo Sportivo 80 ml diam 300 -	GRINZANE CAVOUR CN-EGATO/4 - Realizzazione sfioratore in LOC. Gallo via Campo Sportivo 80 ml diam 300 -	0,00													Intervento da 25.000 previsto nel 19 per il quale è stata richiesta la variazione di destinazione d'uso in MS a favore del nuovo intervento inserito co identificativo n.	
69	GOVONE-CN-EGATO/4 - Estend. rete Fogna x Zona Molino e Imp.Sollevam. - Govone 117.500.Finanziamento	GOVONE-CN-EGATO/4 - Estend. rete Fogna x Zona Molino e Imp.Sollevam. - Govone 117.500.Finanziamento	0,00													Concluso nel 2015	CONCLUSO
70	GUARENE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	GUARENE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 100.000,00	
71	GUARENE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete acquedotto via S. Sebastiano	GUARENE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete acquedotto via S. Sebastiano	0,00				80.000,00										
72	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Riodasso	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Riodasso	0,00				25.000,00						mar-19	giu-19			

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019									
73	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Estendimento reti fognarie in zone non servite	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Estendimento reti fognarie in zone non servite	0,00						100.000,00								
74	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto depurazione della acque reflue loc. Brandini	LA MORRA-CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto depurazione della acque reflue loc. Brandini	0,00				50.000,00									Previsto nell'anno 2018 traslato nell'anno 2019 a favore di altri interventi che presentano criticità maggiori. Valore intervento € 50.000,00	
75	MAGLIANO-CN-EGATO/4 - Ristrutt.ne Serbatoio Loc. Capoluogo	MAGLIANO-CN-EGATO/4 - Ristrutt.ne Serbatoio Loc. Capoluogo	0,00													lavoro previsto oltre il 2019 valore € 250.000,00 , già eseguita la progettazione	
76	MAGLIANO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	MAGLIANO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		15.000,00		25.000,00						giu-18	ott-18	ott-18		90%
77	MANGO-CN-EGATO/4 - Sostituzione/spostamento tubazione causa frana in loc. Val di Villa	MANGO-CN-EGATO/4 - Sostituzione/spostamento tubazione causa frana in loc. Val di Villa	0,00		95.000,00											importo previsto € 55.000,00 a seguito variante progetto c'è stato un aumento ad € 95.000,00. La somma accedente viene recuperata dall'intervento n 88 previsto	
78	MANGO-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazioni in fibrocemento PROGETTO MANGO LOC S. ADRIANO	MANGO-CN-EGATO/4 - Sostituzione tubazioni in fibrocemento PROGETTO MANGO LOC S. ADRIANO	0,00				96.000,00										
79	MANGO-CN-EGATO/4 - Revisione impianto loc. Filura e messa in sicurezza	MANGO-CN-EGATO/4 - Revisione impianto loc. Filura e messa in sicurezza	0,00													Intervento da50.000 previsto nel 19 per il quale è stata richiesta la variazione di destinazione d'uso in MS a favore del nuovo intervento inserito co identificativo n.	
80	MONTA'-CN-EGATO/4 - Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37-08 degli impianti di località Vittori e Ghioni	MONTA'-CN-EGATO/4 - Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37-08 degli impianti di località Vittori e Ghioni	955,51		30.497,49					ott-16	giu-17		set-18	ott-18	ott-18	previsto nel 2019 viene anticipato nel 2018	
81	MONTA'-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	MONTA'-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		0,00		80.000,00									previsti € 160.000,00 nel 2019 vengono ripartiti su due anni, di conseguenza € 80.000,00 vengono spostati oltre il 2019	
82	MONTA'-CN-EGATO/4 - Rifacimento stazione di sollevamento via Circonvallazione	MONTA'-CN-EGATO/4 - Rifacimento stazione di sollevamento via Circonvallazione	0,00		50.000,00								ott-18	dic-18			
83	MONTA'-CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto loc. S. Martino (costruzione denitrificatore e sedimentazione finale)	MONTA'-CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto loc. S. Martino (costruzione denitrificatore e sedimentazione finale)	23,53		7.500,00				307.500,00	ott-18			lug-19	nov-19		lavoro pianificato nel 2017 per € 186.000, poi spostato oltre l'anno 2019; valutazione circa l'adozione di nuove tecnologie atte ad incrementarne l'efficienza e la	
84	MONTA'-CN-EGATO/4 - Rifacimento reti fognarie centro storico	MONTA'-CN-EGATO/4 - Rifacimento reti fognarie centro storico	0,00						30.000,00							MS - Lavoro pianificato nel 2016 per € 75.000 si era pensato di poterlo eseguire entro giugno 2017 come manutenzione straordinaria. l'intervento	

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
85	MONTA'-CN-EGATO/4 - Adeguamento cabina elettrica - MT impianto di depurazione loc. San Martino	MONTA'-CN-EGATO/4 - Adeguamento cabina elettrica - MT impianto di depurazione loc. San Martino	0,00													intervento non più necessario in quanto la cabina verrà dismessa e la fornitura di energia sarà effettuata in BT	
86	MONTALDO ROERO CN-EGATO/4 - Estendimento linea sotto comune 100 ml diam 300	MONTALDO ROERO CN-EGATO/4 - Estendimento linea sotto comune 100 ml diam 300	0,00		25.000,00								ott-18	dic-18			
87	MONTEU ROERO CN-EGATO/4 - Estendimento rete fognaria loc. Tre Rivi	MONTEU ROERO CN-EGATO/4 - Estendimento rete fognaria loc. Tre Rivi	34.718,10											mag-17			CONCLUSO
88	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 500 di rete insufficiente in loc. Valdoza	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 500 di rete insufficiente in loc. Valdoza	0,00						55.000,00				apr-19	mag-19	mag-19	SPOSTATO AL 19 DA REALIZZARE IN CONTEMPORANEA CON L'INTERVENTO 89	
89	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 500 di rete in loc. Cimitero	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 500 di rete in loc. Cimitero	0,00				65.000,00									Intervento da 65.000 previsto nel 19 per il quale è stata richiesta la variazione di destinazione d'uso in MS a favore del nuovo intervento inserito co identificativo n.	
90	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Potenziamento fogna casc.Pognano e sostituzione acquedotto	MONTICELLO D'ALBA-CN-EGATO/4 - Potenziamento fogna casc.Pognano e sostituzione acquedotto	5.821,94		53.097,37								mar-18	giu-18			CONCLUSO
91	MONTICELLO CN-EGATO/4 - Modifica sfioratore via Nantiat	MONTICELLO CN-EGATO/4 - Modifica sfioratore via Nantiat	0,00						25.000,00							gestito come Manut straord inizialmente previsto nel 2017 verrà posticipato oltre il 2019 a cause delle riscontrate difficoltà tecniche nella progettazione dell'intervento	
92	MONTICELLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete via Divisione Cuneense 150 ml diam 500	MONTICELLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete via Divisione Cuneense 150 ml diam 500	0,00						50.000,00							intervento previsto per l'anno 2018 valore € 50.000,00 trasformato in manutenzione straordinaria, viene traslato oltre l'anno 2019 perché si rende necessario e più	
93	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Potenziamento sistema di approvvigionamento mediante costruzione di un nuovo pozzo in loc. S.	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Potenziamento sistema di approvvigionamento mediante costruzione di un nuovo pozzo in loc. S.	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 700.000,00	
94	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Realizzazione impianto di potabilizzazione per il trattamento Fe e Mn e successivo trattamento	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Realizzazione impianto di potabilizzazione per il trattamento Fe e Mn	0,00				250.000,00										
95	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione/spostamento tubazione in loc. Chiabotti	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione/spostamento tubazione in loc. Chiabotti	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 114.000,0	
96	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 150.000,00	

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
97	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Podio n. 1 D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Ricondizionamento pozzo Podio n. 1 D.P.G.R. 4/R del 05/03/2001	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 200.000,00	
98	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Realizzazione nuova condotta (ml 2500) in loc. Moriglione	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Realizzazione nuova condotta (ml 2500) in loc. Moriglione	0,00													lavoro per € 500.000,00 previsto nel 2018 e nel 2019 viene sostituito dall'intervento 100.1 a seguito finanziamento MEF/MATTM riduzione delle perdite -	
99	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete idrica Cascina del Battaglione	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete idrica Cascina del Battaglione	0,00		45.000,00								mar-18	ott-18			90%
100	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete idrica loc. Maggiore Chiari	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sostituzione rete idrica loc. Maggiore Chiari	0,00		65.000,00								mar-18	ott-18			90%
101	NARZOLE-CN-EGATO/4 - defosfatazione impianto di depurazione in loc. Centrale Enel	NARZOLE-CN-EGATO/4 - defosfatazione impianto di depurazione in loc. Centrale Enel	29.031,88						95.968,12							Previsto nel 2018 deve partire tutto l'iter della progettazione, lavoro cantierabile oltre l'anno 2019. Valore totale dell'opera 125.000,00 Euro	
102	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sistemazione fogna in loc. Moglia,Carnetti e Marsaglia	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Sistemazione fogna in loc. Moglia,Carnetti e Marsaglia	0,00													Concluso nel 2015	CONCLUSO
103	NARZOLE CN-EGATO/4 - Realizzazione nuovo sollevamento fognario a servizio loc. Perosa per danneggiamento rete	NARZOLE CN-EGATO/4 - Realizzazione nuovo sollevamento fognario a servizio loc. Perosa per danneggiamento rete	0,00				150.000,00									lavoro pianificato per € 150.000 nel 2017, poi traslato al 2018 e successivamente spostato nell'anno 2019 , l'area in cui ricade è soggetta a frana, siamo in attesa che	
104	NARZOLE CN-EGATO/4 - Realizzazione di sfioro in via Garibaldi	NARZOLE CN-EGATO/4 - Realizzazione di sfioro in via Garibaldi	0,00		25.000,00								ott-18	dic-18		MS - lavoro pianificato per € 25.000 nel 2017, poi traslato al 2018; l'intervento si rende necessario vista l'inefficacia degli interventi di regimazione acque	
105	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in via Martiri della Libertà	NARZOLE-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in via Martiri della Libertà					75.000,00						set-19	nov-19			
106	NEIVE-CN-EGATO/4 - Sostituzione acq. via Mazzini, Stazione, S.Giuseppe, p.zza Garibaldi	NEIVE-CN-EGATO/4 - Sostituzione acq. via Mazzini, Stazione, S.Giuseppe, p.zza Garibaldi	2.995,10		62.004,90					nov-18	dic-18		lug-17	ott-18	ott-18		90%
107	NEIVE-CN-EGATO/4 - Sostituzione 900 mt di tubazione in loc. Bordini	NEIVE-CN-EGATO/4 - Sostituzione 900 mt di tubazione in loc. Bordini	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 120.000,00	
108	NEIVE-CN-EGATO/4 - Eliminazione impianti con sollevamento in loc. Valledoglio, Bricco e Pallareto	NEIVE-CN-EGATO/4 - Eliminazione impianti con sollevamento in loc. Valledoglio, Bricco e Pallareto	0,00													intervento doppione del n 158 da considerare eliminato	

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
109	NEVIGLIE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	NEVIGLIE-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00				25.000,00									Intervento non prioritario da 25.000,00 euro previsto nel 2018 ed € 25.000,00 nel 2019 entrambi posticipati di un anno, gestiti come Manut straord	
110	NEVIGLIE-CN-EGATO/4 - Rifacimento acquedotto in loc. Forma e sarotto + costruzione fogna in loc. Sarotto	NEVIGLIE-CN-EGATO/4 - Rifacimento acquedotto in loc. Forma e sarotto + costruzione fogna in loc. Sarotto	0,00														CONCLUSO
111	NOVELLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento fognatura loc. Pradonio Roggeri	NOVELLO-CN-EGATO/4 - Rifacimento fognatura loc. Pradonio Roggeri	217.110,00							feb-17	apr-17	mar-17	apr-17	ago-17			CONCLUSO
112	PIOBESI d'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	PIOBESI d'ALBA-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00				25.000,00									Intervento non prioritario da 25.000,00 euro previsto nel 2018 ed € 25.000,00 nel 2019 entrambi posticipati di un anno, gestiti come Manut straord	
113	PRIOCCA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 300 di tubazione in via Pirio	PRIOCCA-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 300 di tubazione in via Pirio	0,00				122.000,00										
114	POCAPAGLIA-CN-EGATO/4 - Rifacimento fognatura via Cavour	POCAPAGLIA-CN-EGATO/4 - Rifacimento fognatura via Cavour	0,00													intervento eliminato, non si rende più necessario	
115	RODDI-CN-EGATO/4 - Adeguam.Imp.Elettr. x Impianto Via Morando	RODDI-CN-EGATO/4 - Adeguam.Imp.Elettr. x Impianto Via Morando	0,00		2.000,00		74.820,00						mag-18	mar-19	mar-19		5%
116	RODDI-CN-EGATO/4 - Interconnessione rete ALBA-RODDI in via Cavallotto	RODDI-CN-EGATO/4 - Interconnessione rete ALBA-RODDI in via Cavallotto	0,00				60.000,00									Intervento non prioritario da 60.000,00 euro previsto nel 2018 spostato al 2019 gestito come Manut straord	
117	RODDI-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 800 di tubazione in via Morando	RODDI-CN-EGATO/4 - Sostituzione mt 800 di tubazione in via Morando	0,00				110.000,00										
118	RODDI CN-EGATO/4 - Rifacimento sfioratore in loc. Ponte Talloria	RODDI CN-EGATO/4 - Rifacimento sfioratore in loc. Ponte Talloria	0,00				10.000,00						set-19	nov-19			
119	RODDINO-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione impianto di depurazione loc. Rizzo e messa in sicurezza a fronte di	RODDINO-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione impianto di depurazione loc. Rizzo e messa in sicurezza a fronte di	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 50.000,00	
120	SANTA VITTORIA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Adeg.Imp.Elettr. x Loc.MezzaCosta,Castello ,Cinzano	SANTA VITTORIA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Adeg.Imp.Elettr. x Loc.MezzaCosta,Castello ,Cinzano	1.349,74				78.650,26						set-19	nov-19			

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
121	SANTA VITTORIA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Collegamento adduttrice con rete Piana Biglini e rete S. Vittoria	SANTA VITTORIA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Collegamento adduttrice con rete Piana Biglini e rete S. Vittoria	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 20.000,00	
122	SANTA VITTORIA-CN-EGATO/4 - Realizzazione di dissabbiatore in zona DIAGEO	SANTA VITTORIA-CN-EGATO/4 - Realizzazione di dissabbiatore in zona DIAGEO	0,00						75.000,00								
123	SANTA VITTORIA -CN-EGATO/4 - Modifica interconnessione tubazioni reti da Pollenzo e Pocapaglia in	SANTA VITTORIA -CN-EGATO/4 - Modifica interconnessione tubazioni reti da Pollenzo e Pocapaglia in	0,00				10.000,00						feb-19	mar-19			
124	SERRALUNGA -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Garombo 300 ml diam 250	SERRALUNGA -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Garombo 300 ml diam 250	0,00				25.000,00						mag-19	giu-19			
125	SERRALUNGA-CN-EGATO/4 - Rifacimento stazione di sollevamento concentrico	SERRALUNGA-CN-EGATO/4 - Rifacimento stazione di sollevamento concentrico	0,00		10.000,00		40.000,00						nov-18	mar-19			
126	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Realizzazione nuova vasca dell'acquedotto e stazione	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Realizzazione nuova vasca dell'acquedotto e stazione	29.507,32		675.492,68					apr-18			set-08	dic-18	dic-18	intervento programmato con importo iniziale di 535.000 passato a 705.000,00 iniziato nel 2018 terminerà nello stesso anno per la somma eccedente si attingerà	26%
127	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37-08 dell' impianto di frazione	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37-08 dell' impianto di frazione	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 7.000,00	
128	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 400.000,00	
129	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Revisione impianto di loc. Gabrielassi e scarico terminale in corpo idrico	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Revisione impianto di loc. Gabrielassi e scarico terminale in corpo idrico	20,17						55.000,00							VERRA' GESTITO COME MANUTENZIONE STRAORDINARIA OLTRE L'ANNO 2019	
130	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Op.Urb.Prim. (realiz. fogna fraz. Maniga-Tavelle)	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Op.Urb.Prim. (realiz. fogna fraz. Maniga-Tavelle)	0,00														CONCLUSO
131	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Potenz. e Adeguam. rete fogna in loc.Geriglio	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Potenz. e Adeguam. rete fogna in loc.Geriglio	0,00														CONCLUSO
132	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Cicli alternati all'impianto Geriglio	SOMMARIVA del BOSCO CN-EGATO/4 - Cicli alternati all'impianto Geriglio	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 50.000,00	

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)		oltre il 2019								
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019		Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
133	SOMMARIVA del BOSCO -CN-EGATO/4 - Rifacimento reti fognarie centro storico	SOMMARIVA del BOSCO -CN-EGATO/4 - Rifacimento reti fognarie centro storico	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 50.000,00	
134	SOMMARIVA BOSCO - CN-EGATO/4 - Adeguamento cabina elettrica impianto di depurazione sito in loc.	SOMMARIVA BOSCO - CN-EGATO/4 - Adeguamento cabina elettrica impianto di depurazione sito in loc.	0,00		50.000,00								nov-18	dic-18		La manutenzione straordinaria sostituisce la ricostruzione della cabina, perché si è deciso di passare da utenze elettriche da MT a BT su + impianti compreso	20%
135	SOMMARIVA PERNO-CN-EGATO/4 - Variante sostanziale con provvedimento d'urgenza –	SOMMARIVA PERNO-CN-EGATO/4 - Variante sostanziale con provvedimento d'urgenza –	0,00														CONCLUSO
136	SOMMARIVA PERNO - CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Cagnotti 1000 ml diam 400	SOMMARIVA PERNO - CN-EGATO/4 - Rifacimento rete in loc. Cagnotti 1000 ml diam 400	0,00						200.000,00								
137	S. STEFANO ROERO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	S. STEFANO ROERO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00				25.000,00										
138	SINIO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	SINIO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00		25.000,00		25.000,00						dic-18	dic-18	dic-18		0
139	TREISO -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria sotto comune	TREISO -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria sotto comune	62.899,81														CONCLUSO
140	TREISO -CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto depurazione della acque reflue loc. Pertinace	TREISO -CN-EGATO/4 - Potenziamento impianto depurazione della acque reflue loc. Pertinace	0,00										giu-16	giu-16			CONCLUSO
141	TREZZO TINELLA-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	TREZZO TINELLA-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	0,00				50.000,00										
142	TREZZO TINELLA-CN-EGATO/4 - Rifacim rete fognaria cascine Pian del Soglio, Trezzo Tinella	TREZZO TINELLA-CN-EGATO/4 - Rifacim rete fognaria cascine Pian del Soglio, Trezzo Tinella	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 108.762,00	
143	VERDUNO-CN-EGATO/4 - Adegu. Imp. el. al D.M. 37-08 dell' impianto di loc. Castagni	VERDUNO-CN-EGATO/4 - Adegu. Imp. el. al D.M. 37-08 dell' impianto di loc. Castagni	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 8.000,00	
144	VERDUNO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	VERDUNO-CN-EGATO/4 - Sostituzione reti obsolete	64,30		8.000,00		25.000,00						gen-18	giu-18	giu-18		CONCLUSO

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)								TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)															
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)											
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	oltre il 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018	
145	VEZZA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Spostamento adduttrice per Govone e rivisitazione sistema adduzione ai comuni di	VEZZA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Spostamento adduttrice per Govone e rivisitazione sistema adduzione ai comuni di	0,00		12.250,00		287.750,00			ott-18	ott-18		apr-19	set-19	ott-19	Intervento da 300.000,00 spostato al 2019 per tempistiche autorizzazioni, spese tecniche nel 18		
146	VEZZA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Revisione impianto loc. Borbore	VEZZA d'ALBA-CN-EGATO/4 - Revisione impianto loc. Borbore	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 100.000,00		
147	VEZZA -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria strada S.Michele 40 ml diam 300	VEZZA -CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria strada S.Michele 40 ml diam 300	0,00				25.000,00											
148	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Realizzaz. nuovo pozzo in Loc. San Lorenzo (S.Stefano Roero)	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Realizzaz. nuovo pozzo in Loc. San Lorenzo (S.Stefano Roero)	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 458.670,00		
149	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su campo pozzi Santo Stefano Roero	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su campo pozzi Santo Stefano Roero	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 60.000,00		
150	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione Impianto Monteu Roero loc. S. Berdardo	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Ristrutturazione Impianto Monteu Roero loc. S. Berdardo	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 400.000,00		
151	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su Campo pozzi Monteu Roero	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su Campo pozzi Monteu Roero	12.750,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 60.000,00		
152	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Potenziamento campo pozzi Sommariva Perno in Loc. Olmetto	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Potenziamento campo pozzi Sommariva Perno in Loc. Olmetto	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 584.005,00		
153	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su Campo pozzi Sommariva Perno	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Indagini su Campo pozzi Sommariva Perno	10.449,51													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 20.000,00		
154	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Automazione degli impianti acquedottistici siti nel territorio di Langa	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Automazione degli impianti acquedottistici siti nel territorio di Langa	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 360.000,00		
155	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Individuazione fonti approvvigionamento e messa a norma L.15/R	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Individuazione fonti aprovvigionamento e messa a norma L.15/R	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019		
156	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Realizzazione collettori fognari per eliminazione impianti barbaresco	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Realizzazione collettori fognari per eliminazione impianti barbaresco	27.518,30		30.000,00				292.481,70							Lavoro previsto oltre il 2019 valore € 1.026.000,00		

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)								TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)															
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)											
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	oltre il 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018	
157	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - INTERVENTI INDIVIDUATI PUNTUALMENTE NEI	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - INTERVENTI INDIVIDUATI PUNTUALMENTE NEI	0,00													Lavoro previsto oltre il 2019		
158	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Dismissione degli impianti di Loc. Valledoglio, Pallareto e	OPERE INTERCOMUNALI-CN-EGATO/4 - Dismissione degli impianti di Loc. Valledoglio, Pallareto e	339.724,10		496.275,90					gen-16	giu-16		ago-17	nov-18			90%	
159	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Sostituzione contatori d'utenza	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Sostituzione contatori d'utenza	0,00		70.000,00		70.000,00						gen-18	dic-18				
160	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Rilievo e digitalizzazione reti acquedotto	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Rilievo e digitalizzazione reti acquedotto	0,00		10.000,00		10.000,00						gen-18	dic-18				
161	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Rilievo e digitalizzazione delle reti fognarie	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - Rilievo e digitalizzazione delle reti fognarie	0,00		10.000,00		50.000,00						gen-18	dic-18				
162	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - implementazione servizio telecontrollo impianti di depurazione	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4 - implementazione servizio telecontrollo impianti di depurazione	0,00				€ 100.000,00						gen-19	dic-19				
163	MANUTENZIONI-CN-EGATO/4 - Interventi su reti ed impianti	MANUTENZIONI-CN-EGATO/4 - Interventi su reti ed impianti acquedotto	1.614.510,15		1.700.000,00		300.000,00						gen-18	dic-18	dic-18		75%	
164	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - DEPURAZIONE - reti fogna	MANUTENZIONI-CN-EGATO/4 - Interventi su reti ed impianti fognatura	463.029,92		300.000,00		200.000,00						gen-18	dic-18	dic-18		75%	
165	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - DEPURAZIONE - Telecontrollo e Teletrasmissione	MANUTENZIONI-CN-EGATO/4 - Interventi su reti ed impianti depurazione	337.809,07		150.000,00		100.000,00						gen-18	dic-18	dic-18		75%	
166	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4-Adeguamento sistemi informativi e gestionali per quanto previsto dalle delibere	OPERE GENERICHE-CN-EGATO/4-Adeguamento sistemi informativi e gestionali per quanto previsto dalle delibere	0,00										gen-17	dic-17			CONCLUSO	
167	BRA-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria strada Fey	BRA-CN-EGATO/4 - Rifacimento rete fognaria strada Fey	0,00													Concluso nel 2015	CONCLUSO	
168	CHERASCO - Ripristino sollevamento fognario loc Moglia. Alluvione Nov2016	CHERASCO _ Loc. Moglia	14.705,91			14.705,91							feb-17	dic-17	dic-17		CONCLUSO	

[illegible]

TECNOEDIL SPA			INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018)							TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			(Monitoraggio Settembre 2018)														
			2017 (consuntivo)		2018 (cons. o preventivo)		2019 (preventivo)										
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017	Di cui contributi 2017	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	oltre il 2019	Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4	Redazione Prog.Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	Note e/o motivazioni di eventuali ritardi	STATO DEI LAVORI settembre 2018
9.1	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (solo recupero funzionale) LOTTO 2	ALBA-CN-EGATO/4 - PRESA TANARO MIROGLIO (solo recupero funzionale) LOTTO 2														lavoro previsto oltre il 2019	
SFD-8	AREA OMOGENEA ALBESE - VALLE TINELLA Realizzazione di collettore per ottimizzazione sistema	AREA OMOGENEA ALBESE - VALLE TINELLA Realizzazione di collettore per ottimizzazione sistema	0,00							mar-19	lug-19		mar-20	nov-23	dic-23		
173	EMERGENZA IDRICA: Rilancio risorsa idrica del Roero in adduttrice dell'Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi a	Magliano Alfieri Rilancio S.Bernardo			75.000,00								gen-18	ott-18		Previsto contributo regionale per € 12.500,00	

Proposta di variante Settembre 2018	€ 5.439.334,64	€ 0,00	€ 5.132.405,40	€ 86.574,75	€ 8.232.401,51	€ 415.000,00

Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-	€ 5.439.334,64	€ 0,00	€ 5.937.014,00	€ 509.494,75	€ 7.920.952,00	€ 0,00

	2017		2018		2019	
	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
Proposta di variante Maggio 2018	€ 3.120.810,13	€ 86.574,75	€ 7.400.147,00	€ 449.920,00		
	€ 3.207.384,88		€ 7.850.067,00			
Proposta di variante Settembre 2107	€ 4.553.958,86	€ 175.500,00	€ 7.618.903,30	€ 0,00		
	€ 4.729.458,86		€ 7.618.903,30			
PDI 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16)	€ 3.663.583,00	€ 0,00	€ 5.836.139,30	€ 0,00	€ 5.885.000,00	€ 0,00
	€ 3.663.583,00		€ 5.836.139,30		€ 5.885.000,00	

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: VERIFICA DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) AL 30 SETTEMBRE 2018 ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA (PERIODO 2018-2019);

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

Il Direttore – Ing. Giuseppe Giuliano

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente
Prof.ssa Bruna Sibille

Il Segretario della Conferenza
Dott. Claudio Chianese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 4 Cuneese dal giorno 3/12/2018 e per quindici giorni consecutivi.

Cuneo 3/12/2018

L'Incaricata
Dott.ssa Carla Baudino
